


## 国土交通省施工の対策工事

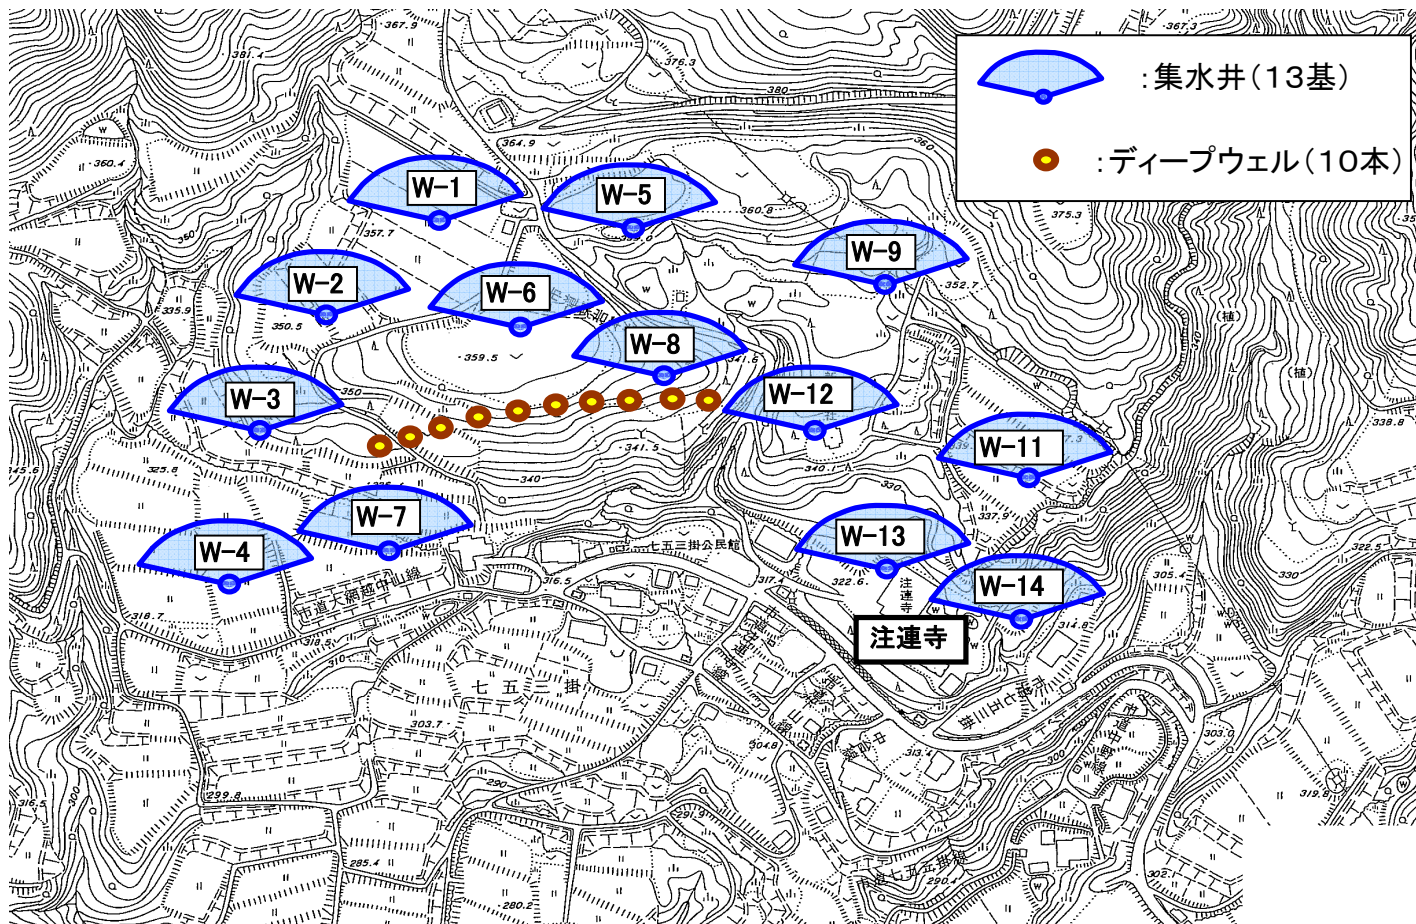

集水井工事進捗状況(7月29日現在)

集水井	直径(m)	計画掘削深さ(m)	掘削深さ(m)	作業状況
W-1	3.5	26.5	20.0	掘削中
W-2	3.5	28.0	28.0	掘削完了、排水ボーリング準備中
W-3	3.5	21.0	17.0	掘削中
W-4	3.5	15.0	15.0	掘削完了、排水ボーリング準備中
W-5	3.5	33.0	19.5	掘削中
W-6	3.5	39.0	39.0	掘削完了、排水ボーリング準備中
W-7	3.5	10.5	10.5	掘削完了、集水ボーリング施行中
W-8	3.5	39.5	6.0	掘削中
W-9	3.5	35.5	13.5	掘削中
W-11	3.5	30.5	18.5	掘削中
W-12	3.5	32.0	32.0	掘削完了、排水ボーリング準備中
W-13	3.5	18.5	5.5	掘削中
W-14	3.5	23.0	23.0	掘削完了、排水ボーリング準備中

ディープウエル工進捗状況(7月29日現在)

ディープウエル	計画掘削深さ(m)	排水量(L/min)	作業状況
1	55.5	220	排水中
2	62.5	160	排水中
3	66.5	42	排水中
4	42.0		掘削完了、排水準備中
5	70.0	70	排水中
6	69.5	50	排水中
7	56.0	10	排水中
8	65.5	230	排水中
9	40.0	40	排水中
10	42.0		掘削中(28.0m)
