

# 信夫山国道トピックス

平成15年11月10日  
第12号

## 本宮町4車線化平成16年春完成に向けて

本宮拡幅事業（8.9km）のうち、大玉村（2.9km）を除く6kmの4車線が工事が進められています。


現在施工されている工事は、百日川橋下部工（その2）工事、百日川橋上部工（その2）工事、本宮道路改良舗装工事の3本です。工事の進み具合（進捗率）は10月末で50%です。

周辺のみなさま、道路利用者のみなさんに、工事の進み具合を示す工事の看板を設置することとしました。

～進捗率看板を設置します～



本宮道路改良舗装工事

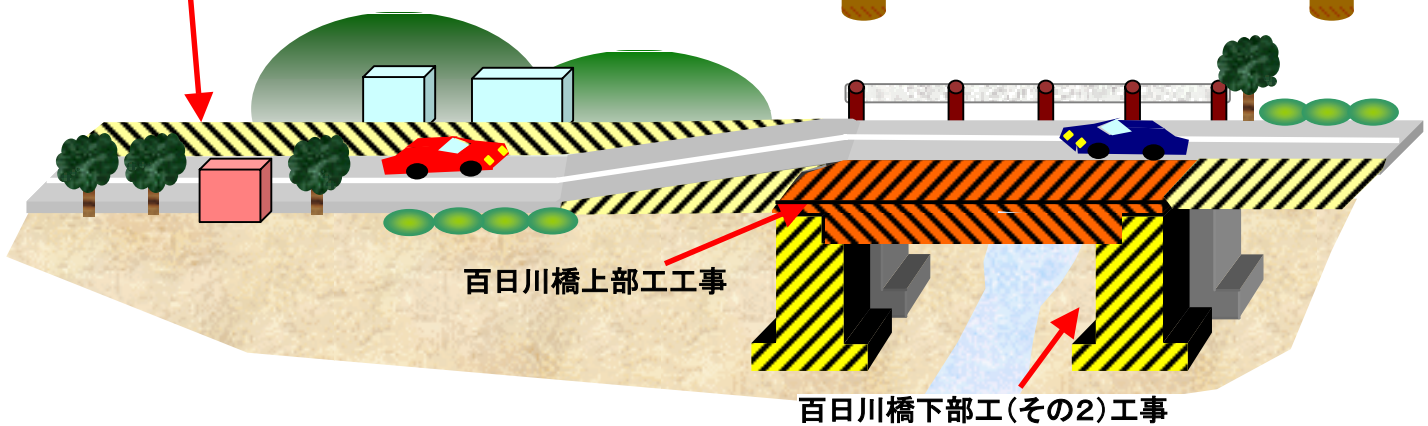

## ～百日川橋の主桁架設完了～


平成16年春、4車線完成を目指している本宮町工事区間のうち、最大の重要箇所である、百日川橋下り線側、上部工の主桁13本の架設が無事完了しました。

今後は橋面の仕上げ等を施行し、歩道を設置したあと、12月中頃車線切り廻しを行い百日川橋上り線の上部工を施行していくこととなります。

この主桁は、工場で製作されたもので長さ21.9m、重さ23.2tもあります。



架設状況

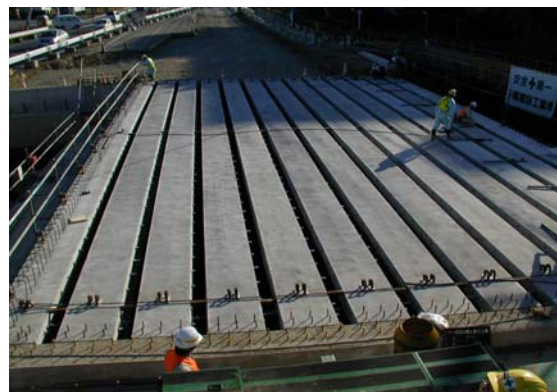

主桁完了
