


今年度、本体部打設完了

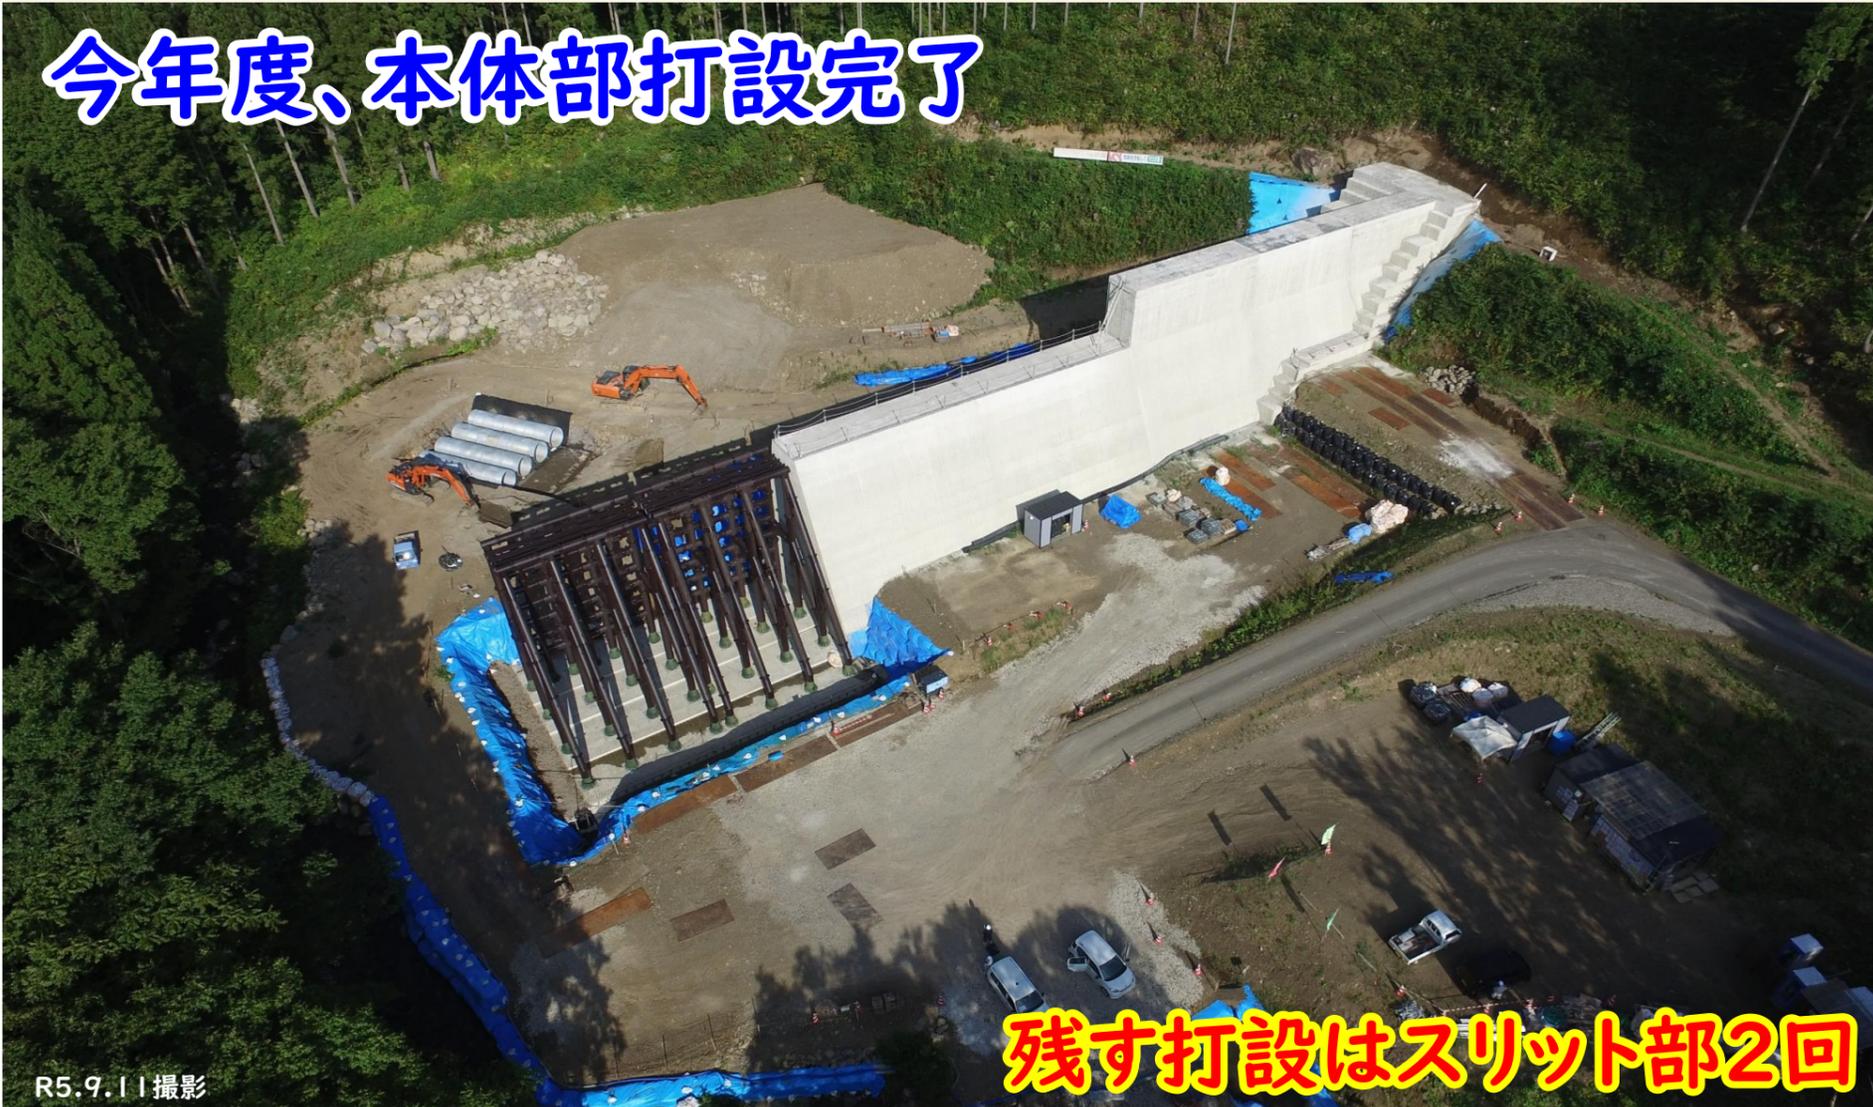

R5.9.11撮影

残す打設はスリット部2回

工事の進捗状況

現場は、本体部打設が9月6日に完了し、スリット部足場解体作業及び堰堤上流部の転流工の施工を行っています。今までは転落防止及び重機と人の接触事故防止を意識し、作業を行っていきました。今後はスリット部の2次施工を行うため、鉄筋組立を行います。鉄筋組立後、型枠の組立を行い完了次第、打設を行う予定です。

スリット部のコンクリート打設は10月中旬を目標にし作業を行っています。打設完了後、転流部箇所の作業に移っていきます。

工期まで残すところ3カ月を切りました。今月も無事故・無災害に努め、安全作業で施工を行ってまいりますのでよろしくお願いいたします。

仙北建設業協会女性部会『HANAMARU』研修に参加しました

私、平川は9月26日に仙北建設業協会女性部会『HANAMARU』の1日研修に参加してきました。午前中は、五城目にあるDアカデミー東北にてドローン講習でしたが小雨が降っていたため、屋内での講習になってしまいましたが参加者全員が実際にドローンを操縦しました。午後からは、秋田港向浜地区のふ頭用地造成工事の現場見学。海岸の現場は見たことがなかったため施工手順などを詳しく説明していただき、とても勉強になりました。また、工事に使用する起重機船とその内部を見学させていただき、居住スペースや操作室などの普段見ることのできないことを体験することができました。自分の現場では学べない貴重な体験をすることができ、とても充実した1日を過ごすことができました。




ドローン操作体験



起重機船

10月の生コン打設予定日

10月12日(木),18日(水)を予定しております



※3Dモデルによる10月施工予定箇所(着色部)

天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事工程表

工期：令和5年3月3日～令和5年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工・後片付け	—	—								—
砂防土工 (スリット掘削部)		—	—							
砂防堰堤工	コンクリート堰堤工	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)		—	—	—	—	—	—	—	
鋼製スリット工場製作		—	—	—	—	—	—	—	—	
応急処理工 (濁水処理施設)		—	—					—		
仮設工 (ヤード造成・転流等)		—	—					—	—	
			—	—				—	—	

R5.9.11撮影
