



# 打設進捗率50%を超えました

R4.6.21撮影



## 工事の進捗状況

6月中旬に梅雨入りし、6月は週2回の打設ペースを順調に施工することができました。7月は引き続き型枠組立・生コン打設作業及び根固めブロックの製作を行ってまいります。

また、昨年度左岸側の応急対策を行った箇所対策案の設計が決まり打設と同時作業で左岸法面部の施工を行い、施工完了後袖部の生コン打設作業を開始します。天候の状況に応じて生コン打設の際、早出もしくは残業で作業を行います。

住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

## 地元説明会が開催されました

6月29日に田沢湖開発センターにて地元説明会が開催されました。

北桧木内川第2砂防堰堤の工事に関して秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 大淵出張所長よりあいさつがあったのち、現場代理人の大石から今年度の工事の内容の説明を行いました。

参加していただきました住民の方々からは、多くの質問等がなされ、活発な意見交換ができました。内容を精査し、本工事で対応すべきところは取り組んでいきます。ありがとうございました。

## 工事工程表

工期：令和4年3月4日～令和4年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備工・後片付け	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		
砂防堰堤	コンクリート堰堤工	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	護床・根固め工	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
左岸斜面対策工	掘削工	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	斜面排水処理工	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	モルタル吹付工	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
砂防施設工 (鋼製スリット工場製作)	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		

## 大曲地区安全パトロール

6月29日に大曲地区安全パトロールに行ってきました。対象現場は雄物川上流岩瀬下流地区築堤等工事で、雄物川の築堤工事でした。近年、新型コロナウイルス感染防止対策として全体検討会は行われず、事務局へ点検報告となりました。

当現場からも現場代理人の大石が参加し対象現場の工夫やパトロール内容を作業員に報告し、今後の現場で活かしていきたいと思っております。



R4.6.29撮影

## 今年も開催！働く車見学会


昨年好評だった働く車見学会を6月24日に本社向かいのだしのご園の園児の皆さんを招待し、建設現場の働く車見学会を行いました。十分な安全対策・コロナ対策を行いながらバックホウや高所作業車に乗ってみたいという声がありました。子供たちは終始笑顔で今回の見学会が一つの思い出になってくれればと思っております。



R4.6.24撮影

## 7月の生コン予定日

※ 緑色着色箇所が7月打設予定箇所です。

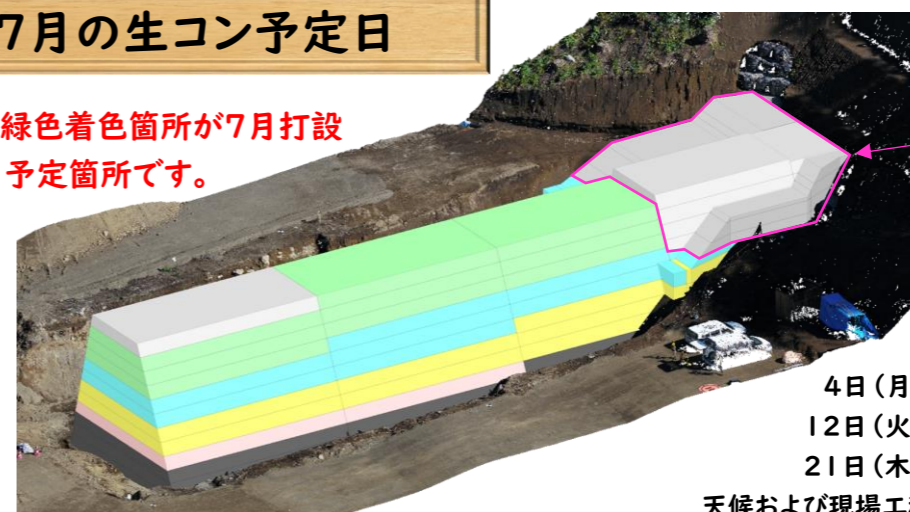

前年度崩落していた箇所を応急対策をしていましたが、今年度施工では新たに対策を講じるため打設を一時中断しています。対策工施工後は打設を再開するため、予定打設箇所が変更する可能性があります。

4日(月曜日) 5日(火曜日) 7日(木曜日)  
12日(火曜日) 14日(木曜日) 19日(火曜日)  
21日(木曜日) 26日(火曜日) 28日(木曜日)  
天候および現場工程の変更により変更する場合があります。
