



# 今年度施工分まもなく全打設完了



## 打設残り3回

R4.8.24撮影

### 工事の進捗状況

現場は、8月中で全打設完了を目指して施工を進めておりましたが、お盆前後の天候不良に伴い9月まで打設作業が延びることとなりました。

8月にはCブロックの打設作業が完了し残すところ、F,Gブロックの打設作業が3回となりました。生コン打設完了後、左岸側の残斜面の法面保護(モルタル吹付)作業を行います。

また、根固めブロックについては今年度40個製作のうち、8月末で32個製作が完了し、残り2回の打設となります。引き続きブロック製作の際、打設1回あたり生コン車両1台の通行となりますので詳しくは現場入口の掲示板でもお知らせします。

住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業します。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

### 工事工程表


工期: 令和4年3月4日~令和4年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備工・後片付け																					
砂防堰堤	コンクリート堰堤工																				
	護床・根固め工																				
左岸斜面対策工	掘削工																				
	斜面排水処理工																				
	モルタル吹付工																				
砂防施設工(鋼製スリット工場製作)																					

### 9月の生コン予定日

※ 朱色着色箇所が9月打設予定箇所です。

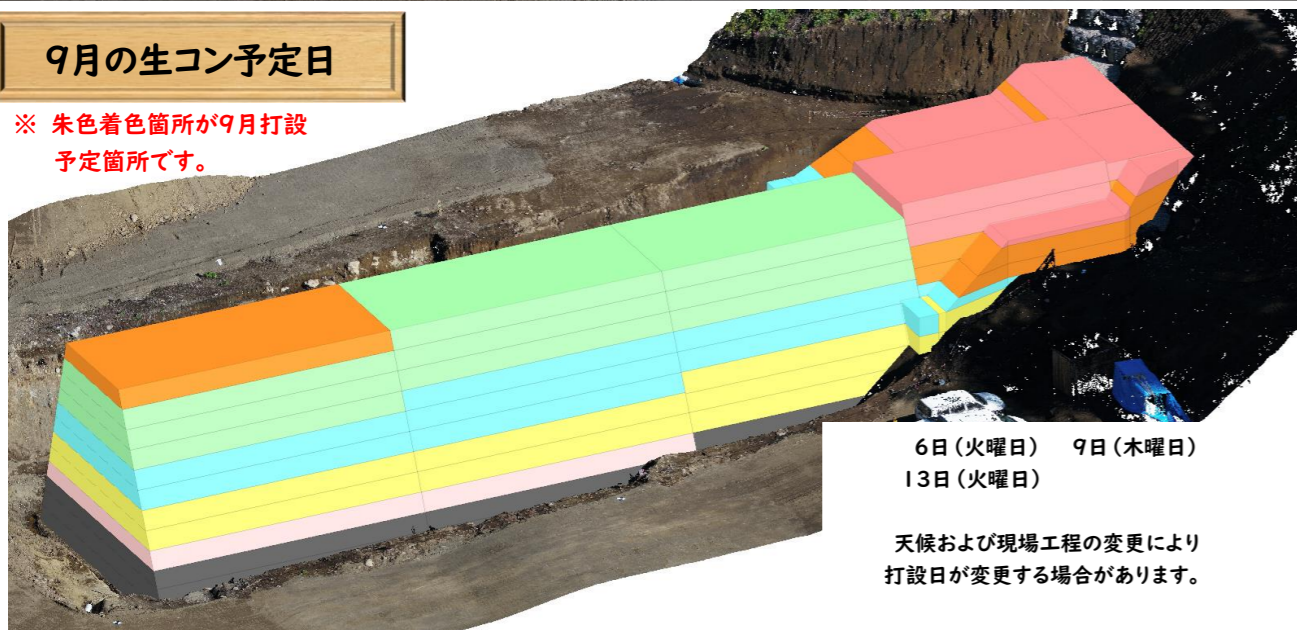


6日(火曜日) 9日(木曜日)  
13日(火曜日)

天候および現場工程の変更により打設日が変更する場合があります。

### 出張所管内安全対策協議会第2回現場パトロール

8月18日に秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内安全対策協議会による第2回現場パトロールが行われました。今回は当現場が対象現場となりました。日頃安全に気を付けて作業を行っておりますが、第三者からの目で見ると改善箇所がいくつかあり、あらためて安全について考える良い機会となりました。

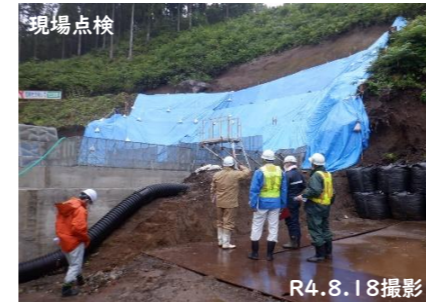

現場点検

R4.8.18撮影



現場事務所点検

### クリーンアップ活動を実施しました

お盆前に現場事務所付近及び現場に向かう市道及び林道の沿線等のクリーンアップ活動を行いました。日頃工事で使用している道路ですが、一般の方々も多く通行することから昨年に引き続きゴミ拾いをさせていただきました。

