



工事の進捗状況

4月26日から始まった生コン打設作業ですが9月15日をもって今年度の打設作業がすべて完了しました。

9月後半には左岸側掘削残斜面の法面保護(モルタル吹付)作業も完了し、10月は仮設備撤去及び場内整正作業を行い今年度の北桧内川での現場作業が終了いたします。現場入口には危険防止のため侵入防止チェーンを設置しますので立ち入らないようお願いいたします。

住民の皆様の日頃からの本工事へのご理解・ご協力により、現場も最終段階を迎えることができました。今後あとすこし仮設資材の搬出にともない大型車両の通行が発生しますが、現場入口の掲示板でお知らせします。


北桧内川での工事は終了しますが、今後は鋼製スリット製作(工場製作)が残りの工事となります。最後まで気を緩めず無事故で作業を終えたいと思います。

左岸側モルタル吹付状況



R4.9.21撮影

今年度現場作業施工終了

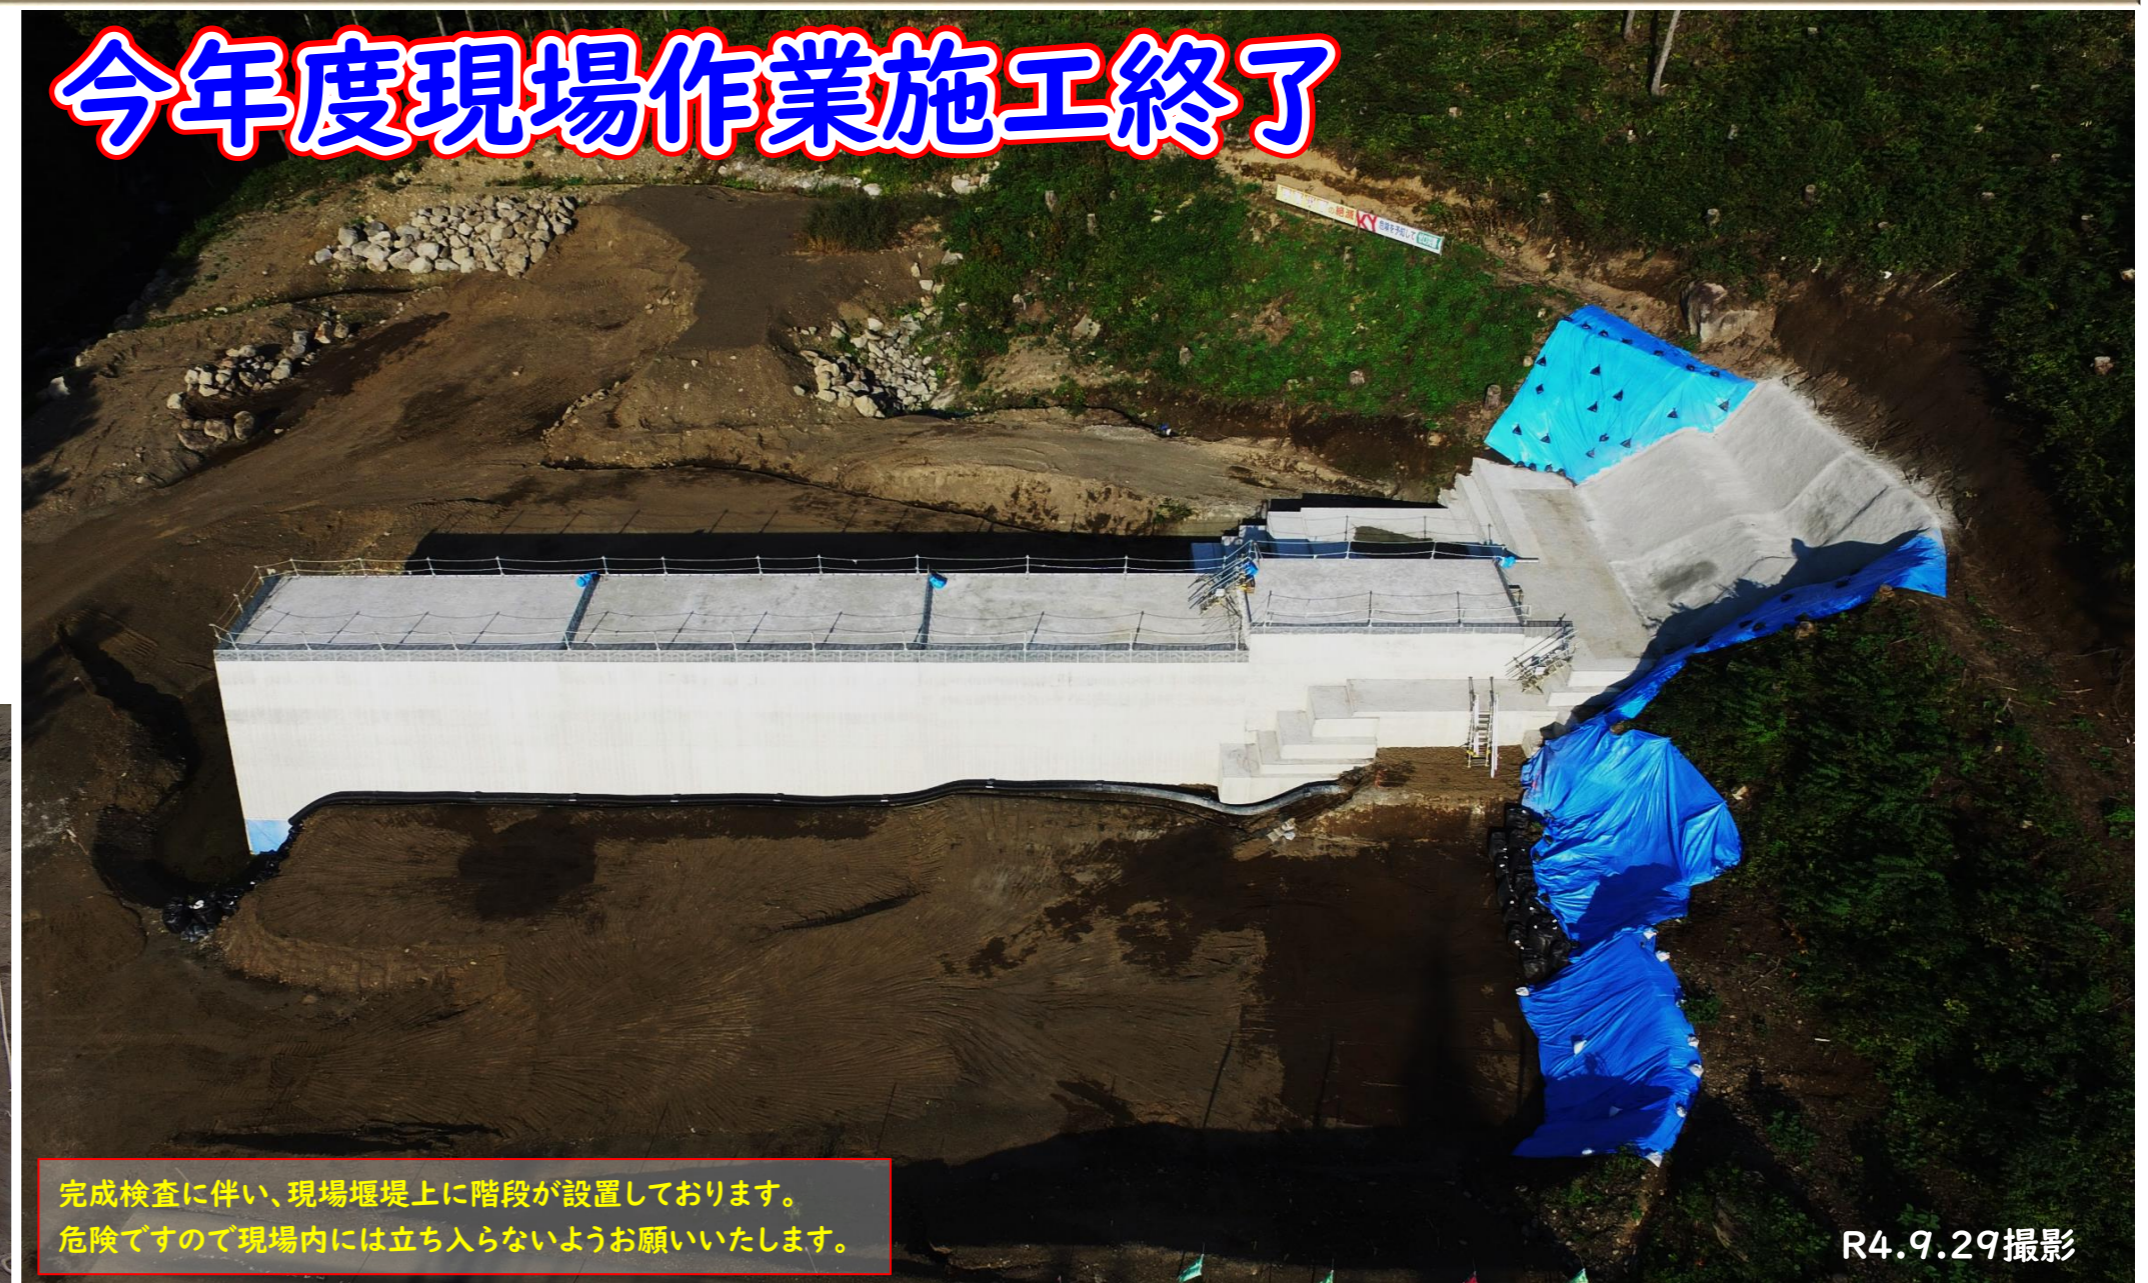

完成検査に伴い、現場堰堤上に階段が設置しております。危険ですので現場内には立ち入らないようお願いいたします。

R4.9.29撮影

工事工程表

工期:令和4年3月4日~令和4年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工・後片付け										
砂防堰堤	コンクリート堰堤工									
	護床・根固め工									
左岸斜面対策工	掘削工									
	斜面排水処理工									
	モルタル吹付工									
砂防施設工(鋼製スリット工場製作)										

令和4年度 大曲地区安全パトロールが開催されました

9月28日に湯沢河川国道事務所事故防止対策委員会による令和4年度 第1回大曲地区安全パトロールが開催され、当現場が対象現場となりました。当日は湯沢河川国道事務所及び大曲地区の工事受注者等28件19社による安全パトロールが行われました。


パトロールはコロナ感染防止対策を取りながら、2班編成での実施となりました。

今後、安全パトロール参加者からの指摘事項を受けて是正及び今後の検討課題として取り組んでいきたいと思ひます。



3Dモデルによる堰堤完成イメージ

3Dモデルによる堰堤の完成イメージです。今回の工事で施工した箇所を着色しております。

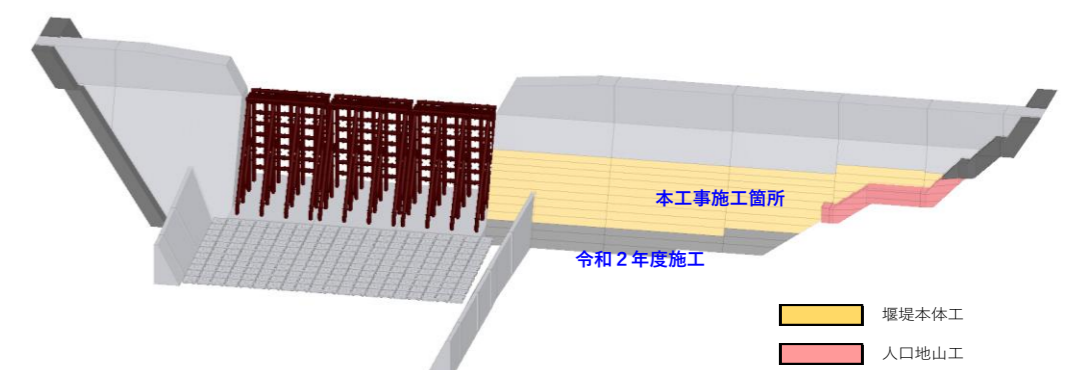

堰堤本体工  
入口地山工
