


## 鏡石拡幅の工事進捗状況


令和3年12月上旬時点



## 【標準区間】

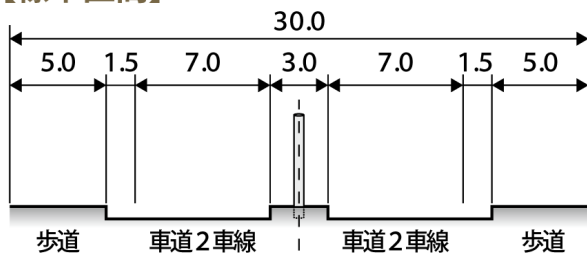

## 【副道設置区間】

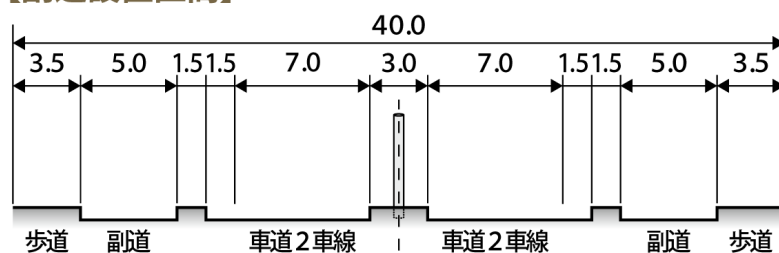

単位：m

## 現地状況

## ① 中町交差点



●本線では排水構造物工・舗装工と、交差点地下では推進管工法により排水暗渠を施工しております。(R3年10月中旬時点)

## ② 境工業団地入口



●排水構造物工、歩道・車道の舗装工を実施しております。(R3年10月中旬時点)

## ③ 桜岡交差点



●上り線側にて歩道・車道の舗装工を実施しております。(R3年10月中旬時点)

## ① 中町交差点



●本線では上り線、下り線をセパレート走行に切り替え、中央分離帯等、中央部の施工をしております。交差点地下の暗渠の施工は完了しました。(R3年12月上旬時点)

## ② 境工業団地入口



●下り線側の排水構造物工、歩道・車道の舗装工と中央分離帯等の施工をしております。(R3年12月上旬時点)

## ③ 桜岡交差点



●上り線側にて車道の舗装工と中央分離帯等の施工をしております。(R3年12月上旬時点)
