


## 鏡石拡幅の工事進捗状況


令和4年2月中旬時点



## 【標準区間】

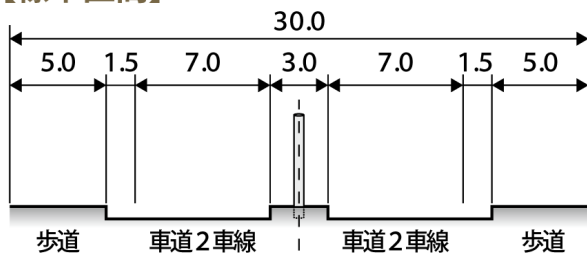

## 【副道設置区間】

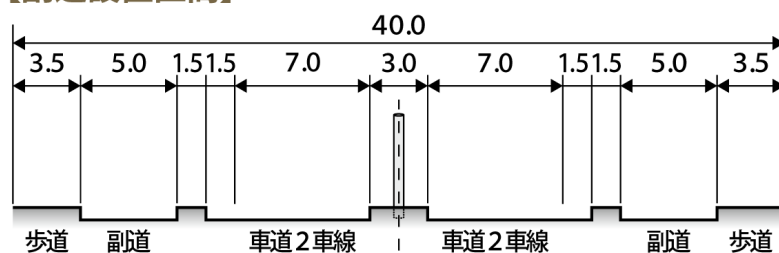

単位：m

## 現地状況

## ① 中町交差点



●本線では上り線、下り線をセパレート走行に切替し、中央分離帯等、中央部の施工をしております。交差点地下の暗渠の施工は完了しました。(R3年12月上旬時点)

## ② 境工業団地入口



●下り線側の排水構造物工、歩道・車道の舗装工と中央分離帯等の施工をしております。(R3年12月上旬時点)

## ③ 桜岡交差点



●上り線側にて車道の舗装工と中央分離帯等の施工をしております。(R3年12月上旬時点)

## ① 中町交差点



●上り線は右折レーン箇所、下り線は第1走行車線と歩道を施工しております。(R4年2月中旬時点)

## ② 境工業団地入口



●舗装工事は完成し、安全設備等の付属物関係の設置を行っていく予定です。(R4年2月中旬時点)

## ③ 桜岡交差点



●舗装関係は完成し、照明灯等の付属物関係の設置を行っていく予定です。(R4年2月中旬時点)
