

～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

## ■ 工事の進捗率

令和2年7月下旬現在

トンネル掘削率



100%



※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。(2,875m)

トンネル完成率



89%


※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した(2,565m)延長の割合です。

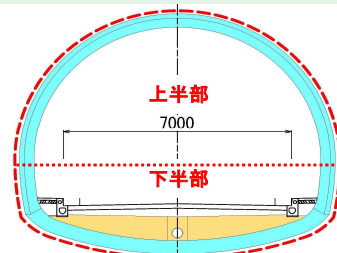

※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

## ■ 平面図

## 7月までの工事状況

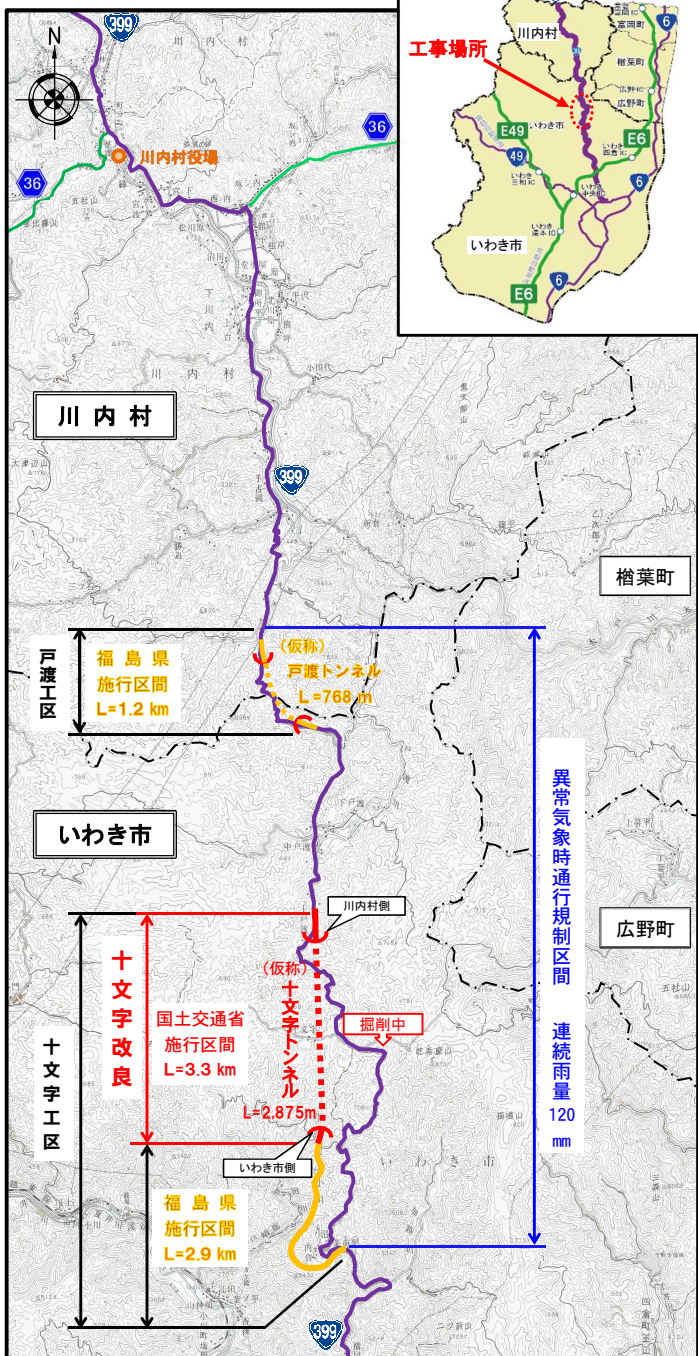

### ■ 4月末の工事状況



98%  
(2,816m)

80%  
(2,306m)

### ■ 5月末の工事状況



100%  
(2,875m)

83%  
(2,381m)

### ■ 6月末の工事状況



100%  
(2,875m)

83%  
(2,381m)

※6月はインバート工、中央排水工、起点側抗門工の工事進捗を図った。

### ■ 最近のトンネル坑内の状況



インバートコンクリート 施工完了



非常駐車帯 覆工 施工状況



起点抗口 防水シート 施工完了



起点抗口 抗門工 施工状況
