

～ 浜通り地方で1番長いトンネルの進み具合をお知らせします ～

■ 工事の進捗率

令和3年2月下旬現在

トンネル完成率

平成29年6月～



100%

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した(2,875m)延長の割合です。

トンネル内舗装完成率

令和2年9月～



84%

※舗装完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の緑色)内の舗装が完了した延長の割合です。


トンネル内設備完成率

令和2年10月～




15%

※設備完成率とは、トンネル断面(右図の桃色)内の設備(照明灯、非常警報設備)が完了した延長の割合です。

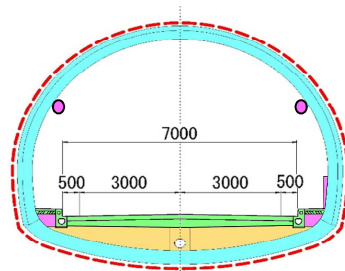

■ 平面図

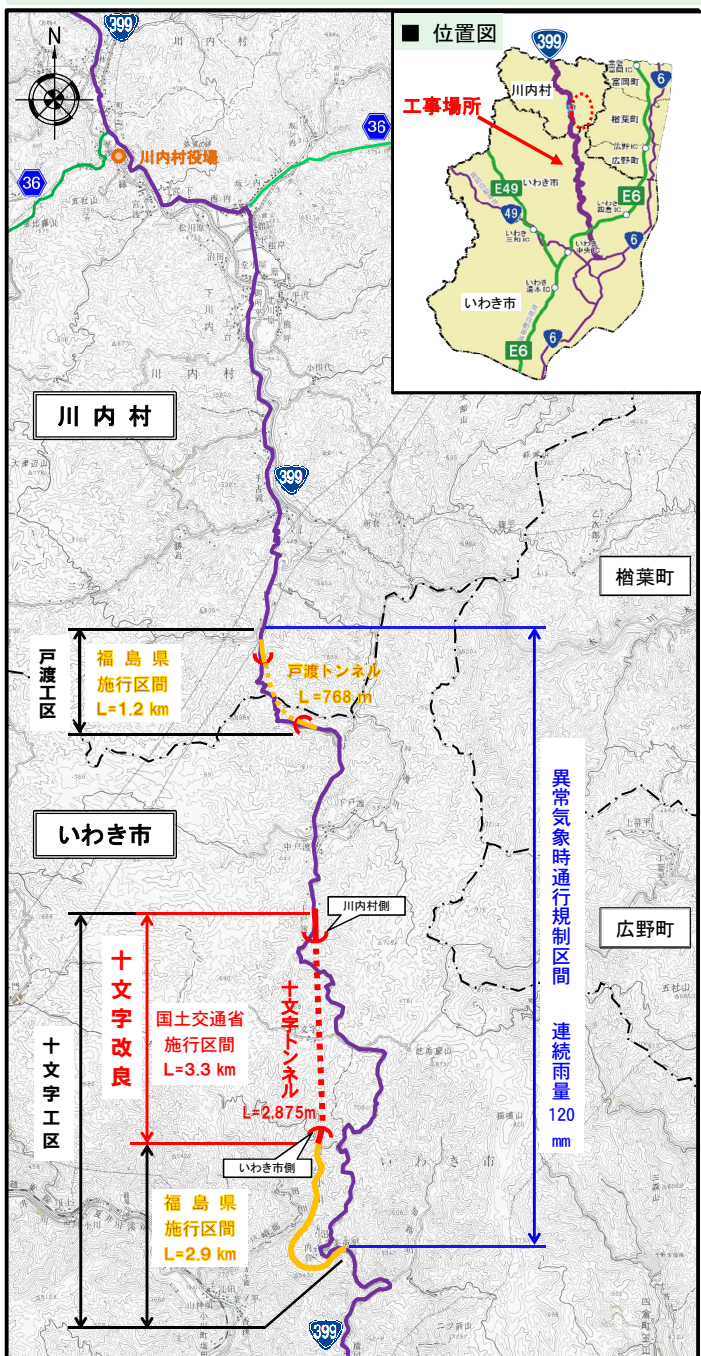

1月までの工事状況

■ 令和2年 12月 末の工事状況

平成29年6月～ (トンネル本体工事)



100%

令和2年9月～ (トンネル内舗装工事)



38%

令和2年10月～ (トンネル内設備工事)



4%

■ 令和3年 1月 末の工事状況

平成29年6月～ (トンネル本体工事)



100%

令和2年9月～ (トンネル内舗装工事)



58%

令和2年10月～ (トンネル内設備工事)



5%

■ 最近のトンネル坑内の状況



舗装工事起点側 コンクリート舗装 目地工施工状況



舗装工事終点側 コンクリート舗装 舗装工施工状況



非常警報設備工事 非常電話取納箱製作状況



照明設備工事 分岐ケーブル工場製作状況
