

湯野上バイパスの工事進捗状況


令和6年11月末時点



工事車両の通行により、皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一を最優先に工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。



国土地理院の電子地形図（タイル）に湯野上バイパス関連の情報を追記して掲載

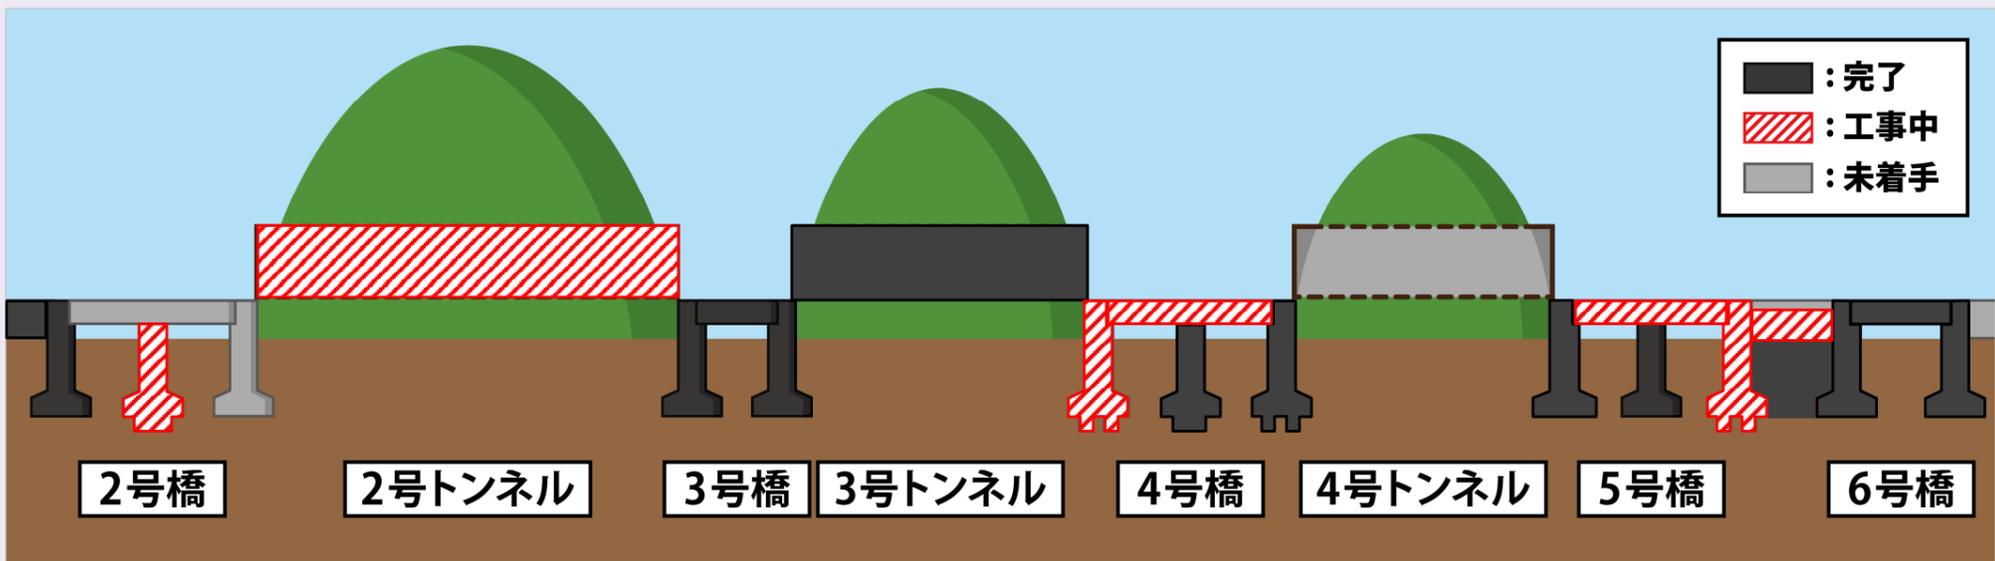

工事状況

写真① (仮) 2号橋付近 (1)



● (仮) 2号橋の橋脚基礎工（大口径深礎杭）は概ね完成しました。引き続き、トンネル坑口周辺の法面工事（赤丸部分）を進めています。

写真② (仮) 2号橋付近 (2)




● 法面工事（鉄筋挿入工）の様子。急傾斜地で重機が進んでくれないため、削孔機械も作業者も上方からぶら下って施工しています。

写真③ (仮) 2号トンネル終点側



● (仮) 2号トンネル終点側の様子。掘削土排出のためのベルトコンベアを設置して工事を進めています。

写真④ (仮) 4号橋付近

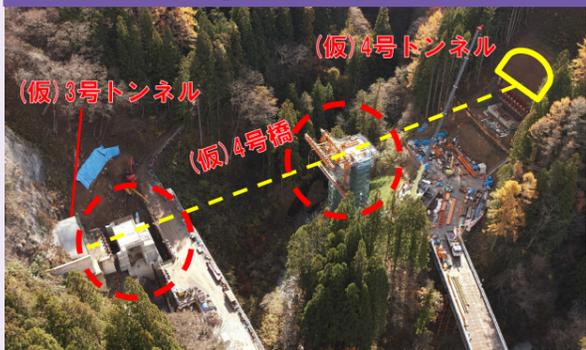

● (仮) 3号トンネル側の橋台が概ね完成しました。
● (仮) 4号橋は“やじろべえ方式”での上部工架設が始まりました。

写真⑤ 中妻地区付近 (1)



● (仮) 5号橋の終点側の橋台が概ね完成しました。上部工の工事也开始しており、工場での製作後に現場での架設工事を進めます。

写真⑥ 中妻地区付近 (2)



● 本線が通る函渠工の最終ブロックのコンクリート打設が完了しました。今後は、前後の擁壁工事などを進めます。
