


ニツ井今泉道路 工事進捗状況

令和3年 3月4日現在

ニツ井今泉道路(小繋～今泉) 延長4.5km

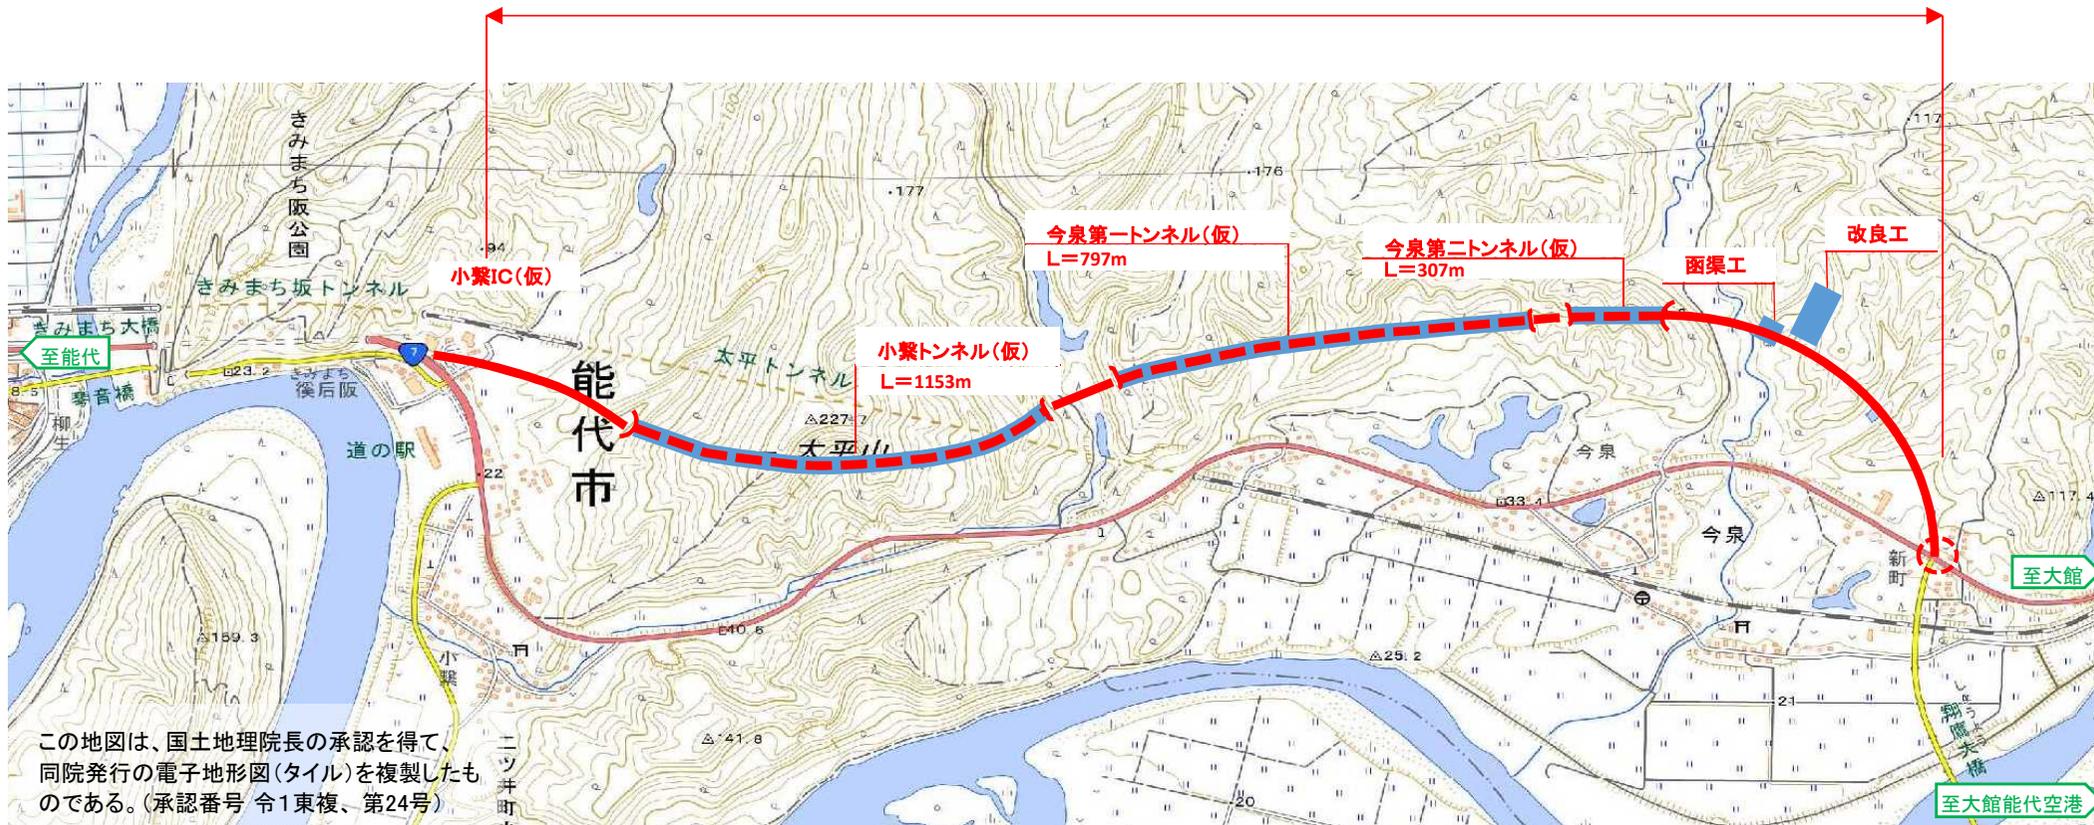

【小繋トンネル】
 覆工コンクリート打設作業中
 R2年12月貫通

【今泉第一トンネル】
 797m中 360m付近掘削中
 残り約437m掘削

【今泉第二トンネル】
 覆工コンクリート打設作業中
 R2年12月貫通

【函渠工工事】
 9基中5基完成
 6基目準備中

【改良工】
 地盤改良工
 15ブロック中5ブロック完成

