


ニツ井今泉道路 工事進捗状況
令和3年 7月5日現在

ニツ井今泉道路(小繋～今泉) 延長4.5km

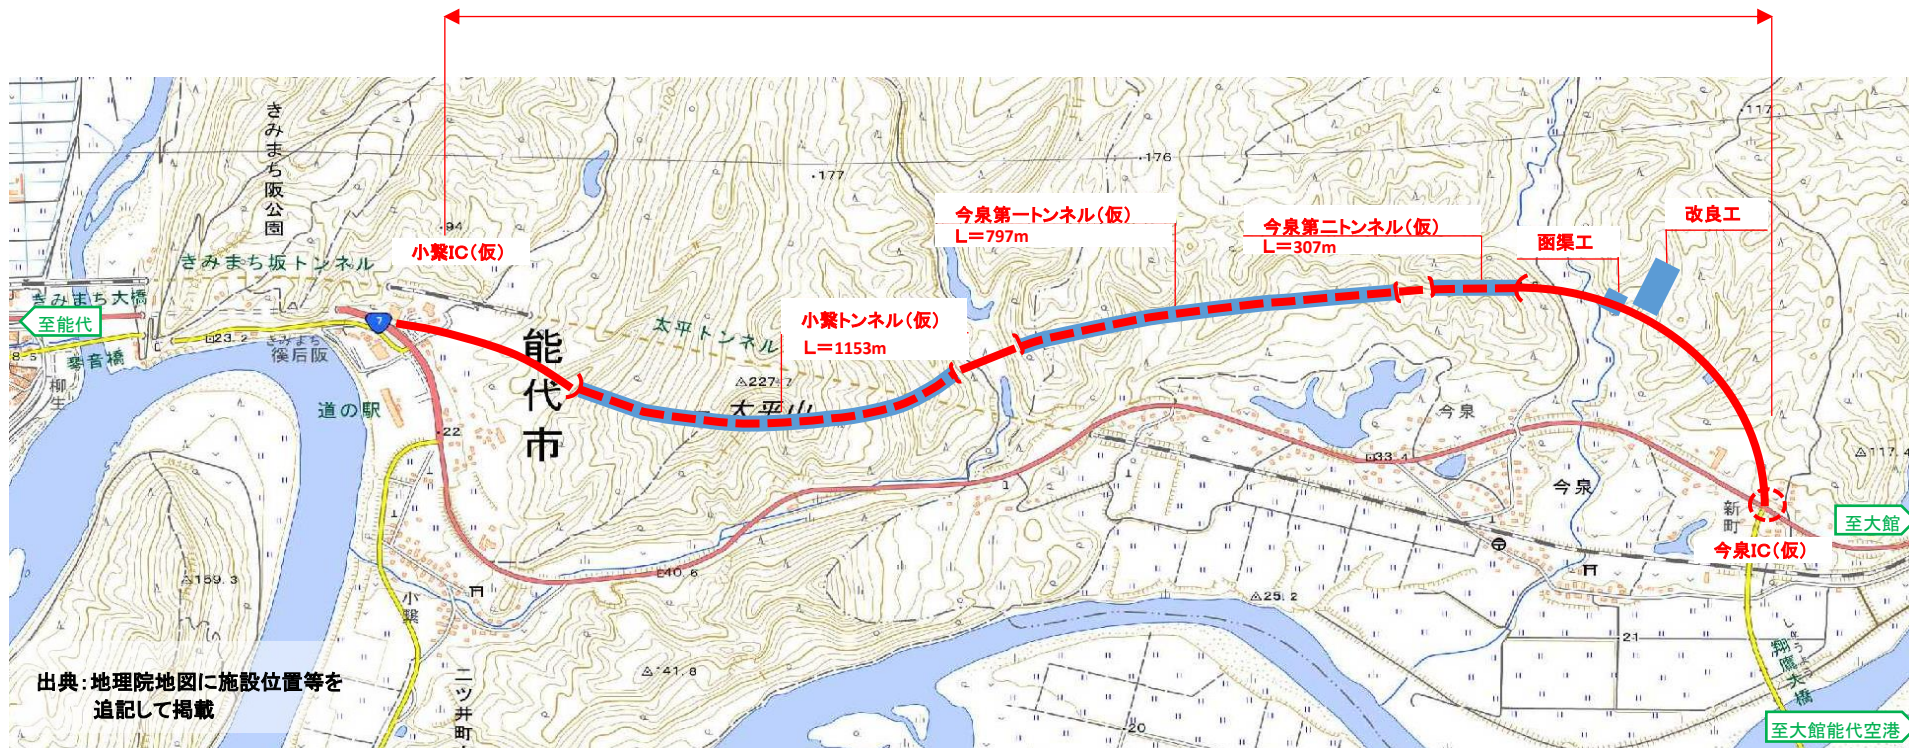

【小繋トンネル】
終点側坑門工施工中
R2年12月貫通

【今泉第一トンネル】
797m中555m掘削
インパート(トンネル底部)施工中

【今泉第二トンネル】
覆工コンクリート及び坑門工完成
R2年12月貫通

【函渠工工事】
9基中5基完成
6・7基目床堀作業中

【改良工】
地盤改良工
15ブロック中7ブロック完成

