


鷹巣大館道路 工事進捗状況

令和元年11月14日現在

鷹巣大館道路摺付区間(L=1.7km)

鷹巣大館道路供用区間

大館能代空港IC

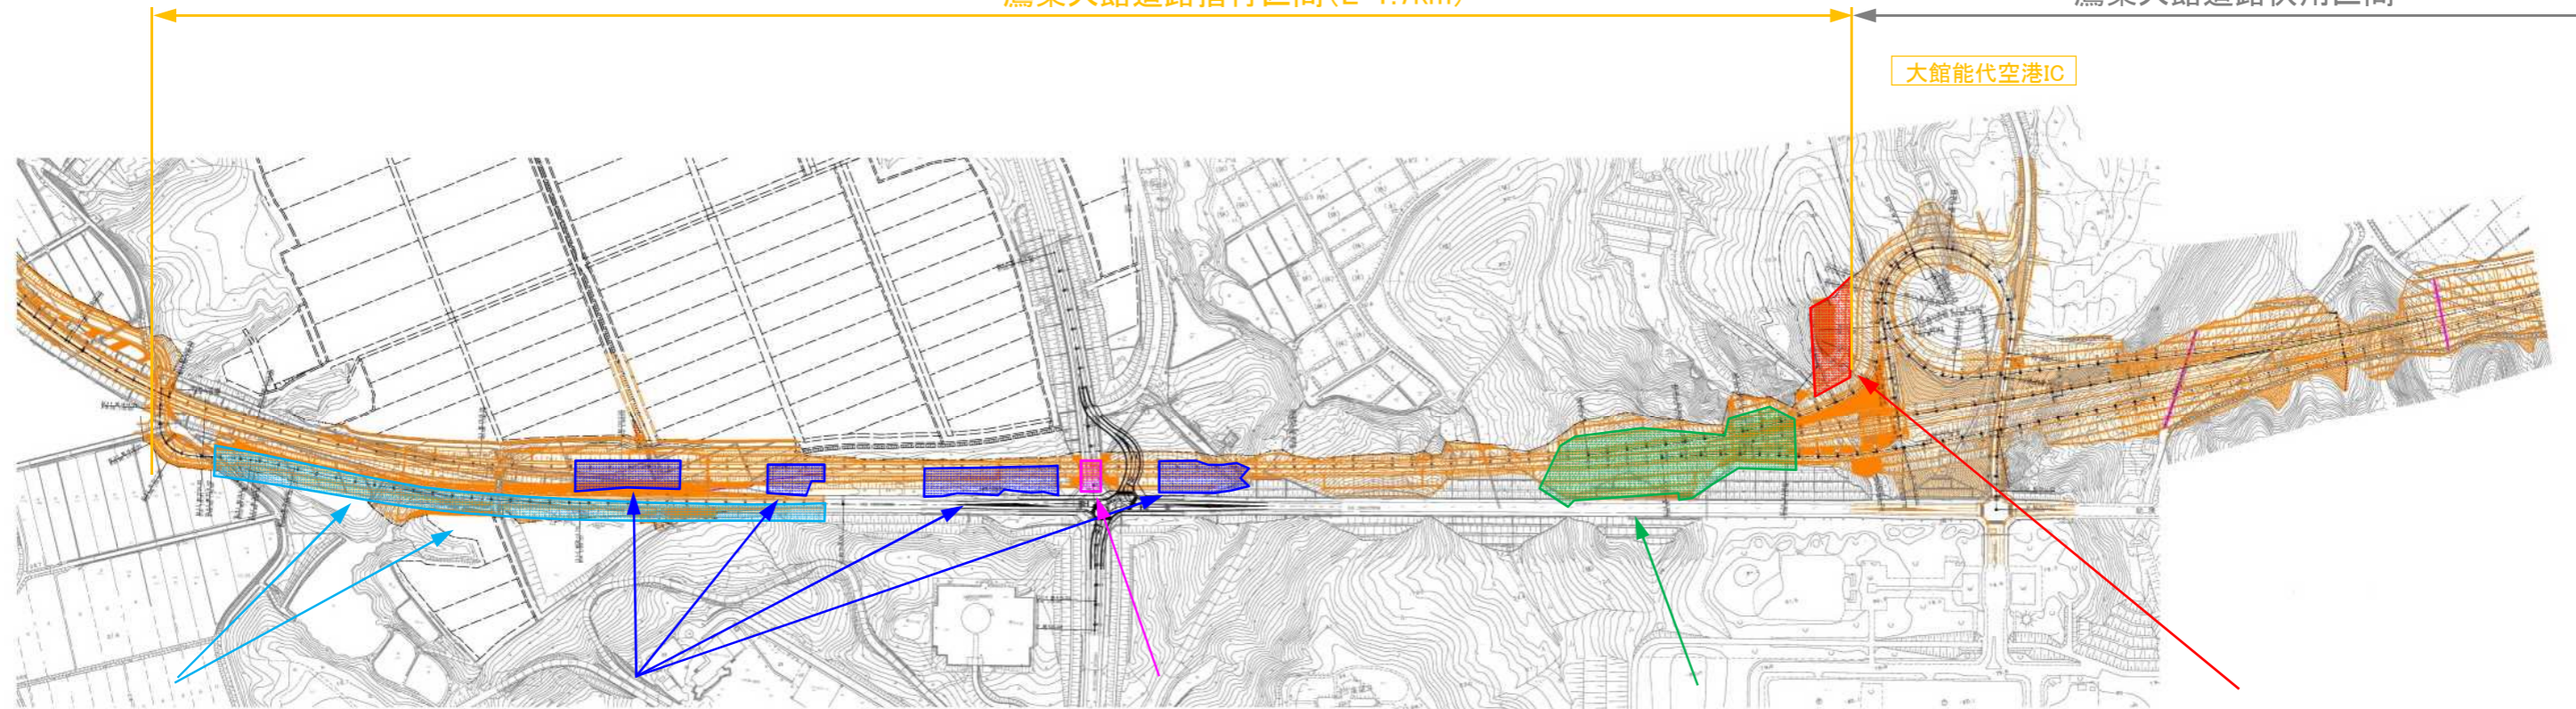

【県道付替区間】

【本線切土盛土区間】


【本線ボックスカルバート区間】

【本線切土・盛土区間】

【本線ランプ切土区間】

一切土工

11月下旬～切土工施工予定

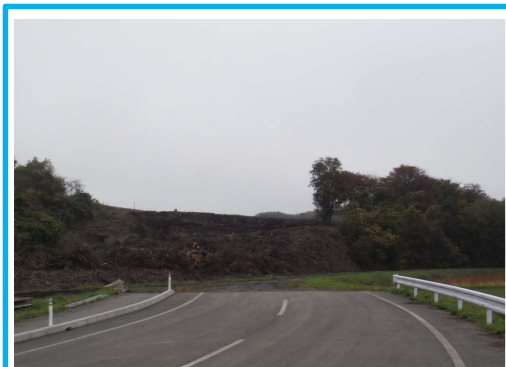

一切土・盛土工

8月下旬～盛土施工中
10月上旬～切土工施工中



ボックス本体施工中

11月上旬～外部足場解体
埋め戻し予定



一切土工・盛土工

10月下旬～切土工施工中
12月上旬～盛土工施工予定



準備工

12月上旬～切土工施工予定

