


宮古箱石道路通信 No.79




発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

一般国道106号 片側交互通行規制について

規制区間：宮古市墓目第2地割

規制期間：令和2年9月23日9時00分～令和3年3月（予定）

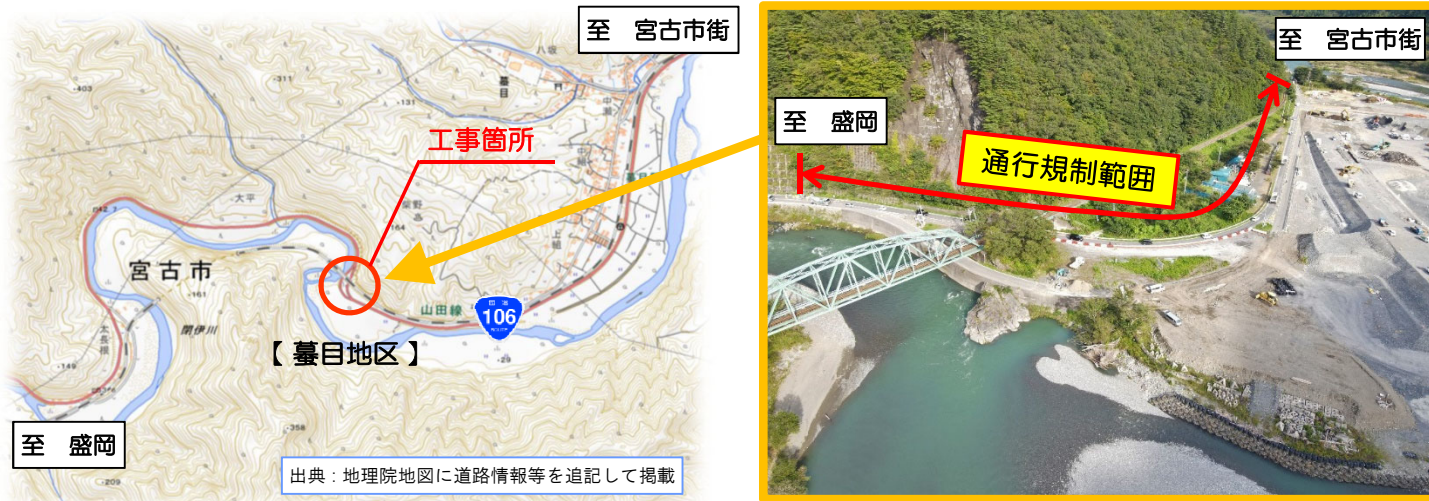

宮古箱石道路の道路改良工事に伴い、一般国道106号において昼夜間連続の終日片側交互通行規制を実施しています。通行される皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事完了報告 ～ 茂市地区構造物工事 ～

前田建設工業(株) 工期：R2.3.7～R2.9.14



当工事は墓目から茂市に抜ける茂市トンネル（仮）（延長1,885m）の工事です。前工事である「国道106号 茂市トンネル工事」（工期：H28.11.26～R2.3.23）から併せて3年10か月に及ぶ工事が完了いたしました。工事中における近隣の皆様のご理解・ご協力のおかげで工事を進めることができました。この場をお借りして地域の皆様にお礼を申し上げます。

この工事を通じて復興支援の一端を担えたことは、施工者として大変誇りに感じております。今後全線が開通し、地域が益々発展していくことを祈念しております。長い間本当にありがとうございました。



萬 現場代理人 佐々木 監理技術者



【工事現場紹介】 国道106号 箱石地区舗装工事

～ 大有建設(株) ～



大有建設株式会社

このたび、宮古箱石道路のうち「箱石地区舗装工事」を施工しております 大有建設株式会社 です。当工事は、宮古箱石道路の中で最も盛岡側での舗装工事となります。工事延長は約2.8kmで現在は片栗トンネル（仮）（延長559m）、新箱石トンネル（仮）（延長1,493m）、上片栗橋（仮）（延長164m）で本線の舗装工事を行っています。また、国道106号に接続する箇所においては交通規制を実施しながら工事を進めております。

工事期間中は、大型工事車両の通行や交通規制の実施などで、近隣・沿道の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、安全に細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。



芝崎 現場代理人



石田 監理技術者



【工事現場紹介】

腹帯橋床版工事

～ 小国開発(株) ～

小国開発株式会社

このたび、宮古箱石道路のうち「腹帯橋床版工事」を施工しております 小国開発株式会社 です。当工事は、腹帯地区で腹帯橋（仮）（橋長278m）のコンクリート床版（車両が通行する床部分）を施工します。現在は、コンクリート床版部のコンクリート打設が完了し、壁高欄（路側のコンクリート壁）、中央分離帯（中央の壁）の施工を行っております。今後として、11月中旬より足場を解体し12月下旬には工事を完了させる予定です。

工事期間中、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけします。宮古箱石道路全線開通に向け、安全第一に工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

9月19日現在 現場の様子



都築 現場代理人

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。


令和2年度 宮古箱石道路 工事一覧表

| No. | 工事名 | 工期 | 受注者 | 現場事務所TEL | No. | 工事名 | 工期 | 受注者 | 現場事務所TEL |
|-----|------------------|-------------------|---------|----------|-----|-------------------|------------------|-----------|---------------|
| ① | 茂市地区改良工事 | R2.4.1~R2.12.18 | (株)本間組 | 65-8040 | ⑨ | 腹帯第3トンネル外舗装工事 | R2.4.1~R2.12.15 | 岩手ニチレキ(株) | 65-6253 |
| ② | 下茂市橋外床版工事 | R2.3.10~R2.10.29 | 村本建設(株) | 65-7561 | ⑩ | 墓目腹帯地区道路標識設置工事 | R2.8.8~R3.3.26 | 岩手標識(株) | 050-5490-6416 |
| ③ | 国道106号 茂市地区舗装工事 | R2.1.28~R3.3.5 | 大林道路(株) | 77-3501 | ⑪ | 国道106号 川井地区トンネル工事 | H29.11.15~R3.3.5 | 西松建設(株) | 77-3777 |
| ④ | 上茂市橋外床版工事 | H31.4.1~R2.10.16 | (株)新井組 | 65-6655 | ⑫ | 国道106号 川井地区舗装工事 | R2.1.29~R3.3.5 | (株)NIPPO | 65-7530 |
| ⑤ | 国道106号 下腹帯地区舗装工事 | R1.10.30~R2.12.18 | (株)佐藤渡辺 | 65-7783 | ⑬ | 国道106号 箱石地区舗装工事 | R1.10.30~R3.1.29 | 大有建設(株) | 65-9657 |
| ⑥ | 腹帯地区外改良工事 | R2.8.19~R3.3.26 | (株)本間組 | 77-3871 | ⑭ | 新箱石大橋外床版工事 | R2.2.6~R2.10.20 | (株)森組 | 79-1866 |
| ⑦ | 腹帯地区舗装工事 | R2.4.1~R2.11.20 | 日本道路(株) | 65-8263 | ⑮ | 川井箱石地区道路標識設置工事 | R2.8.13~R3.3.26 | 協積産業(株) | - |
| ⑧ | 腹帯橋床版工事 | R2.2.7~R2.12.4 | 小国開発(株) | 65-6353 | ⑯ | | | | |

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和2年9月現在

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| <p>⑬施工：大有建設(株)</p>  <p>新箱石トンネル(仮)盛岡側では、コンクリート舗装の施工を行っています。</p> | <p>⑤施工：(株)佐藤渡辺</p>  <p>腹帯第1トンネル(仮)では、縁石と中央分離帯防護柵の施工を行っています。</p> | <p>④施工：(株)新井組</p>  <p>上茂市橋(仮)では、床版工の施工が完了し、現場内の片付け作業を行っています。</p> | <p>⑭施工：(株)森組</p>  <p>茂市橋(仮)では、床版工の施工を行っています。</p> | <p>③施工：大林道路(株)</p>  <p>茂市トンネル(仮)では、上層路盤の施工を行っています。</p> | <p>②施工：村本建設(株)</p>  <p>下茂市橋(仮)では、床版を施工するための、鉄筋の組立を行っています。</p> | <p>①施工：(株)本間組</p>  <p>墓目地区では、本線の路体盛土工と排水構造物工の施工を行っています。</p> |
|---|---|---|---|---|--|--|

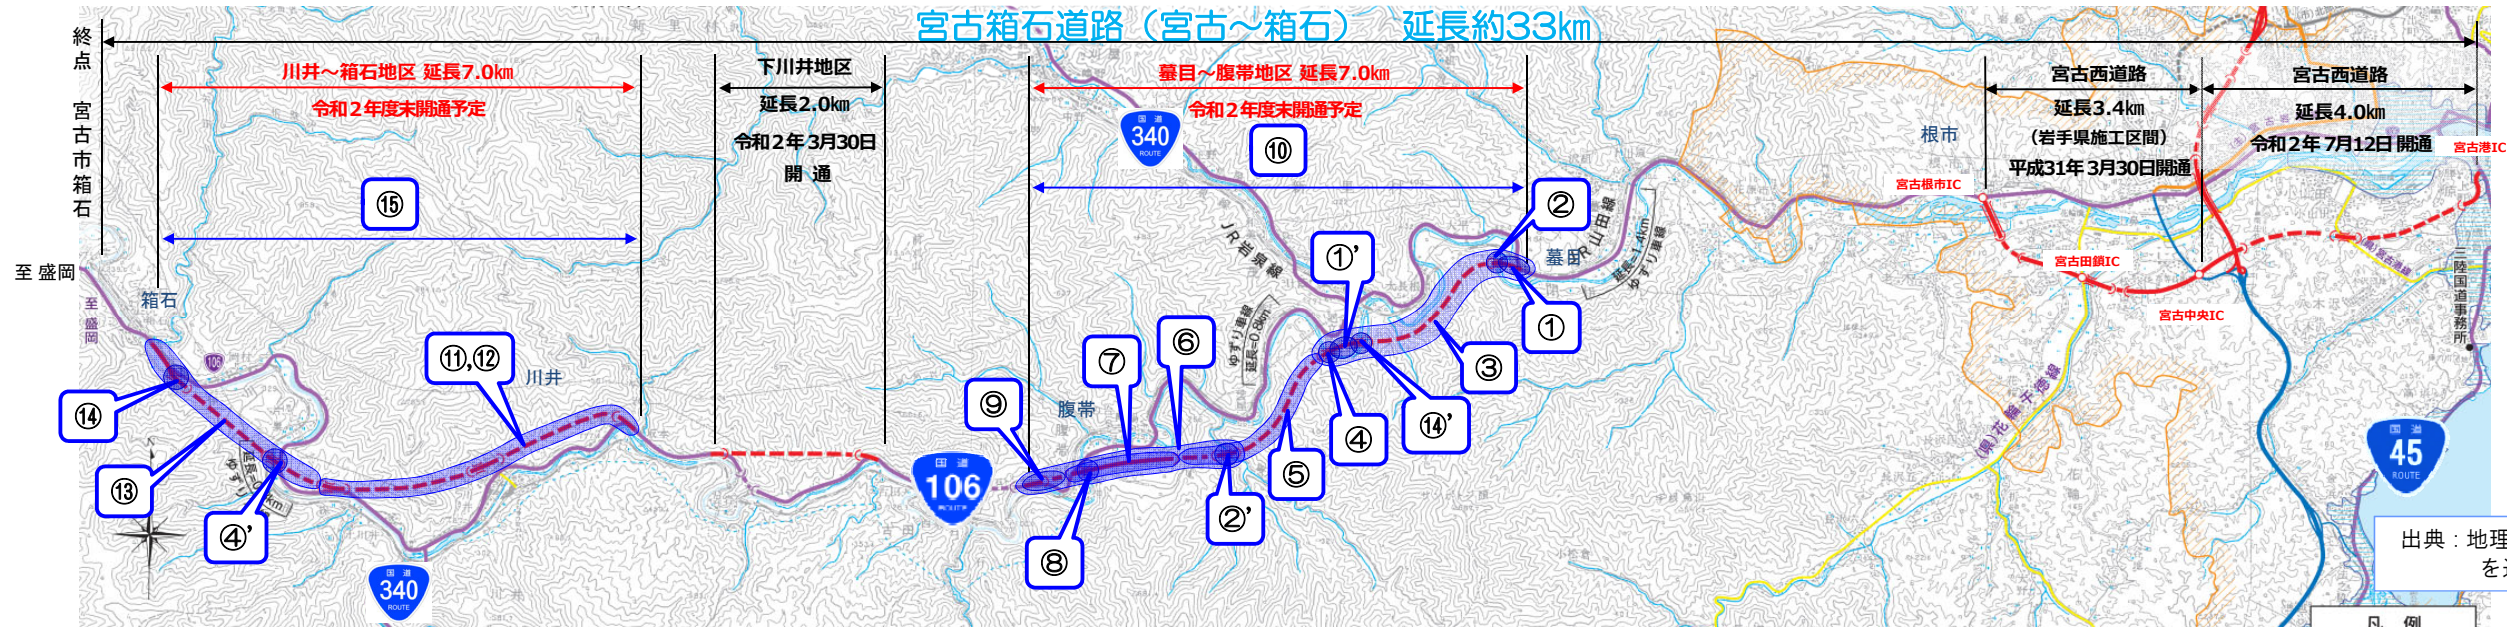

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|
| <p>⑭施工：(株)森組</p>  <p>新箱石大橋(仮)では、床版工の施工を行っています。</p> | <p>⑪施工：西松建設(株)</p>  <p>上川井接続(仮)では、路体盛土工と補強土壁工の施工を行っています。</p> | <p>⑩施工：(株)新井組</p>  <p>川井第1トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工が完了しました。現在は、トンネル坑内の路盤整備と、落石防護柵の施工を行っています。</p> | <p>⑨施工：岩手ニチレキ(株)</p>  <p>腹帯第3トンネル(仮)盛岡側では、管路工の施工を行っています。</p> | <p>⑧施工：小国開発(株)</p>  <p>腹帯橋(仮)では、床版工の施工が完了し、壁高欄と中央分離帯の施工を行っています。</p> | <p>⑦施工：日本道路(株)</p>  <p>腹帯地区では、排水構造物工と路床盛土工の施工を行っています。</p> | <p>②'施工：村本建設(株)</p>  <p>下腹帯橋(仮)では、床版工の施工が完了し、情報管路の施工を行っています。</p> |
|---|---|--|---|--|--|---|
