


(仮称)浅川トンネル下り線 全長:1,767m



掘削 767.9m (進捗率 47.1%)
覆工 295.7m (進捗率 16.7%)

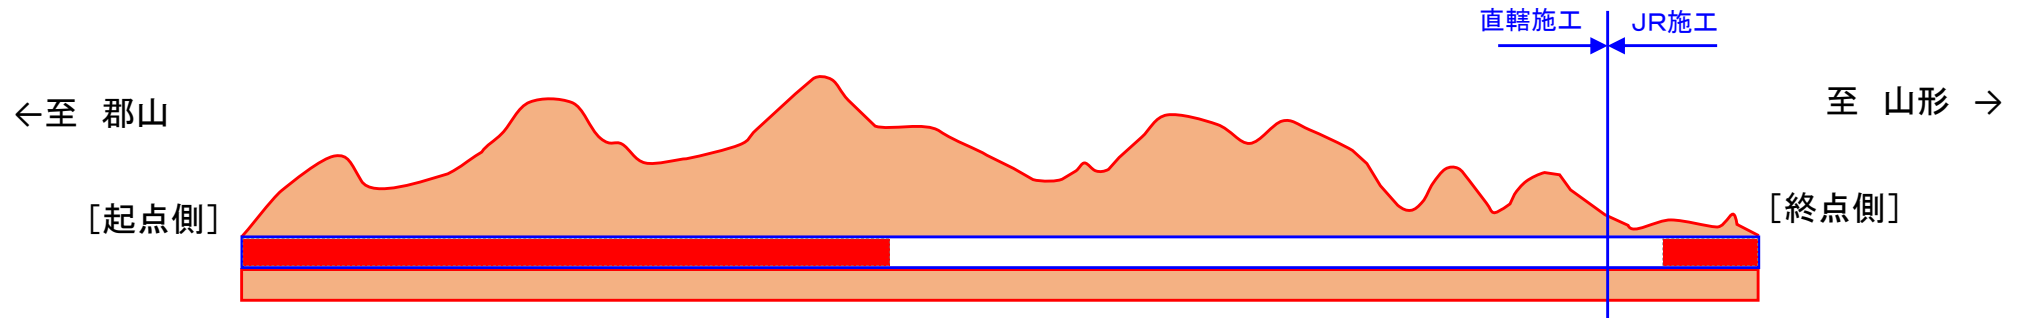

起点側 (トンネル掘削)

掘削 93.0m (進捗率 67.4%)



終点側 (トンネル掘削)
