

十三湖左岸圍繞堤根固工修繕工事

根固ブロックの製作が最盛期！

2013.12.4




【工事概要】

- 工事箇所 : 五所川原市十三 ~ つがる市富范町 地内
[根固工] 十三湖左岸 0.0~1.8K
[植生工] 岩木川左岸 1.2~1.8K
- 工期 : 平成25年9月5日 ~ 平成26年3月28日 (予定)
- 施工業者 : (株)伊藤鋳業
- 工事内容 : [根固工] 十三湖からの越波被害を軽減するため、堤防の前にコンクリートブロックを設置します。
[植生工] 堤防斜面に生えている芝を再生します。

○根固工標準横断面図

工事前の状況 →
(2013.10.10撮影)

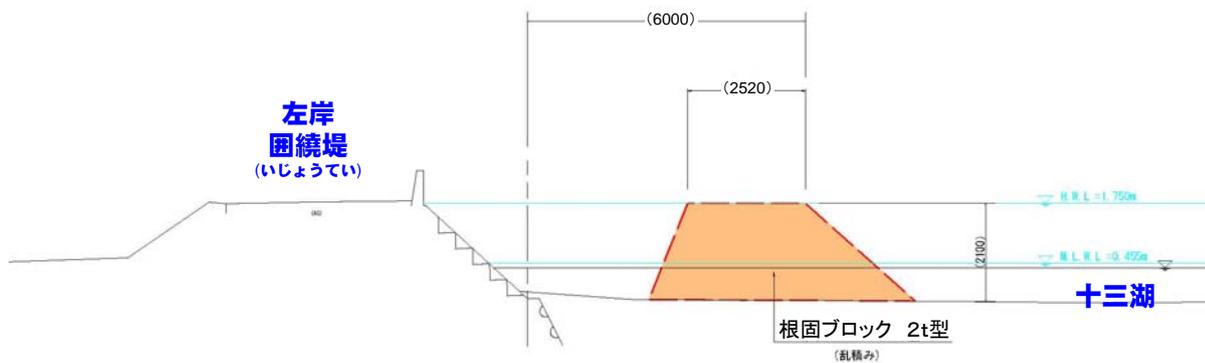

《進捗情報 H25. 12. 4現在》

○根固工 ブロック製作の様子

●ブロック製作ヤード全景



2013. 12. 4撮影



今回使用する根固ブロック



2013. 12. 4撮影

●ブロック製作の様子




2013. 12. 4撮影

【12月4日現在】
全4602個中 1903個製作完了！

＜ブロックの製作＞
1日約50個を目標に作業を進めています！

○根固工

今後、製作したブロックを十三湖に運搬し、堤防からクレーンを使い設置します。

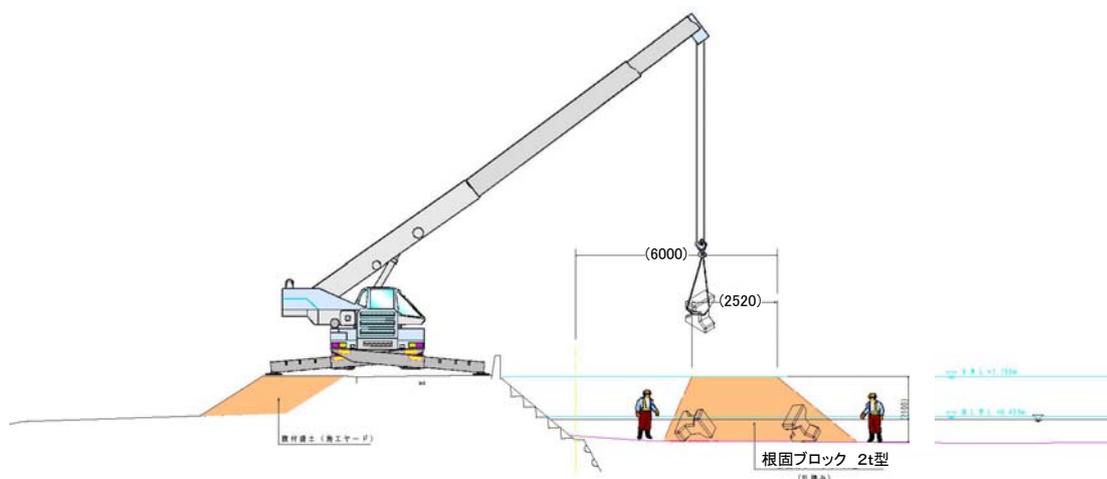

十三湖

○ 岩木川左岸 植生工

現在、堤防斜面の表面を削り取り、新しい土を貼り付けています！



今回の作業は、斜面の芝の生育状態が悪いため補修をしているものです。
今後、芝を張って完成です！



**工事に伴い、堤防の道路は通行できません。
ご協力をお願いします。**
