

岩木川の増水から命を守る工事が進んでいます！



【工事概要】

工事箇所 : つがる市柏桑野木田 ~ 弘前市大字三和 地内

[築 堤] 左岸 34.4 ~ 34.8 K

[河道掘削] 左岸 37.4 ~ 37.8 K

[樹木伐採] 右岸 36.0 ~ 37.2 K

工 期 : 平成25年9月3日 ~ 平成26年3月25日 (予定)


施工業者 : 株式会社 中幸建設

工事内容 : [築 堤] 現在ある堤防の幅を広げたり、高くするため堤防の盛土をします。
 [河道掘削] 岩木川に多くの水を流せるよう溜まった土砂を取り除きます。
 [樹木伐採] 川の流れを良くするために、河川敷に繁茂している樹木を伐採します。

《進捗情報 H26. 1. 17現在》

○ 築 堤 (鶴田町木筒地区)

標準横断面図 (計画)

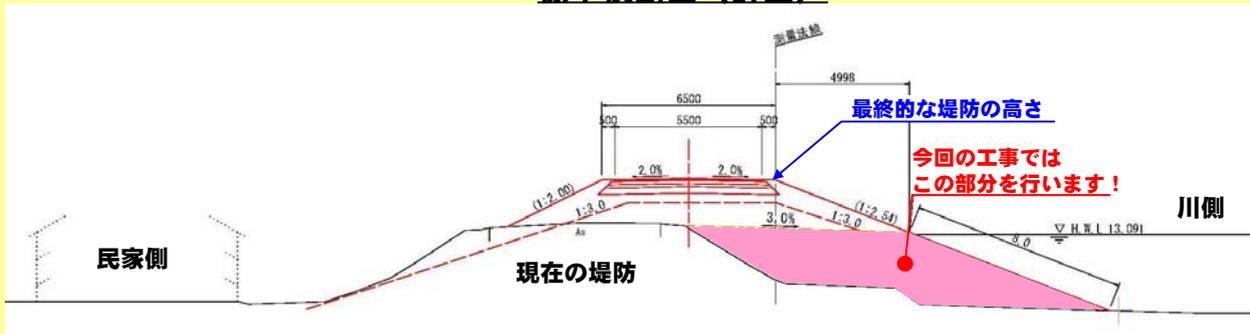

【着工前】



2013. 9. 7撮影

現在の堤防

鶴寿橋より左岸上流側を望む

【現在の様子】

盛土も進み、一部斜面を仕上げています



2014. 1. 17撮影

作業状況（鶴田町木筒地区）



2014. 1. 15撮影

バックホーやブルドーザで土を敷き均し



2014. 1. 15撮影

タイヤローラで締め固めを行います

○ 河道掘削（弘前市三和地区）



2014. 1. 13撮影

深いところで約4m位掘っています



2014. 1. 13撮影

掘った土は水を多く含みそのまま使えないので、ダンプトラックで保安橋付近まで運び、水気を抜くためにしばらく放置します。

○ 樹木伐採（鶴田町菖蒲川地区）

【着工前】 Before
河川敷に樹木が繁茂していました！



2013. 10. 26撮影

【現在の様子】 after
障害物が無くなり、遠くまで見通せるようになりました！
これで川の流れもだいぶ良くなります。



2014. 1. 17撮影

<作業状況>

チェーンソーで木を切り倒します



2013. 11. 29撮影

はさみ機でキャリアダンプに木を積み込み、現場内に集積した後、専用の車両に積み直し運び出します



2013. 11. 29撮影

鶴田町木筒地区では、雪で道幅が狭くなっていることもあり、工事車両とのすれ違いなどで車の通行がしにくくなっています。ご協力をお願いします。
