

十三湖左岸圍繞堤根固工修繕工事

工事が始まりました！

2013.11.1




【工事概要】

- 工事箇所 : 五所川原市十三 ~ つがる市富范町 地内
[根固工] 十三湖左岸 0.0~1.8K
[植生工] 岩木川左岸 1.2~1.8K
- 工期 : 平成25年9月5日 ~ 平成26年3月28日 (予定)
- 施工業者 : (株)伊藤鉱業
- 工事内容 : [根固工] 十三湖からの越波被害を軽減するため、堤防の前にコンクリートブロックを設置します。
[植生工] 堤防斜面に生えている芝を再生します。

○根固工標準横断面図

現在の状況 →
(2013.10.10撮影)

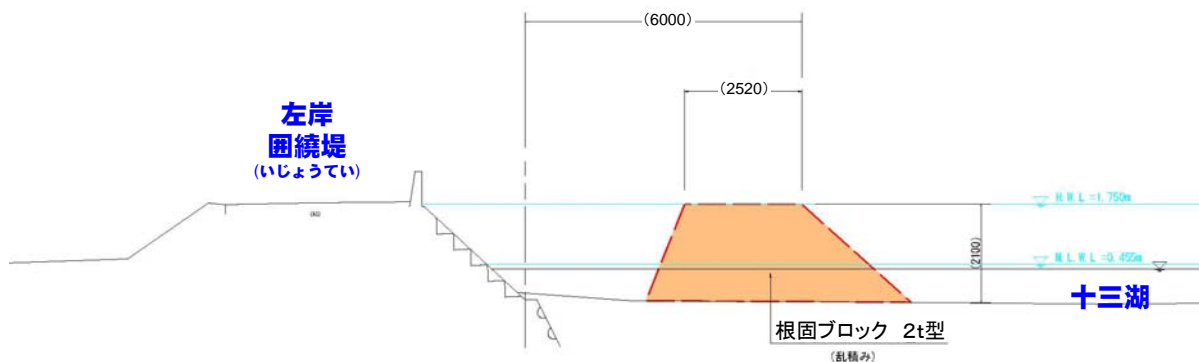

《進捗情報 H25. 10. 31現在》

○根固工 只今、ブロック製作中！

●ブロック製作ヤードの様子



① 型枠を組み立てる準備



② 型枠組立て



③ コンクリート打設



④ 養生



⑤ 脱枠




⑥ 完成



今回使用するブロックはこんな形です

○根固工

今後、製作したブロックを運搬し、堤防からクレーンを使い設置します。

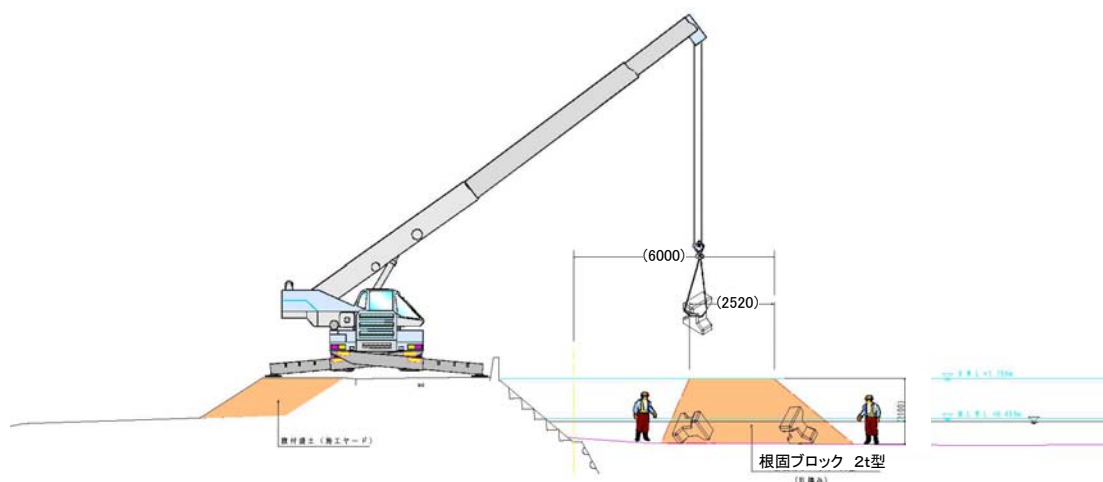

十三湖

○植生工

現在、堤防斜面の表面を削り取っています！



2013. 10. 10撮影



2013. 10. 28撮影

今回の作業は、斜面の芝の生育状態が悪いため補修をしているものです。

今後、植生に適した土を覆土し、芝を張って完成です！

**工事に伴い、堤防の道路は通行できなくなります。
ご協力をお願いします。**
