

根固ブロックの設置が始まりました！



【工事概要】

工事箇所 : 五所川原市十三 ~ つがる市富范町 地内  
 [根固工] 十三湖左岸 0.0~1.8K  
 [植生工] 岩木川左岸 1.2~1.8K  
 工期 : 平成25年9月5日 ~ 平成26年3月28日 (予定)  
 施工業者 : (株)伊藤鉱業  
 工事内容 : [根固工] 十三湖からの越波被害を軽減するため、堤防の前にコンクリートブロックを設置します。  
 [植生工] 堤防斜面に生えている芝を再生します。

《進捗情報 H26. 1. 15現在》


○ 根固工 ブロック製作

【1月14日現在】

全4941個中 3536個製作完了！ (進捗率71%)

1日約70個を目標に製作作業を進めています！

ブロック設置

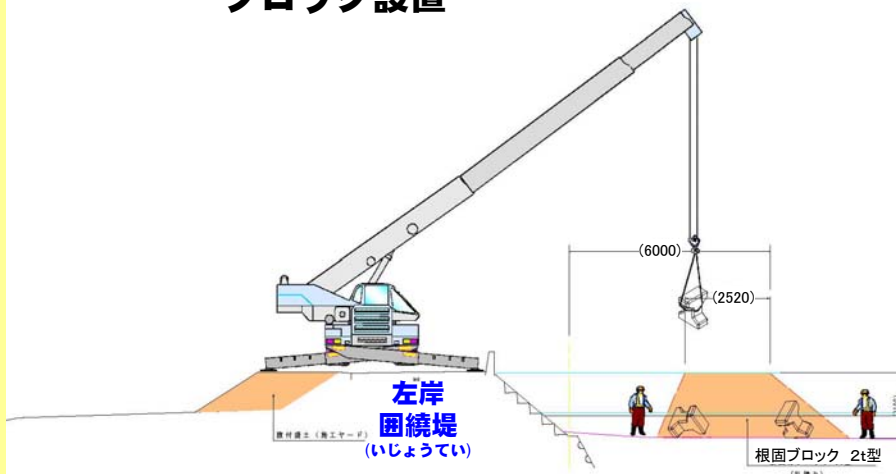


製作したブロックを十三湖に運搬し、堤防からクレーンを使い設置します。

工事前の状況 (2013. 10. 10撮影)



現在の状況 (2014. 1. 15撮影)

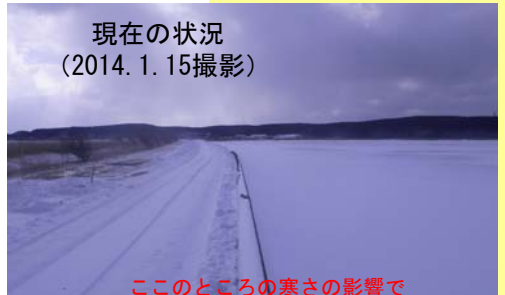

こここのところの寒さの影響で湖面が雪と氷で覆われています！氷の厚さは約15cmあります。

## 作業状況（岩木川河口付近）



水深は、深いところで腰の高さほどにもなります



**【1月14日現在】 全4941個中 298個設置完了！（進捗率6%）**

## ○ 岩木川左岸 植生工

芝を張り完成しています！

春になるときれいな緑色に変わります！

2013. 12. 4撮影



厳冬期に入り、作業環境がかなり厳しくなってきましたが、安全第一を心がけ無事故での早期完成を目指します。
