

## 根固ブロック設置 進捗率 5 割を超えました！

岩木川 五所川原出張所管理区間 52.2km



### 【工事概要】

工事箇所 : 五所川原市十三 ~ つがる市富范町 地内  
 [根固工] 十三湖左岸 0.0~1.8K  
 [植生工] 岩木川左岸 1.2~1.8K

工 期 : 平成25年9月5日 ~ 平成26年3月28日 (予定)



施工業者 : (株)伊藤鋳業

工事内容 : [根固工] 十三湖からの越波被害を軽減するため、堤防の前にコンクリートブロックを設置します。  
 [植生工] 堤防斜面に生えている芝を再生します。

### 《進捗情報 H26. 2. 24現在》

○ 根固ブロック製作  
**4637個 製作完了！ (進捗率100%)**

○ 根固ブロック設置  
**4637個のうち 2569個設置完了！ (進捗率55%)**

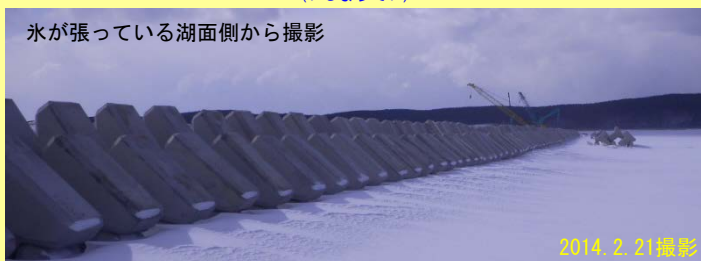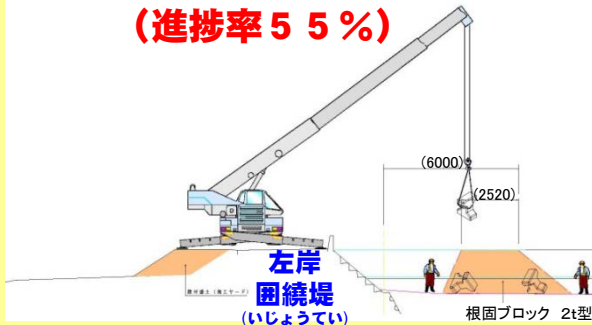

湖面が雪と氷で覆われています！  
 氷の厚さは約15cmあります。

## 作業状況（十三湖左岸圍繞堤）



堤防側に仮置きしていたブロックをクレーンで吊り上げ、旋回して湖水側に設置していきます。



作業は、十三湖の湖水の中、氷水の中で行われています。



ブロックを設置する箇所が凍っているため、腕の長いバックホウや人力で湖水の氷を取り除いてから作業しています。



【設置済箇所の状況】  
氷が張っている湖面側から撮影



【既に設置してある根固めブロック】  
夏場は湖水に浮かぶように見えるコンクリートブロックも、冬場は氷と雪で隠れてしまいます。



冬の十三湖はいつも風が強く、作業する環境としてはかなり厳しいものがあります。  
安全第一を心がけ、無事故での早期完成を目指しています。
