

令和6年8月2日
秋田県
秋田河川国道事務所

子吉川水系石沢川（秋田県由利本荘市）の 応急復旧完了について

令和6年7月25日の大雨による洪水によって被災した国管理区間の^{コヨシガワ スイケイシザワガハカガシ}子吉川水系石沢川左岸（1.0k付近）の堤防決壊箇所について、応急復旧工事が8月2日（金）16時に完了する予定です。

また、県管理区間の堤防決壊箇所5箇所は8月5日（月）までに完了する予定です。

これらの施工は、秋田県建設業協会の会員である^{ヤマウケンセツコウギョウ}山勇建設工業（株）、^{ヤマシカケンセツ}山科建設（株）、^{キクチ ケンセツ}菊地建設（株）、^{ムラオカケンセツコウギョウ}村岡建設工業（株）が、被災翌日から速やかに被災現場に入って工事に取りかかり、昼夜を問わず作業にご尽力いただいたものであり、深く感謝を申し上げます。

なお、国管理区間については、2日（金）16時より、鮎瀬橋付近（別紙－1）において、応急復旧の内容に係る説明を行うとともに、ご質問をお受けします。

応急復旧工事の実施内容

〈国の管理区間〉

【子吉川水系石沢川左岸1.0k 堤防決壊箇所の応急復旧工事の概要】

- | | |
|----------|---|
| 1. 現場位置 | ^{アキタケン ユリホンジョウシ アユセアユセンモチナイ} 秋田県由利本荘市鮎瀬鮎瀬下地内（別紙－2） |
| 2. 被災延長 | 約60m |
| 3. 工事着手 | 令和6年7月26日（金）10時 |
| 4. 工事完了 | 令和6年8月 2日（金）16時 |
| 5. 施工業者 | 山勇建設工業（株） |
| 6. 施工体制 | 24時間施工（着手から完了日時 7日6時間） |
| 7. 復旧工事量 | 盛土1,600m ³ 、ブロックによる盛土被覆700m ² |



〈県の管理区間〉

【子吉川水系石沢川3.6k～4.3k付近】 現在、施工中

1. 現場位置 アキタケンユリホンシヨウシカラスカワチサキ ソリマチ チサキ
秋田県由利本荘市烏川地先、雪車町地先（別紙ー3）
2. 被災延長 ① 約50m、② 約15m、③ 約20m、④ 約15m、⑤ 約40m
3. 工事着手 ・ 令和6年7月25日（木） 大型土のう製作着手
4. 工事完了 ・ 令和6年8月1日（木） 区間④、⑤完了
・ 令和6年8月2日（金） 区間③完了予定
・ 令和6年8月5日（月） 区間①完了予定
5. 施工業者 ①山勇建設工業（株）、②③④菊地建設（株）、⑤山科建設（株）
②③④⑤村岡建設工業(株)
6. 施工体制 24時間施工
7. 復旧工事量 盛土 約2,700m³、大型土のう 約1,300袋

国土交通省における令和6年7月24日からの大雨による出水への対応については以下のURLからご覧ください。現在も工事中的の子吉川右岸10.4K箇所の工事復旧状況も掲載しています。

http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75001/river/koyosi_syussuitaiou/index.html

〈発表記者会：秋田県政記者会〉

問 い 合 わ せ

〈国の管理区間について〉

東北地方整備局 秋田河川国道事務所
住所：秋田市山王1丁目10-29
電話：018-823-4167


担当：副所長（河川） なりた まさき 成田 正喜
工務第一課長 かねこ みつよし 金子 光義

〈県の管理区間について〉

秋田県建設部河川砂防課
電話：018-860-2518


担当：課長 たかすぎ ひてみき 高杉 英幹
チームリーダー かねざわ かずはる 金澤 和春

説明場所

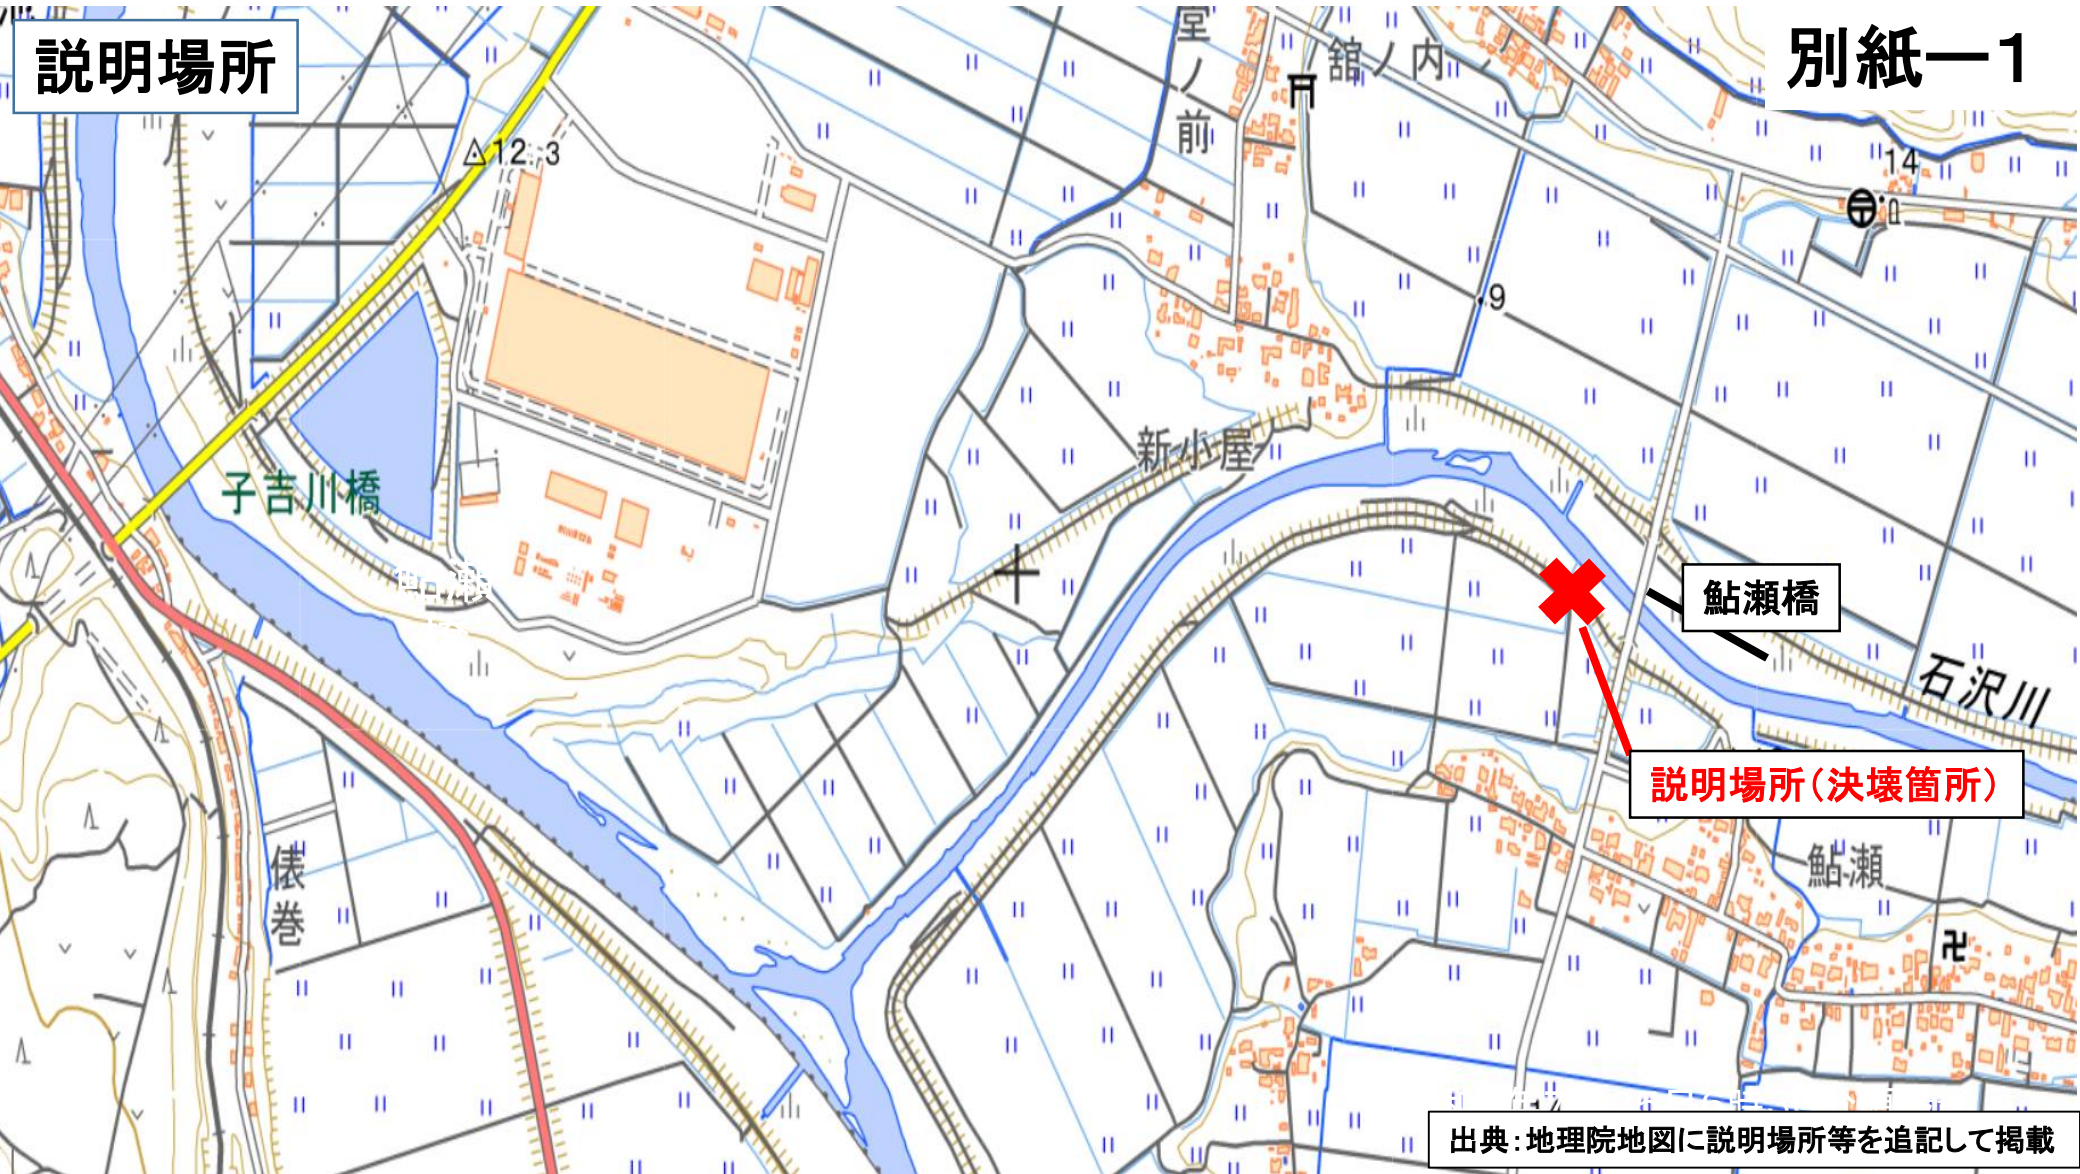

出典:地理院地図に説明場所等を追記して掲載

復旧工事現場位置図

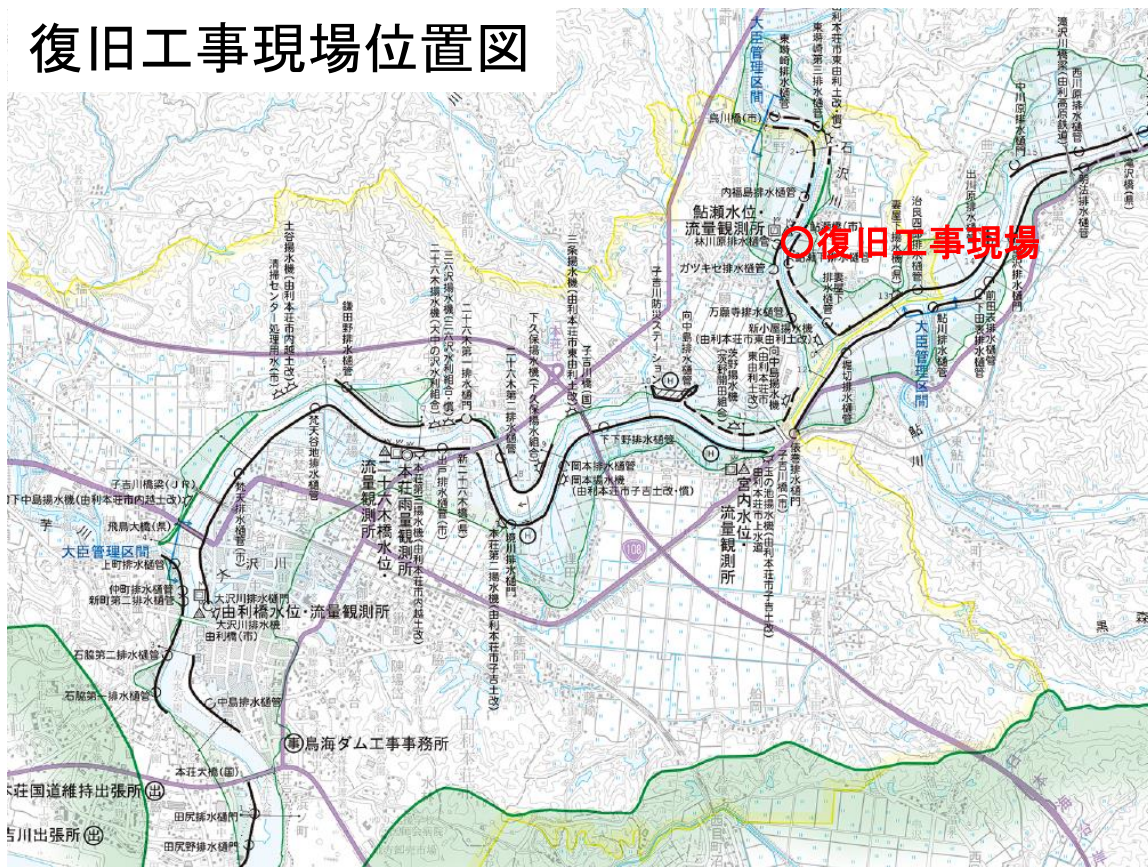

応急復旧状況写真




施工状況【山勇建設工業(株)】



石沢川 堤防決壊箇所【緊急復旧状況】

2024年8月2日 11時現在

別紙-3

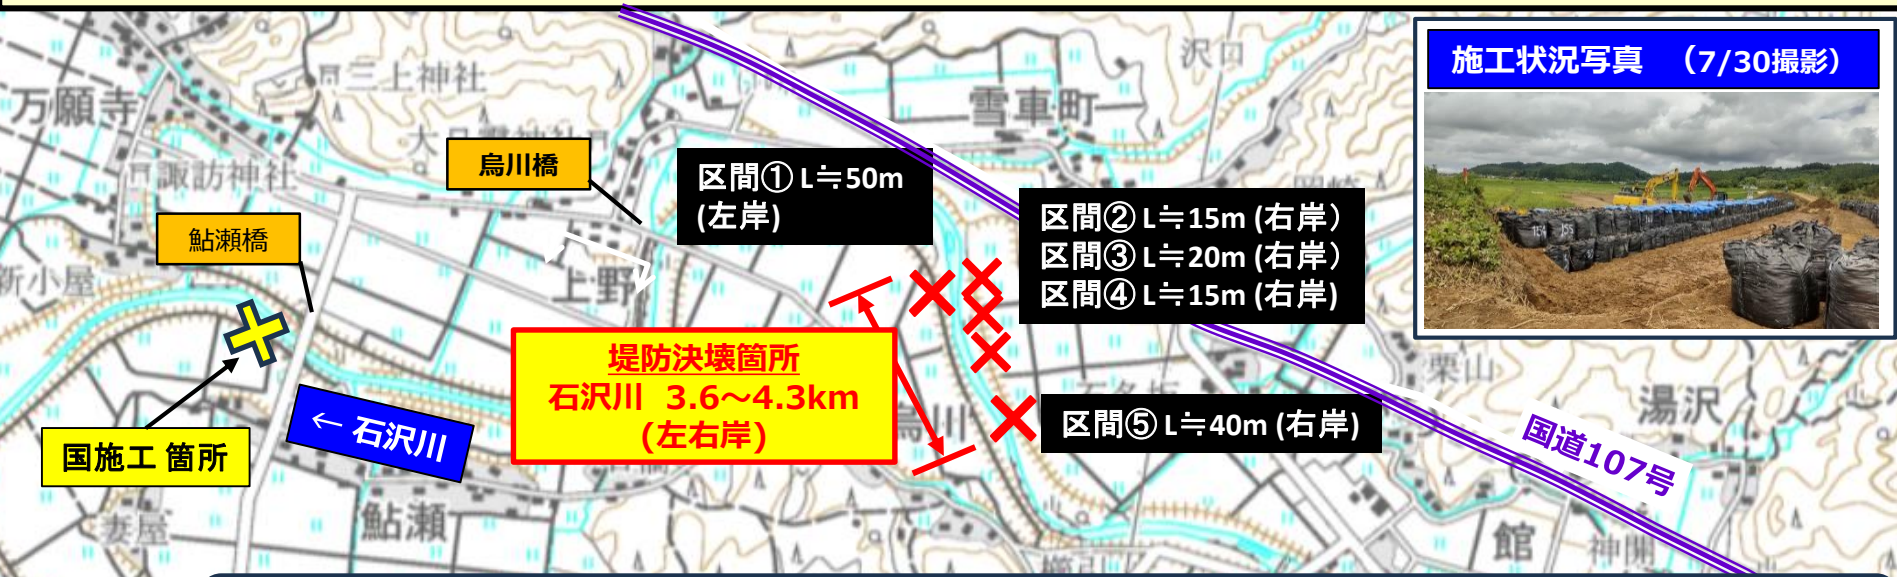

	区間①	区間②、区間③、区間④	区間⑤
被災直後			
緊急復旧状況	 ① 8/3完了予定	 ② 8/5完了予定 ③ 8/2完了予定 ④ 8/1完了	 ⑤ 8/1完了

石沢川

被災直後

緊急復旧状況
