

国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・岩手県の工事を引継ぎ、4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・当面の工事の状況等は以下のとおりです。
- ・今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。

■当面の工事内容と今後の予定

工事用道路のかさ上げ
(約2mかさ上げ)

～4月28日で完成予定


川の付替え掘削

～9月末まで

押え盛土

5月9日から着手予定

■工事の状況

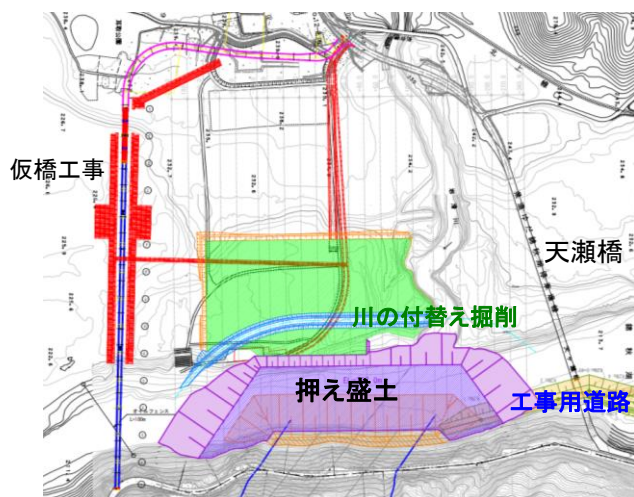

■その他

- ・工事用道路かさ上げ完了後にかんがい用水確保のため、ダム水位を約6m上昇させます。


地すべり関係工事概要図及び施工業者


＜大石地区関連工事安全連絡協議会を設立＞

1. 湯田ダム貯水池浸水被害軽減対策工事：(株)小原建設
2. 湯田ダム貯水池浸水被害軽減対策工事(その2)：(株)板谷建設
3. 湯田ダム貯水池浸水被害軽減対策工事(その3)：(株)小原建設
(工期：令和5年3月3日まで)
4. 一般国道107号大石地区仮橋架設工事：(株)小田島組(株)たかしん興業JV

1～3. 国発注、4. 県発注

工事に関する問合せ先：(株)小原建設 鈴木(080-1687-8291)

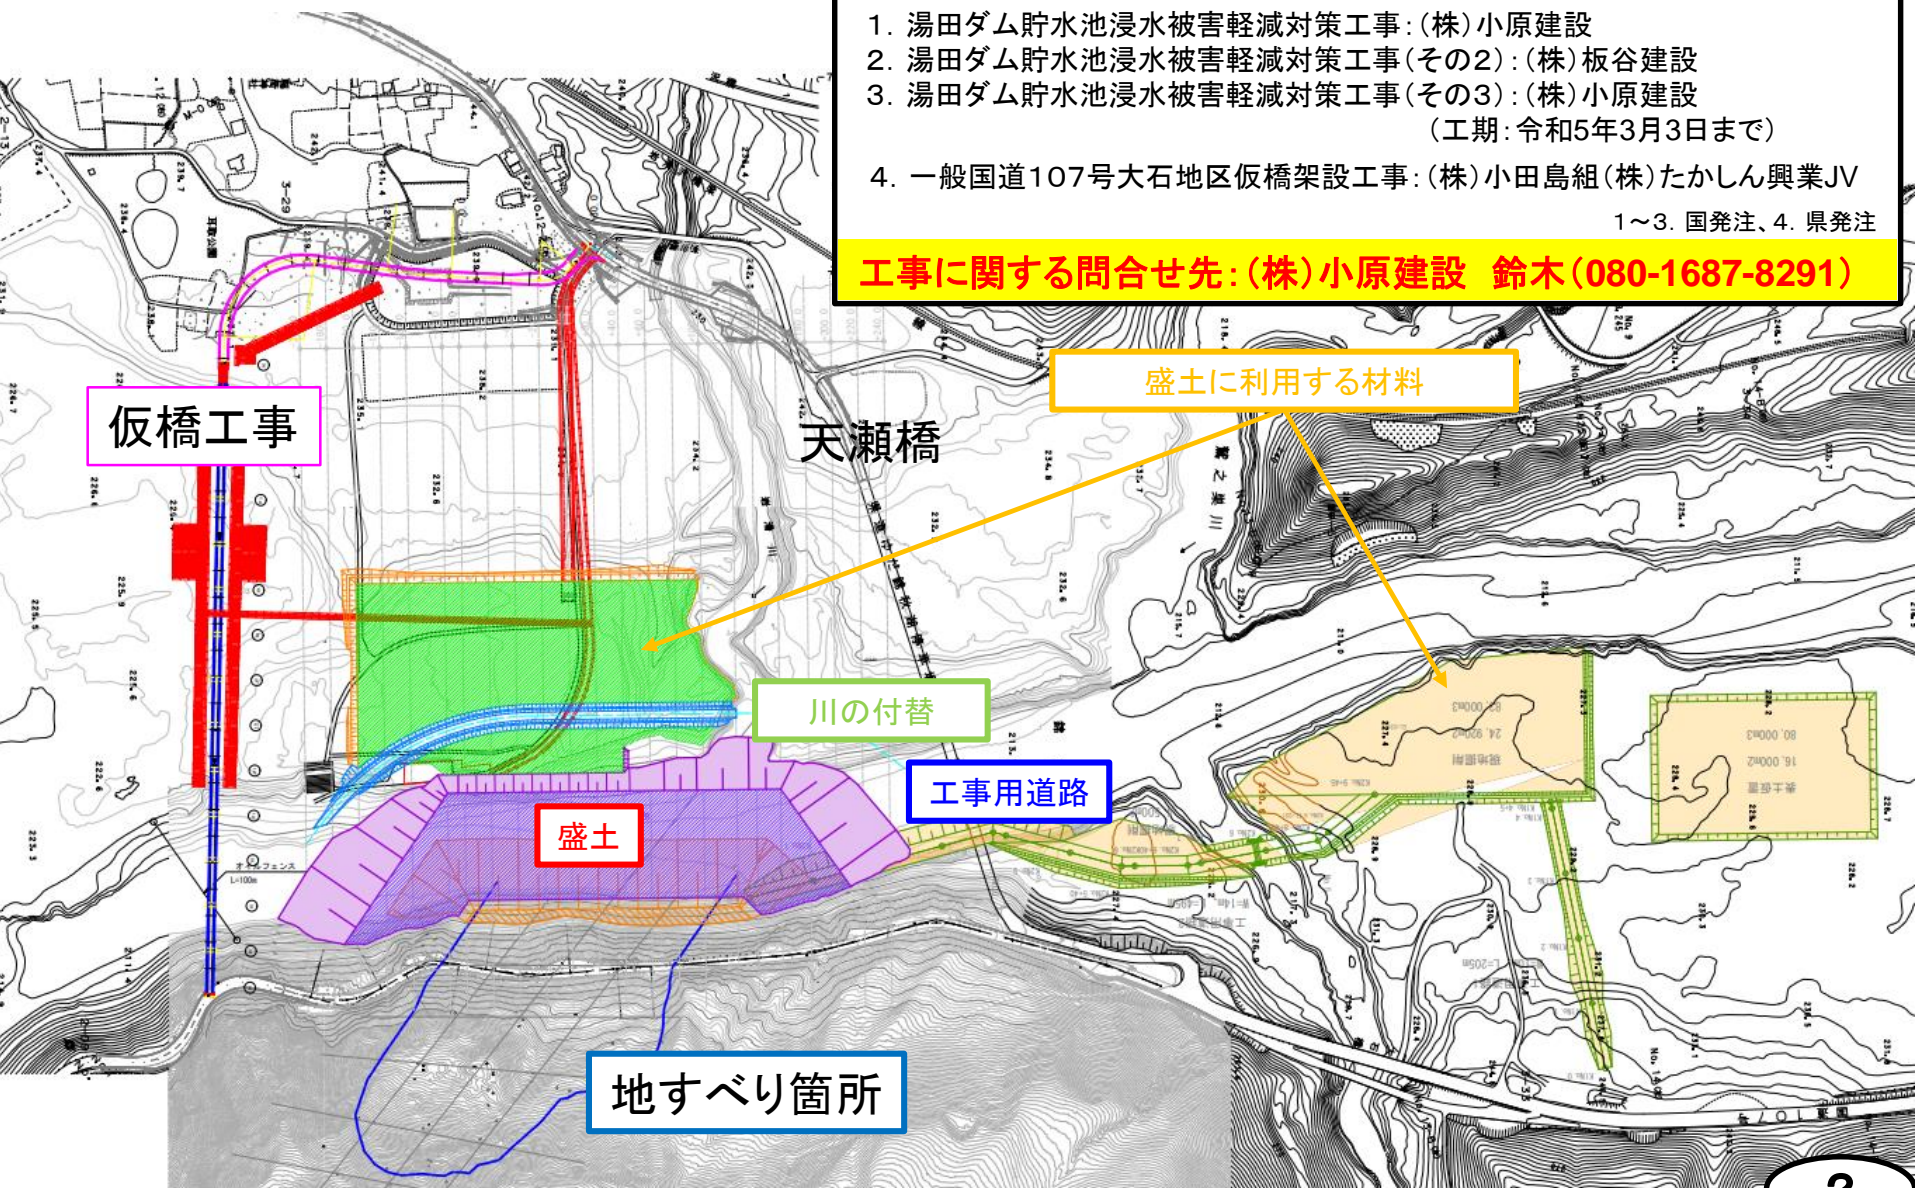


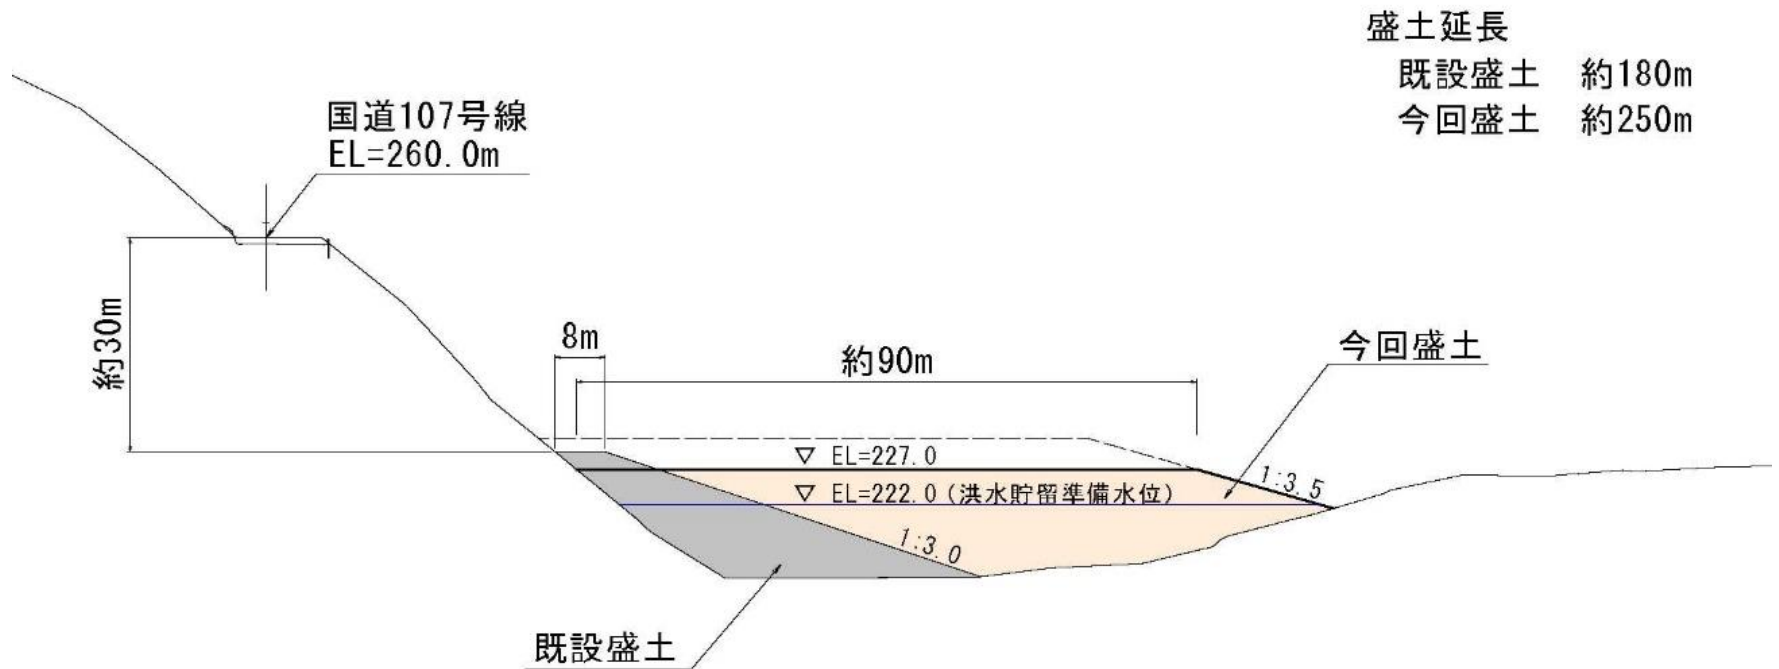


○交通誘導員を配置します。

現場の出入り口に交通誘導員を配置します。

配置人員 1名

配置時間 8:00～16:30(工事休止期間を除く)

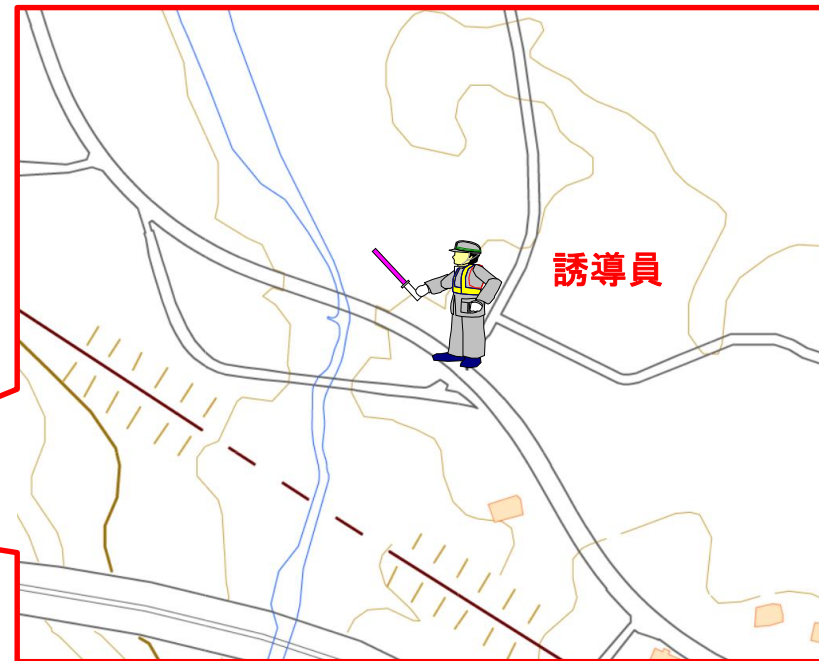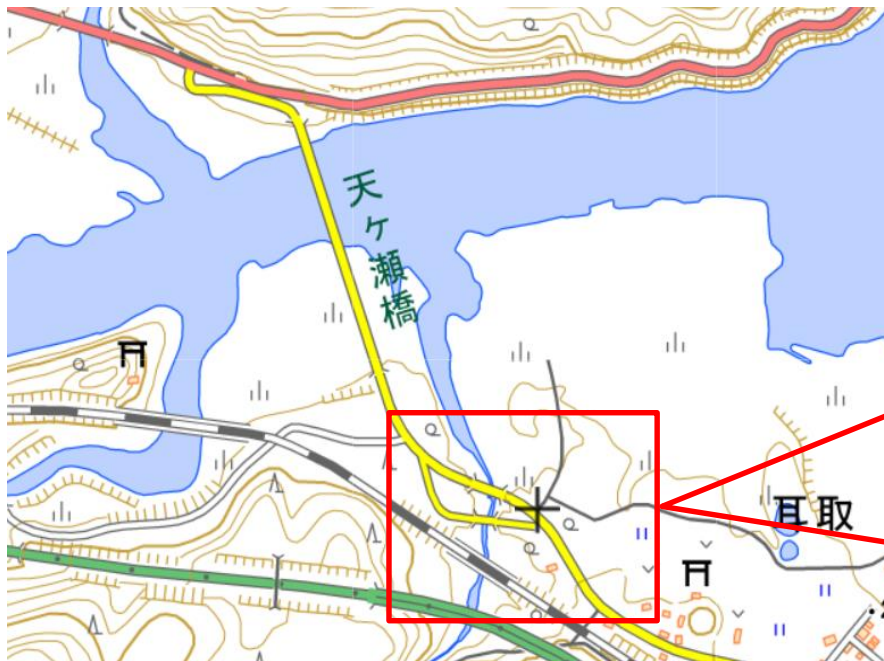

○散水車を配備します。

工事期間中は、現場に散水車を常駐させ、道路が汚れた場合には散水を行うとともに、汚れがひどい場合は人力にて清掃を行います。

