

# 三陸沿岸道路(山田～宮古南)工事状況のお知らせ vol.02

平成25年8月28日現在



田名部地区でBOXカルバートを施工します。迂回路の利用の際は、走行に十分注意をお願いいたします。  
◆施工:①板宮建設



BOXカルバートを設置するための地盤改良を実施しています。BOXカルバートは3基施工します。  
◆施工:①板宮建設




荒川地区で道路改良とBOXカルバートを設置する工事が契約になりました。よろしくお願いいたします。  
◆施工:⑤矢作建設工業



荷竹地区でBOXカルバートを施工予定です。伐採作業を進めています。  
◆施工:③日本国土開発



馬越地区で道路改良を実施予定です。伐採前の下草刈作業を進めています。  
◆施工:④樋下建設

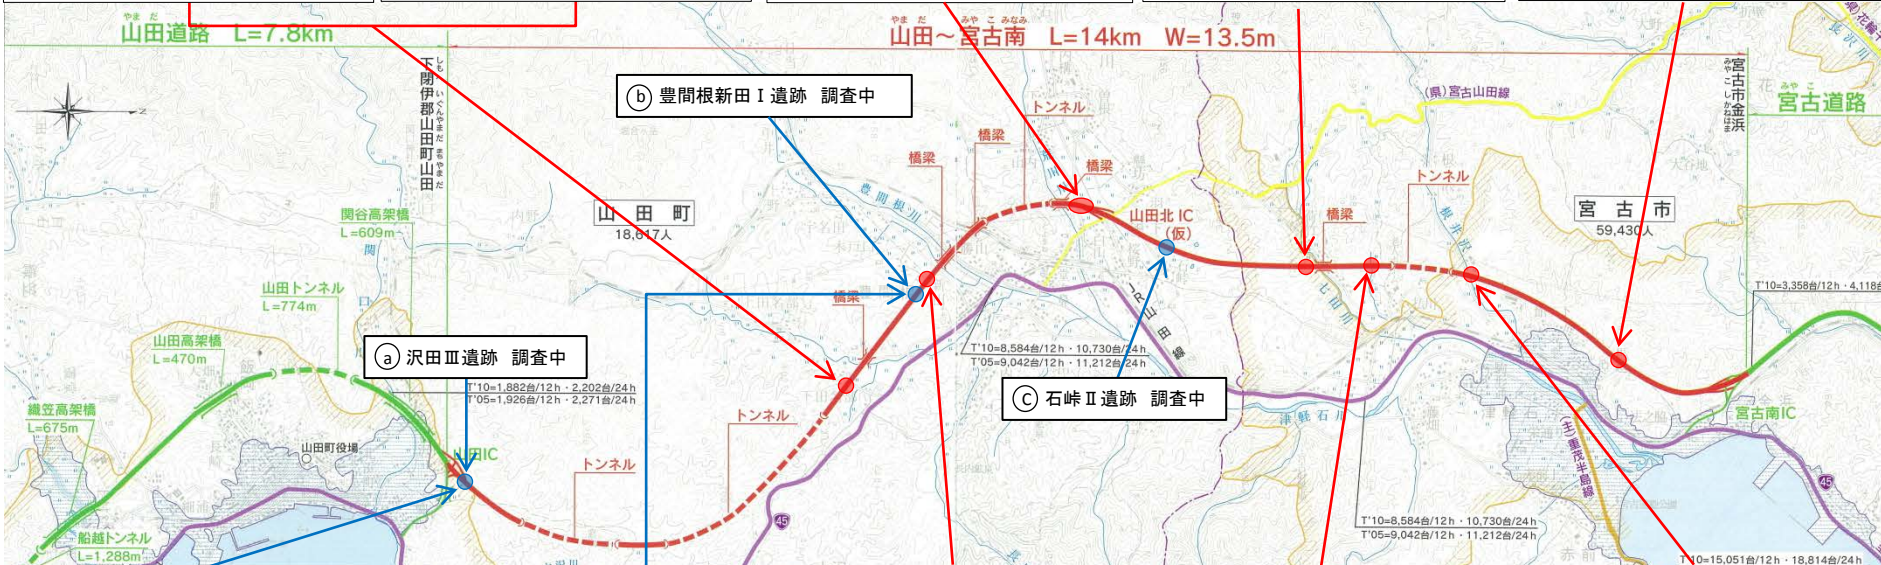

縄文時代の竪穴住居跡です。貝を介して当時の食生活をうかがうことができる発見です。(埋蔵文化財センターHPより)  
◆調査:埋蔵文化財センター




落とし穴が確認されています。形状から縄文時代のものと考えられます。(埋蔵文化財センターHPより)  
◆調査:埋蔵文化財センター



豊間根小学校の近くでBOXカルバートを施工します。9月中旬に迂回路が完成予定です。9月中旬に迂回路が完成予定です。走行に注意をお願いいたします。  
◆施工:②中間組



弘川地区で伐採作業を実施しています。今後は豊間根地区でも伐採を実施予定です。  
◆施工:⑥宮古地方森林組合

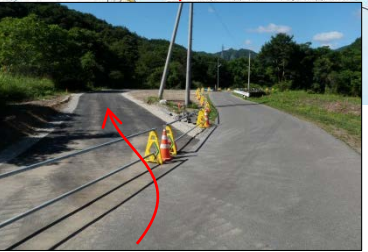

根井沢川の付替えてBOXカルバートを施工します。9月2日(月)から迂回路の利用をお願いいたします。  
◆施工:③日本国土開発

ご不便をお掛けいたしますが、1日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

◎工事に関する問い合わせ先

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

◆工事一覧表

工事名	工事箇所	受注者	現場責任者	工事期間
① 豊間根南地区改良工事	山田町豊間根第9地割 地内	(株)板宮建設	長田	平成25年3月6日 ~ 平成25年10月下旬 予定
② 豊間根地区改良工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年1月下旬 予定
③ 津軽石地区改良工事	宮古市津軽石第15地割 ~ 第19地割 地内	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年2月下旬 予定
④ 馬越地区改良工事	宮古市津軽石第4地割 ~ 第3地割 地内	極下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年1月下旬 予定
⑤ 豊間根北地区道路改良工事	山田町豊間根第20地割 地内	矢作建設工業(株)	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年2月下旬 予定
⑥ 山田宮古地区伐採作業	山田町山田第3地割 ~ 宮古市金浜第3地割 地内	宮古地方森林組合	中居	平成25年7月10日 ~ 平成26年3月中旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

◆埋蔵文化財発掘調査一覧表

○調査機関 公益財団法人 埋蔵文化財センター

遺跡調査名	調査箇所	現場責任者	調査期間
④ 沢田Ⅲ遺跡	山田町山田第3地割 地内	阿部	平成25年4月11日 ~ 平成25年11月下旬 予定
⑤ 豊間根新田Ⅰ遺跡	山田町豊間根第7地割 地内	濱田	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
⑥ 石峠Ⅱ遺跡	山田町石峠第4地割 地内	北村	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定

※間木戸Ⅱ・V遺跡、津軽石大森遺跡、金浜V遺跡は調査が終了しました。

☆宮古市津軽石(根井沢地区)で道路規制を実施します。

宮古市津軽石の根井沢地区でBOXカルバートの施工を予定しています。それに伴い、道路の通行規制が発生いたしますのでお知らせいたします。通行の際は十分注意していただくようお願いいたします。

◆通行止め期間：平成25年9月下旬～平成27年3月まで(予定)

◆迂回路：下の図を参照願います。

