

三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北

工事状況のお知らせ vol.06

東北地方整備局 三陸国道事務所 平成25年10月18日現在



施工：②本間組



施工：②本間組



施工：宮古地方森林組合



施工：⑤矢作建設工業



調査：埋蔵文化財センター



調査：埋蔵文化財センター

写真は町道豊間根関口線です。BOXカルバートの据付作業が10月下旬から始まります。


写真は町道木戸口線です。2/3以上の据付が完了しました。終了後は、町道豊間根関口線に移ります。

町道豊間根川堤防線から田名部方面を眺めた状況です。豊間根川堤防沿いの伐採が終了しました。

工事用道路の造成作業を実施中です。大型ダンプが錯綜していますので通行の際はご注意ください。

調査区中央では溝状や楕円形をした陥し穴(写真、溝状)が約40基見つかっています。

発掘範囲を広げて鋭意調査を進めています。

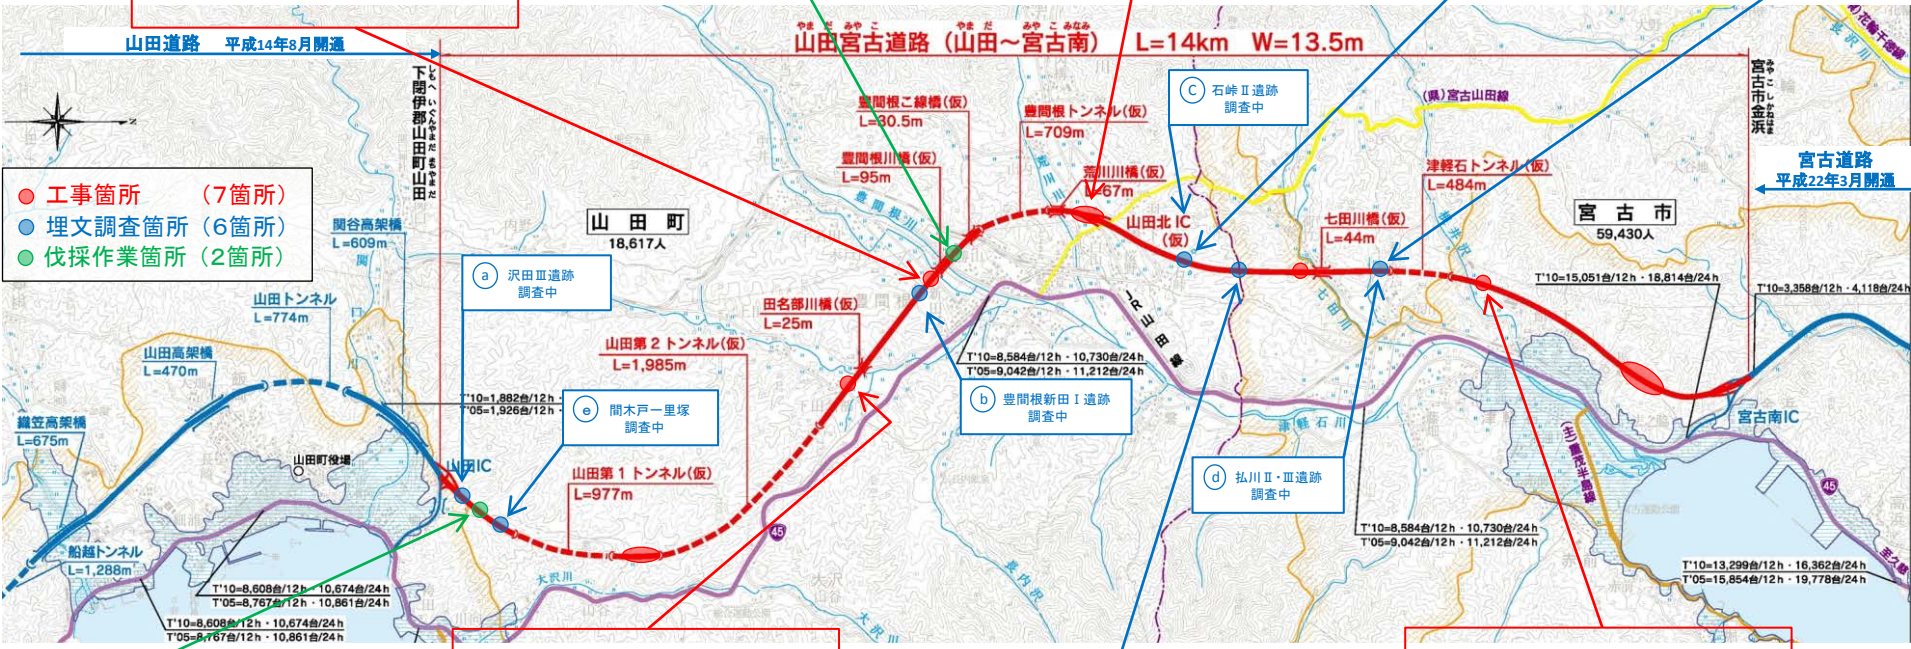

施工：宮古地方森林組合



施工：①板宮建設



施工：①板宮建設



施工：④樋下建設



施工：③日本国土開発



施工：③日本国土開発

間木戸地区の伐採を鋭意実施しており、間木戸 I 遺跡の調査に入る準備を進めています。

3基目のBOXカルバートの据付作業が始まりました。10月下旬に終了予定です。

写真は町道下田名部線です。4分割したBOXカルバートの据付作業が終了しました。

荷竹地区と石峠地区で埋蔵文化財の試掘調査を実施するため、下草刈を実施しています。

BOXカルバート(現場打)を施工するための鋼矢板打ち込み作業がもうすぐ終了いたします。

迂回道路を鋭意造成中です。開通までもうしばらくお待ちください。

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

工事名	工事箇所	受注者	現場責任者	工事期間
① 豊間根南地区改良工事	山田町豊間根第9地割 地内	(株)板宮建設	長田	平成25年3月6日 ~ 平成25年10月下旬 予定
② 豊間根地区改良工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年1月下旬 予定
③ 津軽石地区改良工事	宮古市津軽石第15地割 ~ 第19地割 地内	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年2月下旬 予定
④ 馬越地区改良工事	宮古市津軽石第4地割 ~ 第3地割 地内	樋下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年1月下旬 予定
⑤ 豊間根北地区道路改良工事	山田町豊間根第20地割 地内	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年2月下旬 予定
⑥ 大沢地区改良工事	山田町大沢第4地割 ~ 石峠第3地割 地内	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月26日 ~ 平成26年3月下旬 予定
⑦ 山田宮古地区伐採作業	山田町山田第3地割 ~ 宮古市金浜第3地割 地内	宮古地方森林組合	中磨、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年3月中旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

○調査機関 公益財団法人 埋蔵文化財センター

◆埋蔵文化財発掘調査一覧表

遺跡調査名	調査箇所	現場責任者	調査期間
① 沢田Ⅲ遺跡	山田町山田第3地割 地内	阿部	平成25年4月11日 ~ 平成25年11月下旬 予定
② 豊間根新田Ⅰ遺跡	山田町豊間根第7地割 地内	濱田、古館	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
③ 石峠Ⅱ遺跡	山田町石峠第4地割 地内	北村、佐藤	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
④ 弘川Ⅱ・Ⅲ遺跡	宮古市津軽石第14地割 地内	村木	平成25年9月17日 ~ 平成25年11月下旬 予定
⑤ 間木戸一里塚(※1)	山田町山田第1地割 地内	小林、川向	平成25年9月中旬 ~ 平成25年11月下旬 予定

※1. 間木戸一里塚は、山田町生涯学習課で調査を実施しています。

○4月から開始した【間木戸Ⅱ・Ⅲ遺跡】、【津軽石大森遺跡】、【金浜Ⅴ遺跡】は調査が終了しました。

☆町道豊間根川堤防線の迂回路造成工事を実施します。

山田町豊間根地区で、(仮称)豊間根川橋の下部工事を予定しています。橋台施工にあたり、町道豊間根川堤防線に影響することから、迂回路の造成工事を11月から予定しております。利用される方には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくをお願いいたします。

- ◆工事箇所 山田町豊間根第3地割地内(施工担当：樋下建設)
- ◆施工期間 11月中旬～12月中旬 ※天候等の影響により延びる場合があります。



☆県内最大のトラッククレーン車が2台稼働中です!

山田町豊間根地区の2箇所でボックスカルバートの据付作業が行われておりますが、稼働しているクレーン車は、吊上げ能力が220tを誇るトラッククレーン車で、岩手県内にこの2台しかありません。とっても迫力がありますので、機会があれば是非ご覧になってください。

◆工事箇所と施工期間

- 山田町豊間根第9地割地内(施工担当：板宮建設)
10月2日(木)～10月下旬まで(予定) ※3基予定のうち、3基目を施工中。
- 山田町豊間根第7地割地内(施工担当：本間組)
10月7日(月)～11月上旬まで(予定) ※3基予定のうち、1基目を施工中。



☆「沢田川遺跡」の現地説明会を10月26日(土)に開催します!

山田町山田第3地割地内で調査を進めている「沢田Ⅲ遺跡」で現地説明会を開催いたします。縄文時代中期の竪穴住居やフラスコ状の貯蔵穴が多数見つかっています。遺物は土器や石器のほか炭化したトチの実や、アサリの貝殻などが多数出土しています。さらに古代の鉄生産関連遺構が多数見つかっています。興味のある方は是非参加してください!

- ◆日時 平成25年10月26日(土) 午後1時～2時まで
- ◆場所 山田町山田第3地割 地内



沢田Ⅲ遺跡の地図はこちら→
