

三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北

工事状況のお知らせ vol.08

東北地方整備局 三陸国道事務所

平成25年11月20日現在



調査：埋蔵文化財センター
豊間根小学校の5、6年生(約40名)が見学に訪れました。陥し穴の跡を興味深そうに覗いていました。




今回掘付完了
3号BOX
2号BOX
1号BOX
町道 豊間根関口橋
町道 本戸口橋
施工：②本間組
3基目のBOXカルバート(3号BOX)の掘付作業が完了しました。本間組さんの施工分はこれで終了です。まだ迂回路での通行が続きますので、引き続き工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。



施工：③日本国土開発
根井沢工区でBOXカルバート(現場打)の施工を実施中です。掘削作業を鋭意進めています。掘削が終了すれば、地盤改良、均しコンクリートの打設、鉄筋と型枠の組み立てを実施していきます。



施工：④掘下建設
掘削土の積み込み・運搬状況です。荒川地区、荷竹地区及び豊間根地区等へ搬出します。

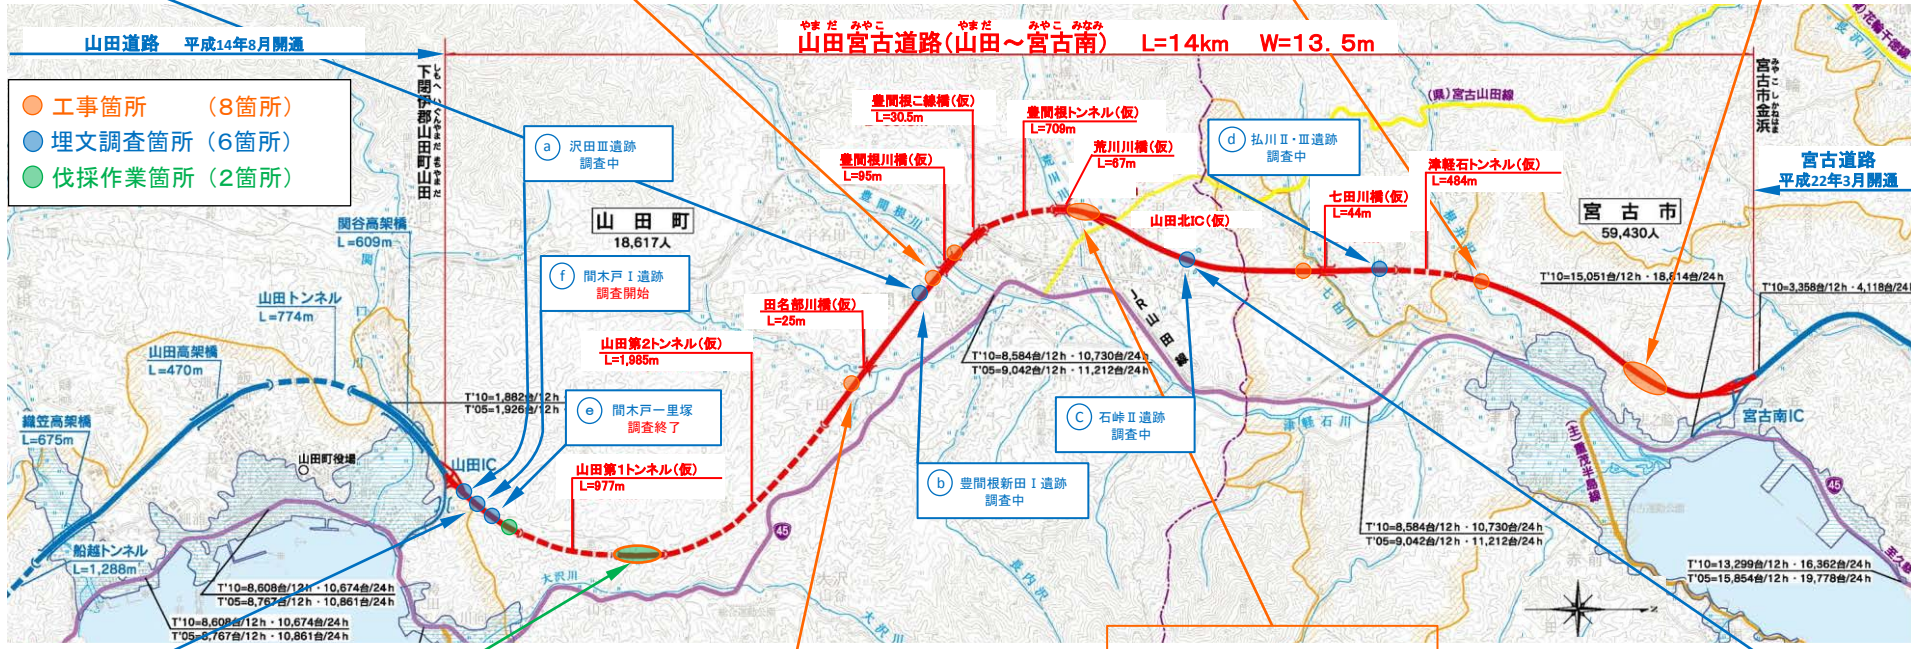

- 工事箇所 (8箇所)
- 埋文調査箇所 (6箇所)
- 伐採作業箇所 (2箇所)



調査：埋蔵文化財センター
間木戸I遺跡の調査を進めるため、表土剥ぎを開始しました。よろしくお願いたします。



施工：⑦宮古地方森林組合
大沢地区で伐採作業を実施中です。通行にご不便をお掛けしますが、よろしくお願いたします。



施工：①板宮建設
下田名部地区で実施しました豊間根南地区改良工事が概々終了しました。(詳細は裏面で！)



施工：⑤矢作建設工業
(仮称)荒川川橋の施工に着手しました。橋台を施工するため、床掘りを開始しています。



施工：⑤矢作建設工業
荒川地区の道路造成工事を実施中です。タンクトラックが頻りに走行していますのでご注意ください。



調査：埋蔵文化財センター
調査区中央では石で囲った炉(写真中央)のある竪穴住居が見つかっています。

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

①	工事名	工事箇所	受注者	現場責任者	工事期間
①	豊間根南地区改良工事	山田町豊間根第9地割 地内	(株)板宮建設	長田	平成25年3月6日 ~ 平成25年10月29日 予定
②	豊間根地区改良工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年02月下旬 予定
③	津軽石地区改良工事	宮古市津軽石第15地割 ~ 第19地割 地内	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年03月中旬 予定
④	馬越地区改良工事	宮古市津軽石第4地割 ~ 第3地割 地内	樋下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年01月下旬 予定
⑤	豊間根北地区道路改良工事	山田町豊間根第20地割 地内	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年02月下旬 予定
⑥	大沢地区改良工事	山田町大沢第4地割 ~ 石峠第3地割 地内	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月26日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑦	山田宮古地区伐採作業	山田町山田第3地割 ~ 宮古市金浜第3地割 地内	宮古地方森林組合	中居、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年03月中旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

◆埋蔵文化財発掘調査一覧表

○調査機関 公益財団法人 埋蔵文化財センター

①	遺跡調査名	調査箇所	現場責任者	調査期間
①	沢田Ⅲ遺跡	山田町山田第3地割 地内	阿部	平成25年4月11日 ~ 平成25年11月下旬 予定
②	豊間根新田Ⅰ遺跡	山田町豊間根第7地割 地内	濱田、古館	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
③	石峠Ⅱ遺跡	山田町石峠第4地割 地内	北村、佐藤	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
④	弘川Ⅱ・Ⅲ遺跡	宮古市津軽石第14地割 地内	村木	平成25年9月17日 ~ 平成25年11月下旬 予定
⑤	間木戸一里塚(※1)	山田町山田第1地割 地内	小林、川向	平成25年9月中旬 ~ 調査が終了しました。
⑥	間木戸Ⅰ遺跡	山田町山田第3地割 地内	村上	平成25年11月5日 ~ 平成25年11月下旬 予定

※1. 間木戸一里塚は、山田町生涯学習課で調査を実施しています。
○4月から開始した【間木戸Ⅱ・Ⅲ遺跡】、【津軽石大森遺跡】、【金浜Ⅴ遺跡】は調査が終了しました。

☆豊間根南地区改良工事（施工担当：板宮建設）が概ね終了しました。

山田町豊間根の下田名部地区で実施してました豊間根南地区改良工事が概ね終了しました。5月から始まる田植えに間に合わせるための畦畔設置から始まり、6月に開催した起工式会場の造成、カメムシ対策として道路事業用地内の草刈作業、台風26号で林道に倒れた木の除去作業等を率先して実施して頂きました。今後は完成検査に向けた書類整理や、現場事務所の後片付け等を残すのみとなりました。山田宮古道路の最初の本格的な工事として無事に終了させて頂きました。大変ありがとうございました。



三陸沿岸道路（山田宮古道路）の第1号工事として3月に着手した本工事は、11月末に無事故・無災害で完成を迎えることになりました。6月の起工式に始まり、環道切り直し迂回路、大型車両の通行等地域住民の皆様にはご迷惑、ご不便をおかけしましたが、皆様の多大なるご理解とご協力を賜り、無事工事完成を迎えることが出来ました。地域皆様をはじめ、関係各位の方々には、大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。最後に、復興道路が無事故・無災害で早期完成されますことを心から祈念いたします。

☆三陸沿岸道路 田野畑道路「起工式」を11月7日（木）に開催しました!

三陸沿岸道路 田野畑道路 は、三陸沿岸道路の一部を構成する延長約6kmの自動車専用道路です。これまで調査設計、用地取得等を進めてきたところですが、このたび新規に工事に着手する運びとなったことから、一日も早い完成と工事の安全を祈念して、平成25年11月7日（木）に「起工式」を開催しました。



▲鉄入れを行う田野畑村 石原村長（中央）ほかご来賓の皆様

ひとくちメモ・・・三陸沿岸道路 田野畑道路

三陸沿岸道路 田野畑道路は、田野畑村大戸から田野畑村田野畑結ぶ、約6kmの自動車専用道路です。環道の線形不良区間を回避し、走行性が向上するとともに、所要時間の短縮により救援物資の輸送拠点となる久慈港と宮古市間のアクセシビリティ向上、救急医療施設への到達性向上等の効果が期待されます。

三陸沿岸道路 田野畑道路 延長 約6km

国道45号現道
