

三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北

工事状況のお知らせ vol.09

東北地方整備局 三陸国道事務所 平成25年12月05日現在



豊間根新田 I 遺跡
調査:埋蔵文化財センター

施工:⑦橋倉建設

施工:③橋下建設

施工:②日本国土開発

施工:②日本国土開発


豊間根新田 I 遺跡で11月16日(土)に現地説明会が開催され、地元の方々など約80名が参加しました。

(仮称)豊間根川橋の下部工事が契約となりました。よろしくお願いたします。(詳細は裏面で！)

町道豊間根川堤防線の迂回路造成工事が始まりました。ダンプトラックの通行にご注意願います。

津軽石荷竹地区で、BOXカルバートの据付準備を進めています。12月中旬から据付が始まります。

津軽石根井沢工区でBOXカルバート(現場打)の施工を実施中です。鉄筋の組み立てを実施中です。今後コンクリート打設で工事車両が頻りに通行いたします。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

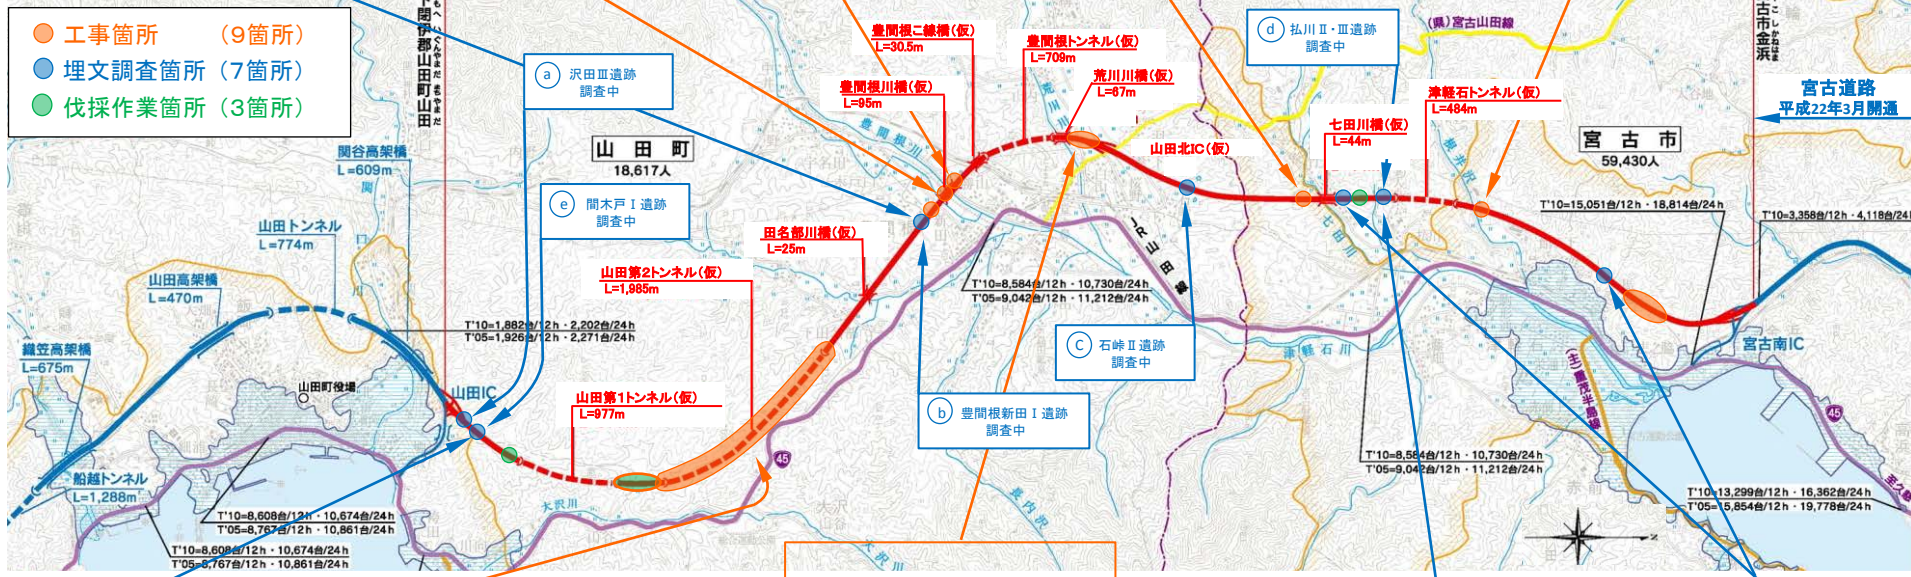

間木戸 I 遺跡の調査を進めるため、表土剥ぎを鋭意実施中です。よろしくお願いたします。

山田宮古道路で最初のトンネル工事が契約となりました。よろしくお願いたします。(詳細は裏面で！)

(仮称)荒川川橋の橋台を施工中です。これから足場、鉄筋、型枠の組み立てを実施しています。

写真は町道白山船石線です。BOXカルバートの施工をするため、迂回路を造成しています。

9月から開始した弘川 II・III 遺跡の発掘調査が12月6日に終了します。(詳細は裏面で！)

津軽石荷竹地区及び津軽石大森地区で埋蔵文化財の試掘調査を実施しました。

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

①	工事名	工事箇所	受注者	現場責任者	工事期間
①	豊間根地区改良工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年02月下旬 予定
②	津軽石地区改良工事	宮古市津軽石第15地割 ~ 第19地割 地内	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年03月下旬 予定
③	馬越地区改良工事	山田町豊間根第3地割 ~ 宮古市津軽石第3地割 地内	樋下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年03月下旬 予定
④	豊間根北地区道路改良工事	山田町豊間根第20地割 地内	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑤	大沢地区改良工事	山田町大沢第4地割 ~ 石峰第3地割 地内	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月26日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑥	山田第2トンネル工事	山田町大沢第3地割 ~ 豊間根第9地割 地内	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成26年02月上旬 予定
⑦	豊間根川橋下部土工	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	徳倉建設(株) 東北支店	佐野	平成25年11月29日 ~ 平成26年06月下旬 予定
⑧	山田宮古地区伐採作業	山田町山田第3地割 ~ 宮古市金浜第3地割 地内	宮古地方森林組合	中居、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年03月中旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

◆埋蔵文化財発掘調査一覧表

○調査機関 公益財団法人 埋蔵文化財センター

①	遺跡調査名	調査箇所	現場責任者	調査期間
①	沢田Ⅲ遺跡	山田町山田第3地割 地内	阿部	平成25年4月11日 ~ 平成25年12月上旬 予定
②	豊間根新田Ⅰ遺跡	山田町豊間根第7地割 地内	濱田、古館	平成25年7月1日 ~ 平成25年12月中旬 予定
③	石峰Ⅱ遺跡	山田町石峰第4地割 地内	北村、佐藤	平成25年7月1日 ~ 平成25年12月中旬 予定
④	弘川Ⅱ・Ⅲ遺跡	宮古市津軽石第14地割 地内	村木	平成25年9月17日 ~ 平成25年12月上旬 予定
⑤	間木戸Ⅰ遺跡	山田町山田第3地割 地内	村上	平成25年11月5日 ~ 平成25年12月上旬 予定

○[間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡]、[津軽石大森遺跡]、[金浜Ⅴ遺跡]、[間木戸一里塚]は調査が終了しました。

☆上空から事業進捗状況をお知らせいたします。(その1)

※工事及び調査内容は平成25年12月5日現在です。

平成23年11月の新規事業化から、2年が経過しました。今年の3月から現場も本格的に動き出したことから、昨年度に撮影した上空からの写真と比較して、事業がどのように進んでいるかお知らせいたします。今回は山田ⅠC付近(山田町山田)をご紹介します。



☆「弘川Ⅱ・Ⅲ遺跡」の調査が終了します!

宮古市津軽石第14地割で9月より調査を進めていましたが、12月6日に終了します。この遺跡からは“塚”や“製鉄炉”などがみつかりました。調査にご協力いただいた皆様ありがとうございました。



▲発掘作業員の皆さん 本当にお疲れ様でした!



▲埋蔵文化財センター 野中さん 村木さん 「作業員と一丸となって無事終わらせることができました」

☆「(仮称)山田第2トンネル工事」が契約されました!

山田宮古道路で初めてのトンネル工事が契約となりました。今回施工するトンネルは、「(仮称)山田第2トンネル」で延長が1,985mあります。延長が長いので、田名部側と大沢側の両側から掘削いたします。皆さんよろしくお願いたします。

- ◆工事期間
自：平成25年11月26日
至：平成28年2月8日
- ◆受注者
熊谷組・アイサワ工業・株木建設特定建設工事共同企業体



▲完成イメージ(釜石側入口)

☆「(仮称)豊間根川下部工工事」が契約されました!

山田宮古道路で一番長い橋の下部工工事が契約となりました。今回施工する橋は、「(仮称)豊間根川橋」で延長が95mです。トンネル工事と同様、皆さんよろしくお願いたします。

- ◆工事期間
自：平成25年11月29日
至：平成26年6月30日
- ◆受注者
徳倉(とくら)建設 東北支店



▲完成イメージ
