

三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北

工事状況のお知らせ vol.11



平成26年01月10日現在
東北地方整備局 三陸国道事務所



施工⑤: 村本建設



施工①: 本間組



施工④: 矢作建設工業



施工②: 日本国土開発



施工②: 日本国土開発



施工②: 日本国土開発

山田部地区で伐採作業を実施中です。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。


H25年12月に調査終了した豊間根新田1遺跡を埋戻し、盛土施工の準備を行っています。

荒川川右岸で工事用道路の造成を実施中です。タンクトラックの走行にご注意をお願いいたします。

津軽石荷竹地区で実施しているBOXカルートの据付作業が完了しました。

市道新町根井沢線に待避所を16箇所設置しました。工事用車両の通行にご注意をお願いいたします。

津軽石根井沢工区で、BOXカルートの据付をする準備を進めています。

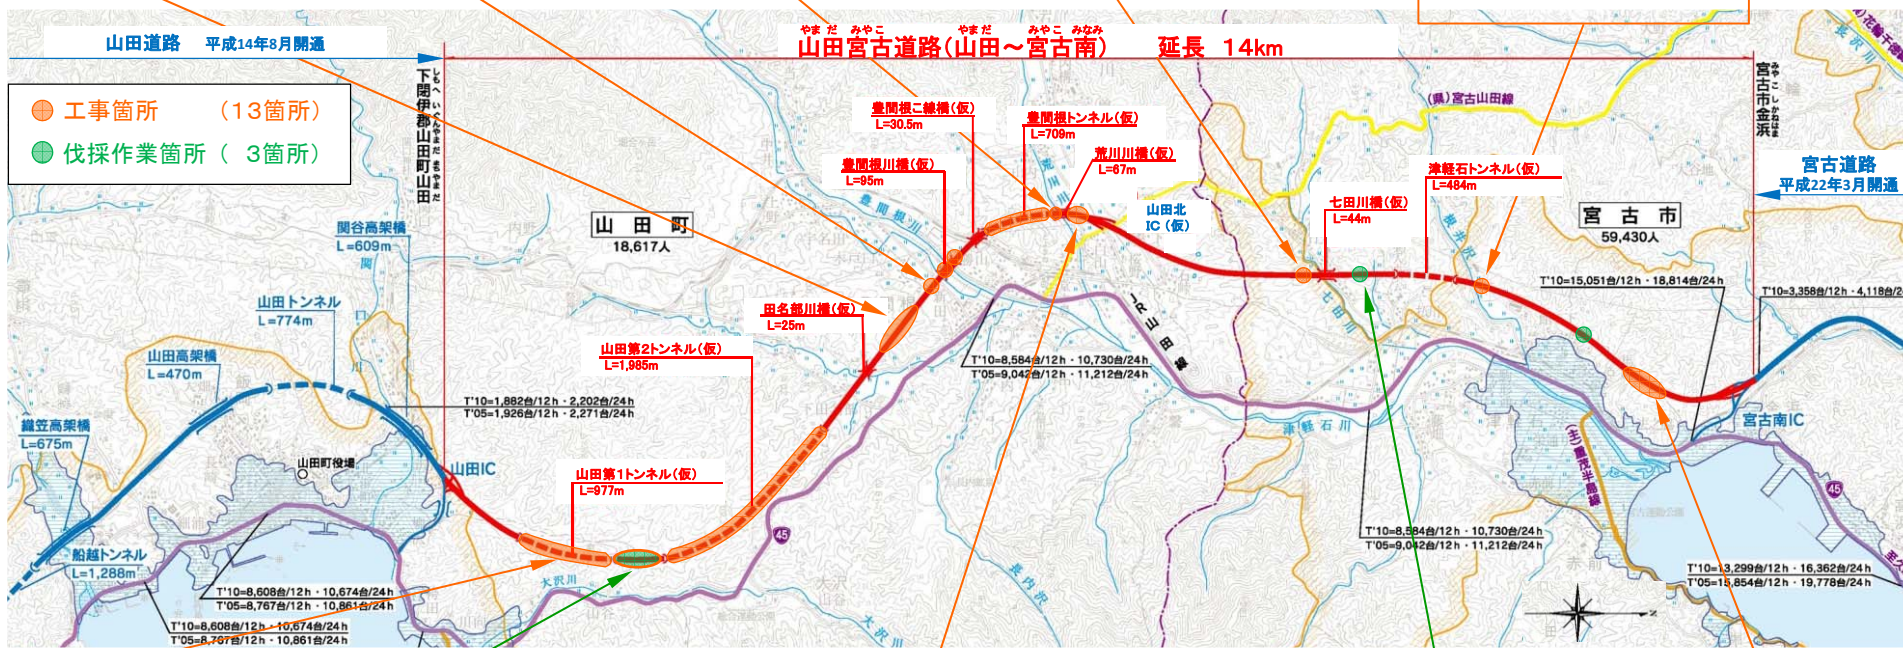

施工⑨: 戸田建設



施工⑩: 宮古地方森林組合



施工④: 矢作建設工業



施工⑩: 宮古地方森林組合



施工③: 樋下建設

(仮称)山田第1トンネル工事が契約になりました。よろしくお願いたします。(詳細は裏面で！)

大沢地区の伐採作業が概ね終了いたしました。これから迂回路造成作業に入ります。

荒川地区で(仮称)荒川川橋の橋台を施工中です。12月18日(水)に底版のコンクリート打設(約400m3)が終了いたしました。引き続き、鉄筋、型枠の組み立て作業を進めております。

津軽石弘川地区で伐採作業を実施中です。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力お願い致します。

津軽石馬越地区からの掘削土は赤前地区防災集団移転促進事業(駒形通地区)にも運搬しています。

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
① 豊間根地区改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年02月下旬 予定
② 津軽石地区改良工事	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年03月下旬 予定
③ 馬越地区改良工事	樋下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年03月下旬 予定
④ 豊間根北地区道路改良工事	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑤ 大沢地区改良工事	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月26日 ~ 平成26年03月下旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
⑥ 山田第1トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成26年02月上旬 予定
⑦ 豊間根川橋下部工事	徳倉建設(株) 東北支店	佐野	平成25年11月29日 ~ 平成26年06月下旬 予定
⑧ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑨ 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	陰山、鈴木	平成26年1月7日 ~ 平成26年02月下旬 予定
⑩ 山田宮古地区伐採作業	宮古地方森林組合	中居、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年03月中旬 予定

☆上空から事業進捗状況をお知らせいたします。(その2)

※工事及び調査内容は平成26年1月10日現在です。

平成23年11月の新規事業化から2年が経過しました。昨年の春から現場も本格的に動き出したことから、昨年度に撮影した上空からの写真と比較して、事業がどのように進んでいるかお知らせします。今回は宮古市津軽石馬越～金浜地区をご紹介します。



☆今年度実施した埋蔵文化財発掘調査の結果をお知らせします。

山田宮古道路工区内では今年度9箇所の発掘調査を実施しました。調査箇所ではたくさんの陥し穴や竪穴住居跡、古代の製鉄炉、土杭、縄文土器、石器などが発見されました。調査箇所は下記のとおりです。

- ◆調査終了箇所・・・間木戸Ⅱ・V遺跡、間木戸一里塚、津軽石大森遺跡、弘川Ⅱ・Ⅲ遺跡、豊間根新田Ⅰ遺跡、金浜V遺跡 (6箇所)
- ◆調査継続箇所・・・沢田Ⅲ遺跡、間木戸Ⅰ遺跡、石峠Ⅱ遺跡 (3箇所)



▲石峠Ⅱ遺跡



▲津軽石大森遺跡

☆「(仮称)山田第1トンネル工事」が契約されました!

山田宮古道路で3本目の「(仮称)山田第1トンネル」の工事が契約となりました。今回施工するトンネルは延長は977mです。掘削は山田IC側から進めていきます。皆さんよろしくお願いたします。

- ◆工事期間
自：平成26年 1月 7日
至：平成28年 2月29日
- ◆受注者
戸田建設株式会社



▲完成イメージ(釜石側入口)
