


# 三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北

## 工事状況のお知らせ vol.12



施工:⑥熊谷組・アイサワ工業  
株木建設JV

下田南部地区でトンネル工事を施工するための道路改良工事を開始いたします。



施工:⑤村本建設

下田北部地区で伐採作業を実施中です。2月上旬に終了予定です。よろしくお願いいたします。



施工:④矢作建設工業  
運搬:③樋下建設

荒川右岸で伐採作業を実施するための工事用道路が概ね完成しました。



施工:④矢作建設工業

写真は町道白山船石線です。BOXカルートを施工するための迂回路が完成しました。




施工:③樋下建設  
⑩宮古地方森林組合

津軽石根井沢～馬越地区で伐採作業を実施します。ご協力お願いいたします。



施工:③樋下建設

津軽石馬越地区で掘削された土砂は、豊間根地区、赤前地区及び、小谷鳥地区等へ運搬されます。

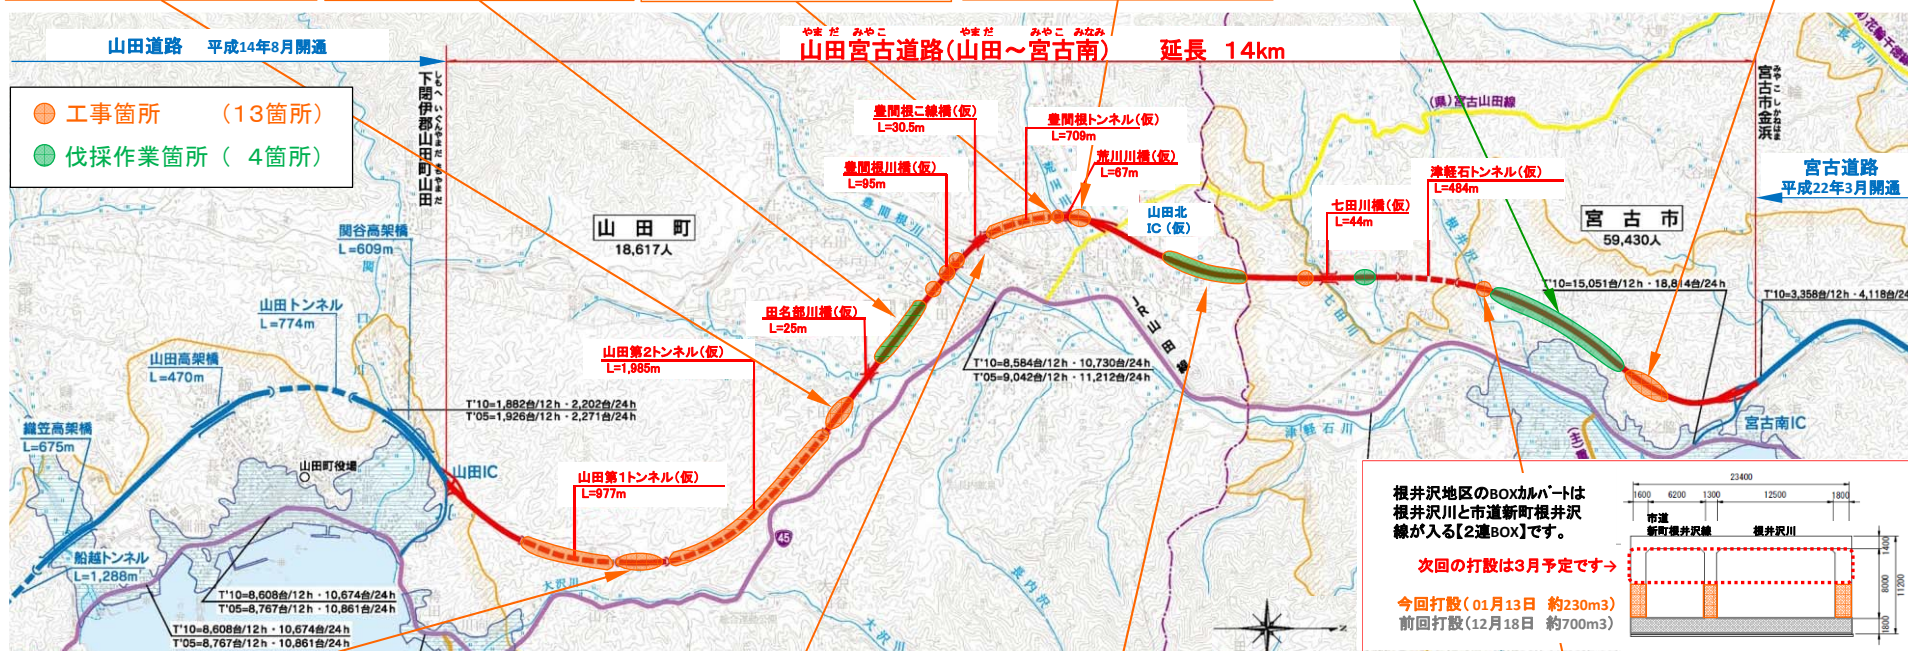

施工:⑤村本建設

写真は林道山谷線です。伐採作業が終了したので、BOXカルートを設置するための迂回路造成に入ります。BOXカルートの設置作業は3月を予定しています。



施工:⑥東急建設  
運搬:③樋下建設

豊間根勝山地区で(仮称)豊間根トンネルの工事を開始するための工事用道路を造成します。



施工:⑤村本建設

石峠地区の伐採作業を2月上旬から予定しております。よろしくお願いいたします。



施工:②日本国土開発

津軽石根井沢地区でBOXカルート(現場打)の施工を実施中です。1月13日(月)に2回目のコンクリート打設(壁の下部分 約230m3)が終了いたしました。3回目の打設(壁の上部分)は3月を予定しております。

今後、工事が全面展開していきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、1日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

◎工事等に関する問い合わせ先

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

◆工事等一覧表

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
① 豊間根地区改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年2月25日 予定
② 津軽石地区改良工事	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年03月下旬 予定
③ 馬越地区改良工事	樋下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年03月下旬 予定
④ 豊間根北地区道路改良工事	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年03月下旬 予定
⑤ 大沢地区改良工事	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月26日 ~ 平成26年03月下旬 予定


工事名	受注者	現場責任者	工事期間
⑥ 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイザワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
⑦ 豊間根川橋下部工工事	徳倉建設(株) 東北支店	佐野	平成25年11月29日 ~ 平成26年06月下旬 予定
⑧ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑨ 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	陸山、鈴木	平成26年1月7日 ~ 平成28年02月下旬 予定
⑩ 山田宮古地区伐採作業	宮古地方森林組合	中居、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年03月中旬 予定

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

☆上空から事業進捗状況をお知らせいたします。(その3)

※工事及び調査内容は平成26年1月25日現在です。

平成23年11月の新規事業化から2年が経過しました。昨年の春から現場も本格的に動き出したことから、昨年度に撮影した上空からの写真と比較して、事業がどのように進んでいるかお知らせします。今回は山田町豊間根新田～豊間根勝山地区をご紹介します。

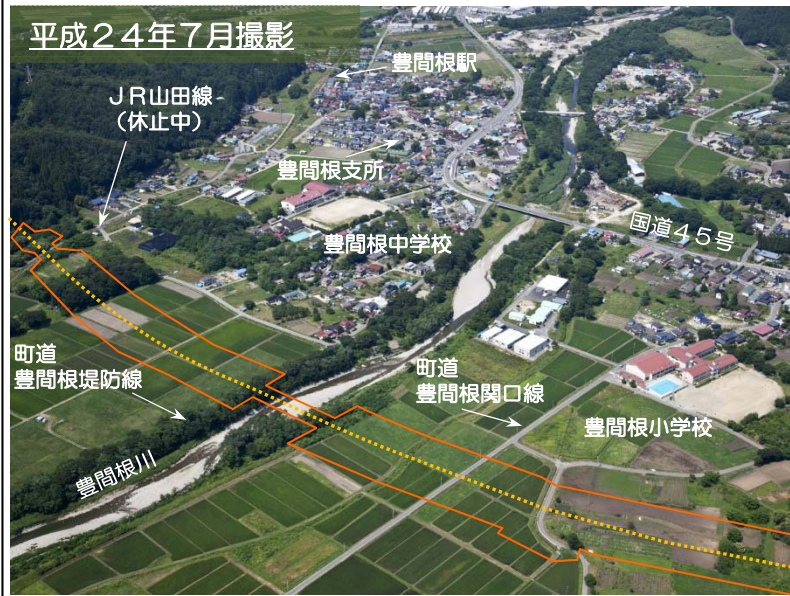

☆伐採作業を鋭意進めております!(山田町石峠地区、宮古市津軽石根井沢地区、津軽石大森地区ほか)

山田宮古道路工区内では今春から開始する工事や埋蔵文化財発掘調査のため、伐採作業を鋭意進めております。皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、1日も早い復興道路の開通を目指しておりますので、伐採作業へのご理解とご協力をお願いいたします。(施工：③樋下建設、⑤村本建設、⑩宮古地方森林組合)



▲山田町石峠地区 (施工：⑤村本建設)



▲宮古市津軽石根井沢地区 (施工：⑩宮古地方森林組合)



▲宮古市津軽石大森地区 (施工：③樋下建設)
