


気仙沼港IC～大島IC(No. 95～No. 170)工事進捗状況 ※ic名及び構造物名は全て仮称

H27年12月上旬時点


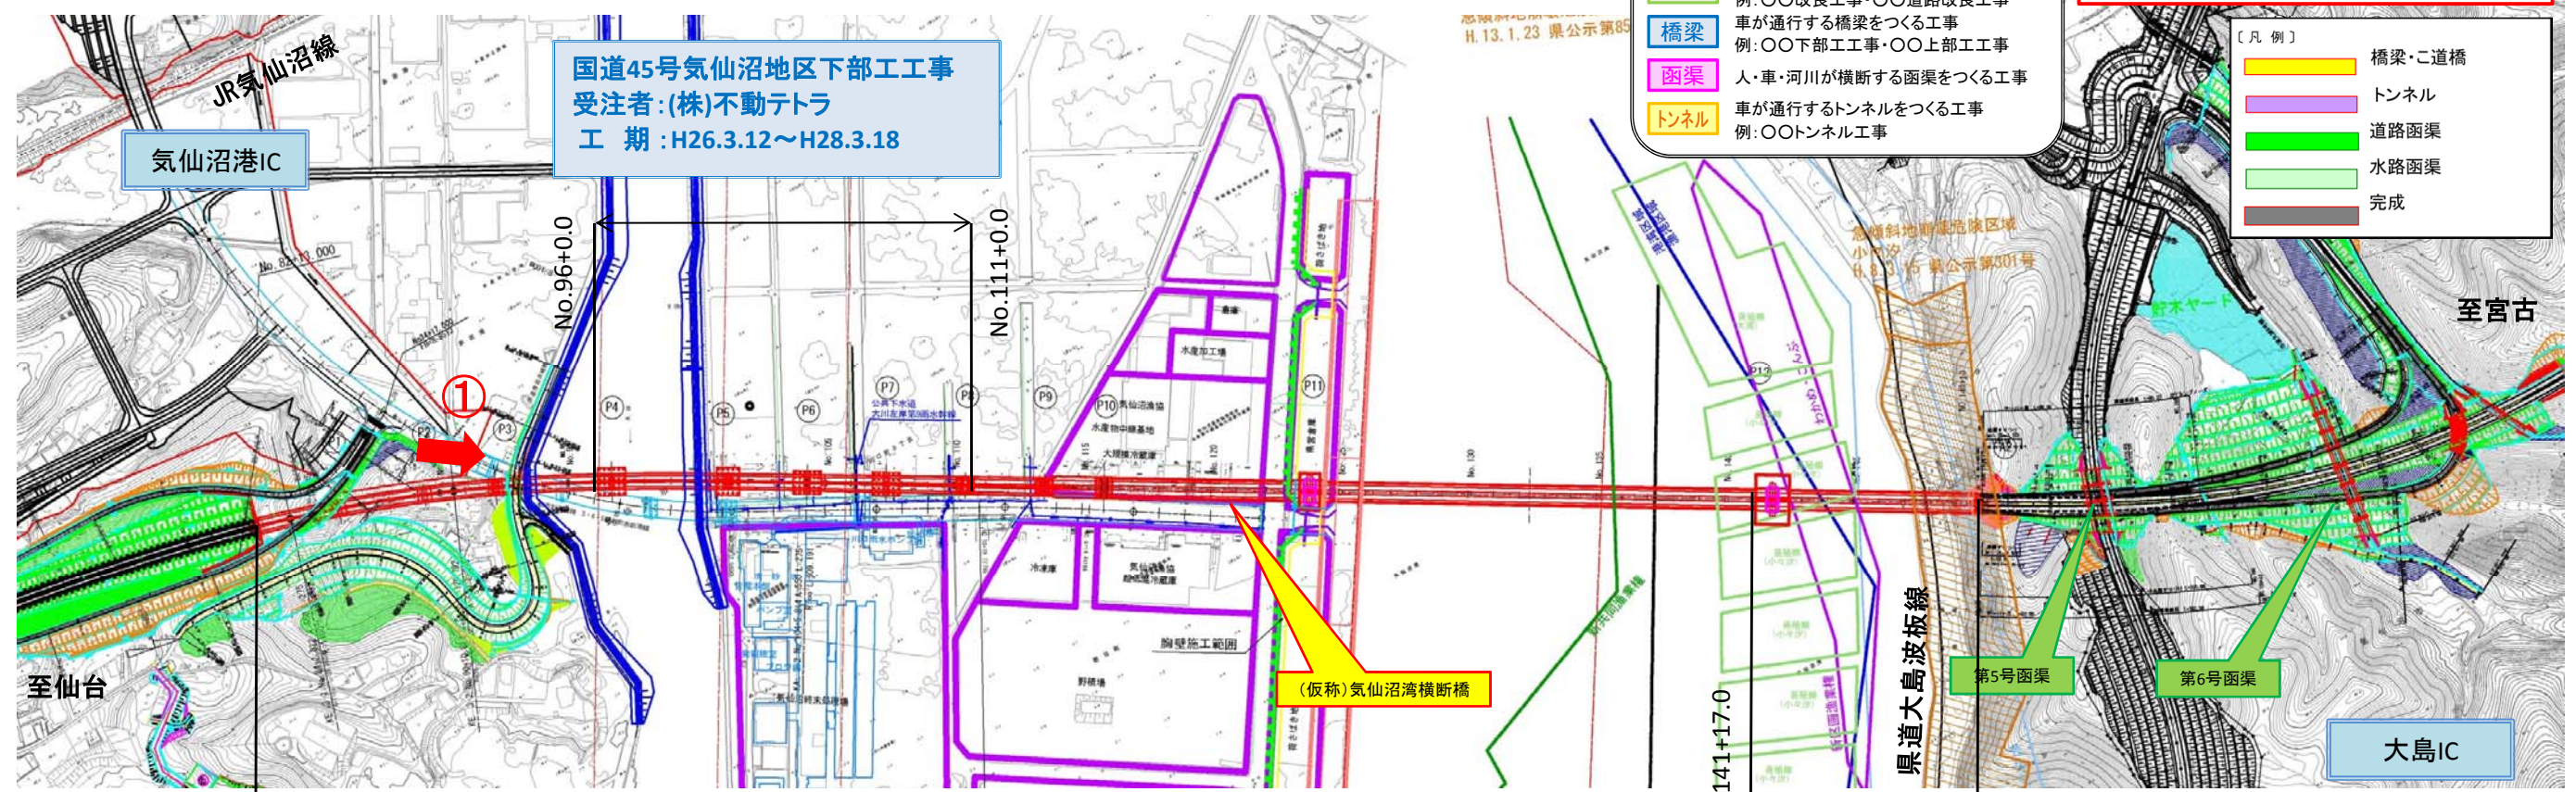


国道45号気仙沼地区下部工工事
受注者:(株)不動テトラ
工期:H26.3.12～H28.3.18

国道45号気仙沼湾横断橋松崎地区下部工工事
受注者:東亜・不動テトラ建設工事
共同企業体
工期:H27.4.6～H30.3.16

国道45号気仙沼湾横断橋小々汐地区上部工工事
受注者:鹿島・東亜建設工事
共同企業体
工期:H27.4.6～H30.2.23

気仙沼湾横断橋全体一般図

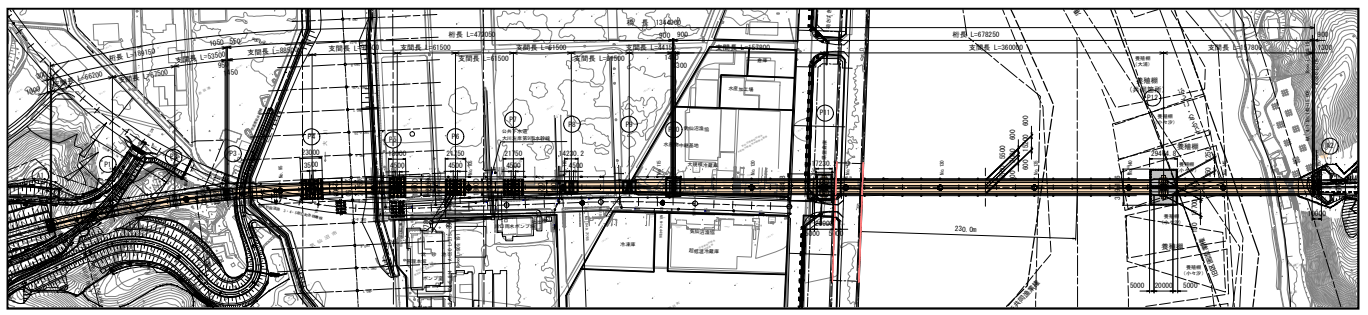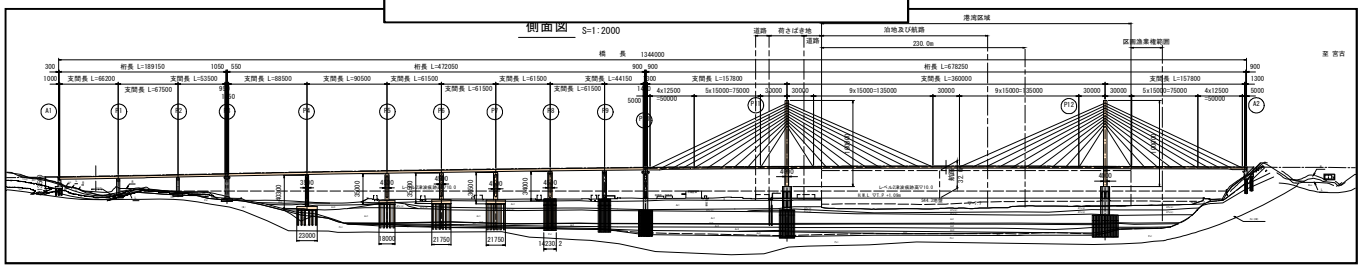

①
起点側から終点側を望む



橋脚構築状況
