

# 気仙沼中央IC～気仙沼港IC(No. 0～No. 95)工事進捗状況


R元年12月下旬時点

〔工事の種類〕

- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：○改良工事・○道路改良工事  
車が通行する橋梁をつくる工事
- 橋梁 例：○下部工事・○上部工事
- 函渠 人・車が通行するトンネルをつくる工事  
例：○トンネル工事
- トンネル 改良・橋梁・函渠・トンネル工事を行う工事  
例：○道路工事  
道路の舗装を行う工事  
例：○舗装工事
- 道路
- 舗装

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成

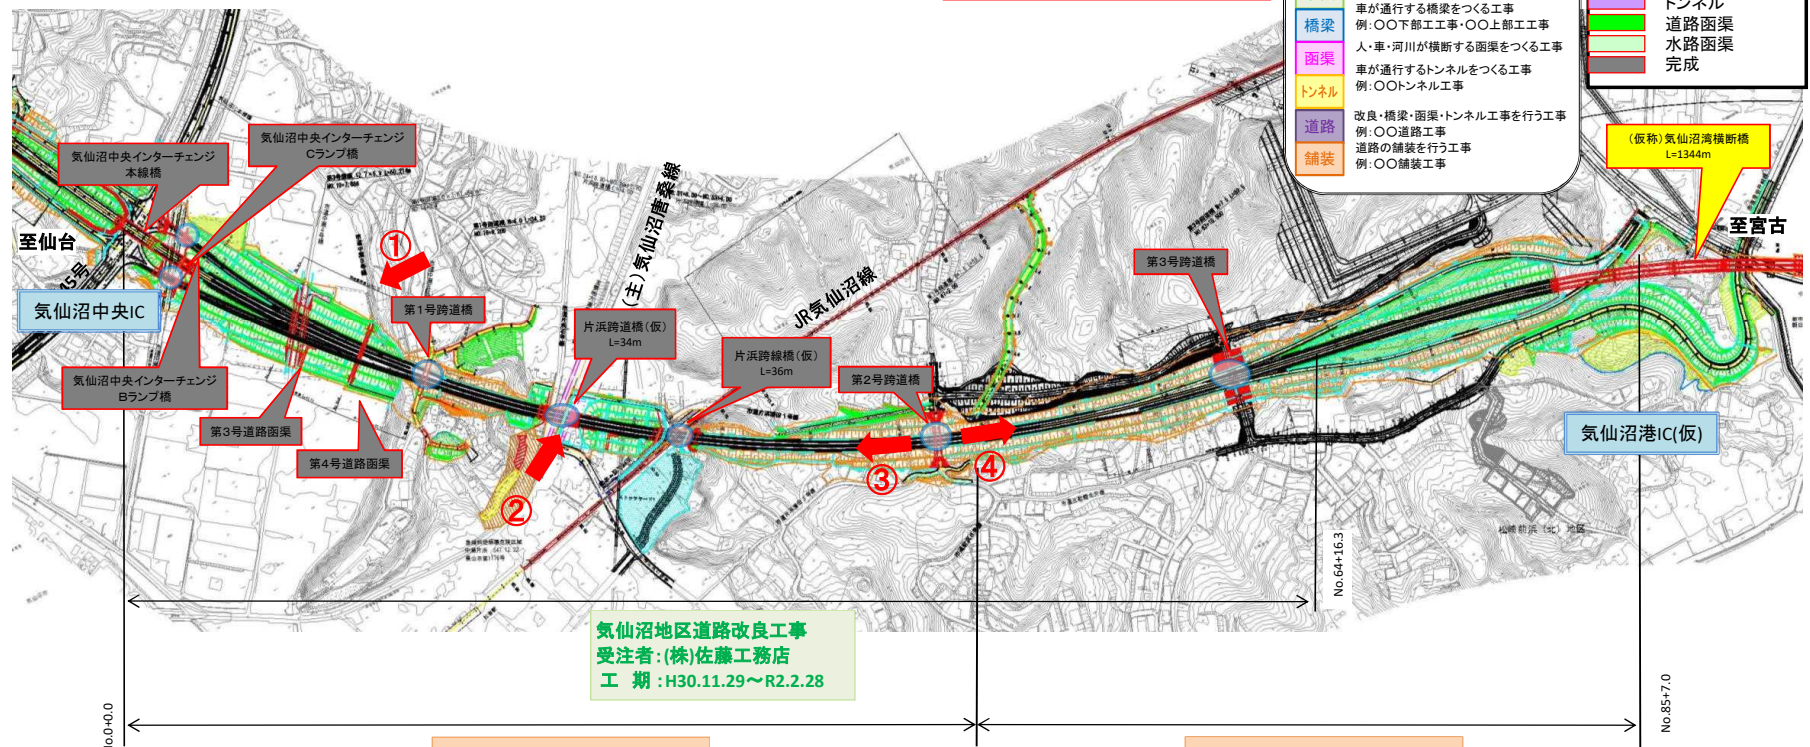

気仙沼地区道路改良工事  
受注者: (株)佐藤工務店  
工期: H30.11.29～R2.2.28

松崎中瀬地区舗装工事  
受注者: (株)ガイアート  
工期: H31.2.14～R2.1.31

松崎北沢地区舗装工事  
受注者: 大成ロテック(株)  
工期: H31.2.15～R2.2.28



▲No.16北側から本線を望む  
[左: 第4号道路函渠]  
[右: 第3号道路函渠]



▲No.27南側から本線を望む  
[片浜跨道橋(仮)]



▲第2号跨道橋から本線を望む



▲第2号跨道橋から本線を望む
