


# 仙塩道路〔多賀城高架橋〕（A1～P29）工事進捗状況

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

平成25年6月上旬時点

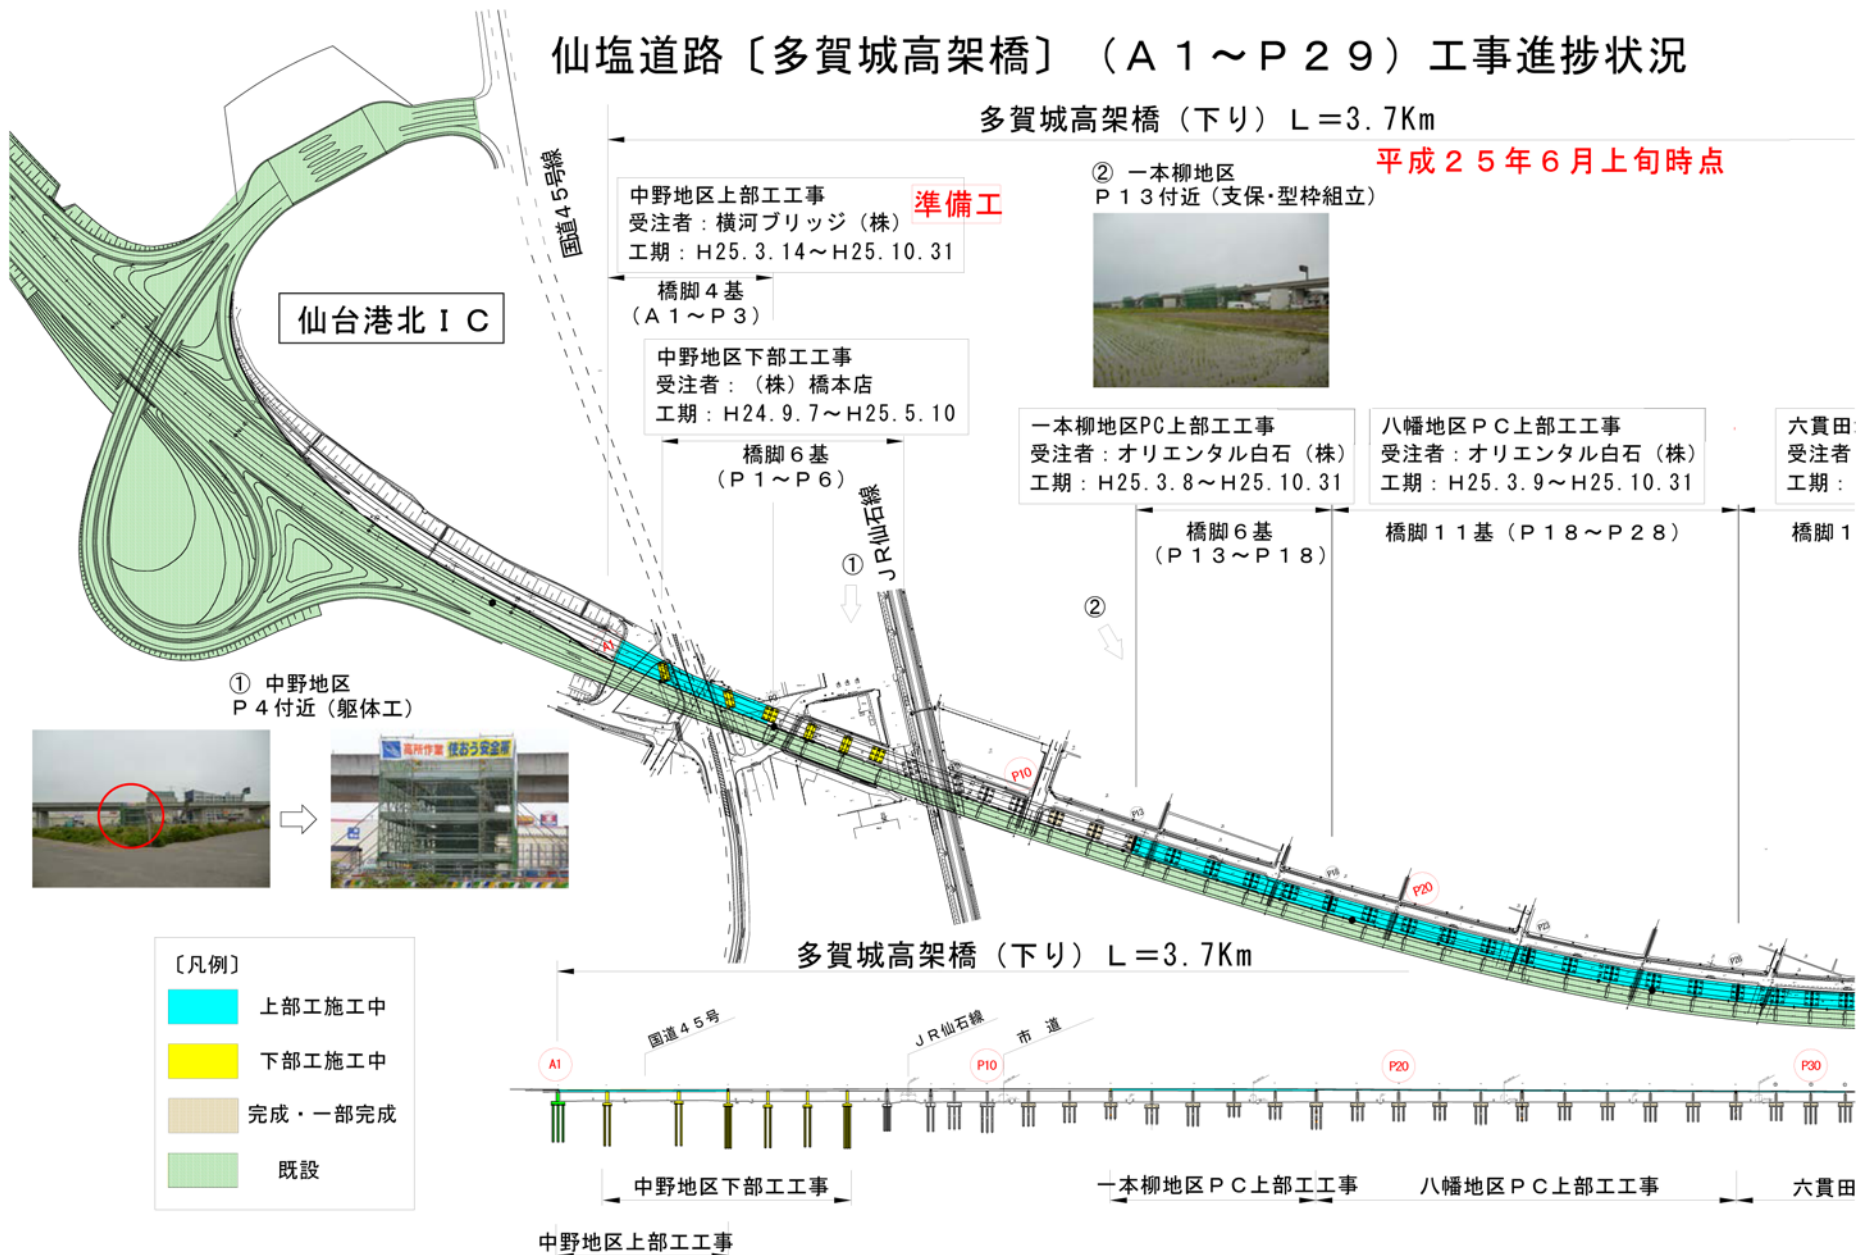

中野地区上部工工事  
受注者：横河ブリッジ（株）  
工期：H25.3.14～H25.10.31

準備工

橋脚4基  
(A1～P3)

中野地区下部工工事  
受注者：（株）橋本店  
工期：H24.9.7～H25.5.10

橋脚6基  
(P1～P6)

② 一本柳地区  
P13付近（支保・型枠組立）



一本柳地区PC上部工工事  
受注者：オリエンタル白石（株）  
工期：H25.3.8～H25.10.31

八幡地区PC上部工工事  
受注者：オリエンタル白石（株）  
工期：H25.3.9～H25.10.31

六貫田  
受注者  
工期：

① 中野地区  
P4付近（躯体工）



〔凡例〕

- 上部工施工中
- 下部工施工中
- 完成・一部完成
- 既設

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

