

仙塩道路〔多賀城高架橋〕(P109~A2) 工事進捗状況

H25年 7月上旬時点

一本杉地区上部工工事 **準備工**
 受注者：JFEエンジニアリング(株)
 工期：H25.3.8~H25.10.31

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
 - 下部工施工中
 - 完成・一部完成
 - 既設



⑦市川地区
P 1 1 2 付近



⑧砂押地区
P 1 2 5 付近

多賀前地区下部工工事
 受注者：岩田地崎建設(株)
 工期：H24.9.11~H25.7.19


橋脚 2 基 (P129~P130)
 ・橋台 1 基 (A2)

利府 J C T

山王地区下部工工事
 受注者：大豊建設(株)
 工期：H25.3.5~H25.10.31

橋脚 1 6 基
 (P82~P89・P106~P113)

多賀城高架橋 (下り) L = 3.7Km

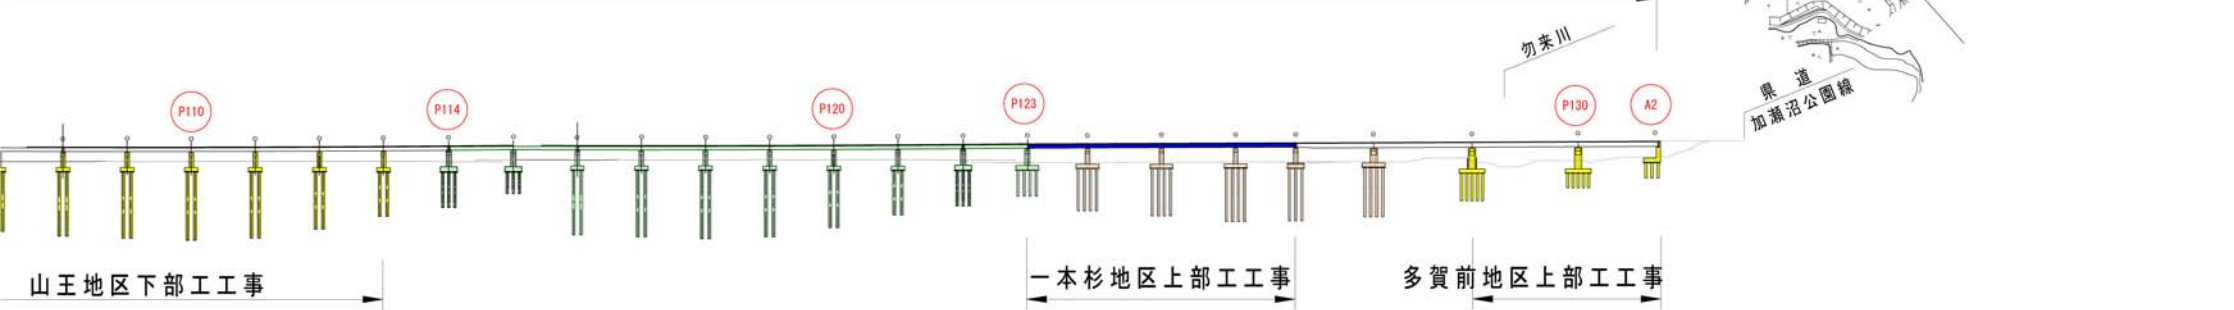

山王地区下部工工事

一本杉地区上部工工事

多賀前地区上部工工事
