


# 仙塩道路〔多賀城高架橋〕(P109~A2) 工事進捗状況

平成25年8月時点

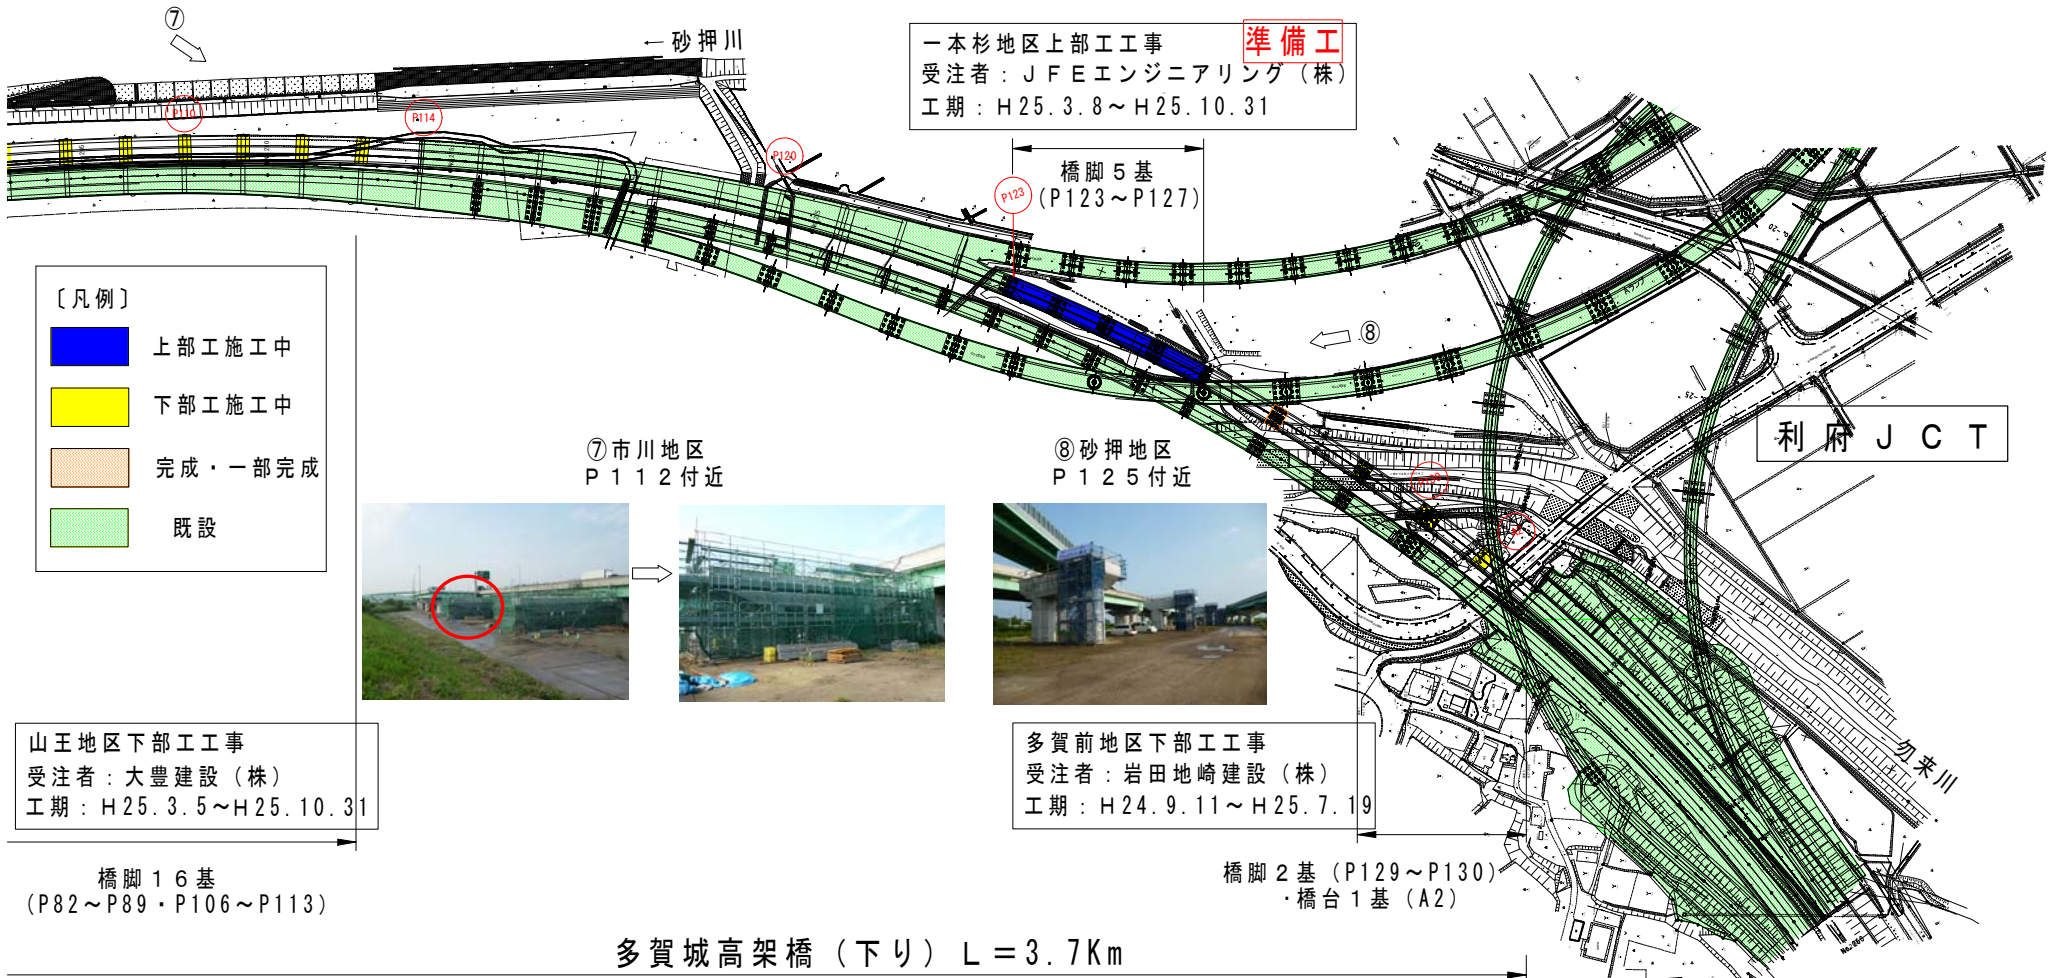

〔凡例〕

- 上部工施工中
- 下部工施工中
- 完成・一部完成
- 既設

山王地区下部工工事  
 受注者：大豊建設（株）  
 工期：H25.3.5~H25.10.31

一本杉地区上部工工事 準備工  
 受注者：JFEエンジニアリング（株）  
 工期：H25.3.8~H25.10.31


多賀前地区下部工工事  
 受注者：岩田地崎建設（株）  
 工期：H24.9.11~H25.7.19



橋脚16基  
 (P82~P89・P106~P113)

橋脚2基 (P129~P130)  
 ・橋台1基 (A2)

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km



山王地区下部工工事

一本杉地区上部工工事

多賀前地区上部工工事

国道  
 加藤沼公園線
