


仙塩道路〔多賀城高架橋〕(P109~A2) 工事進捗状況 H25年10月上旬時点

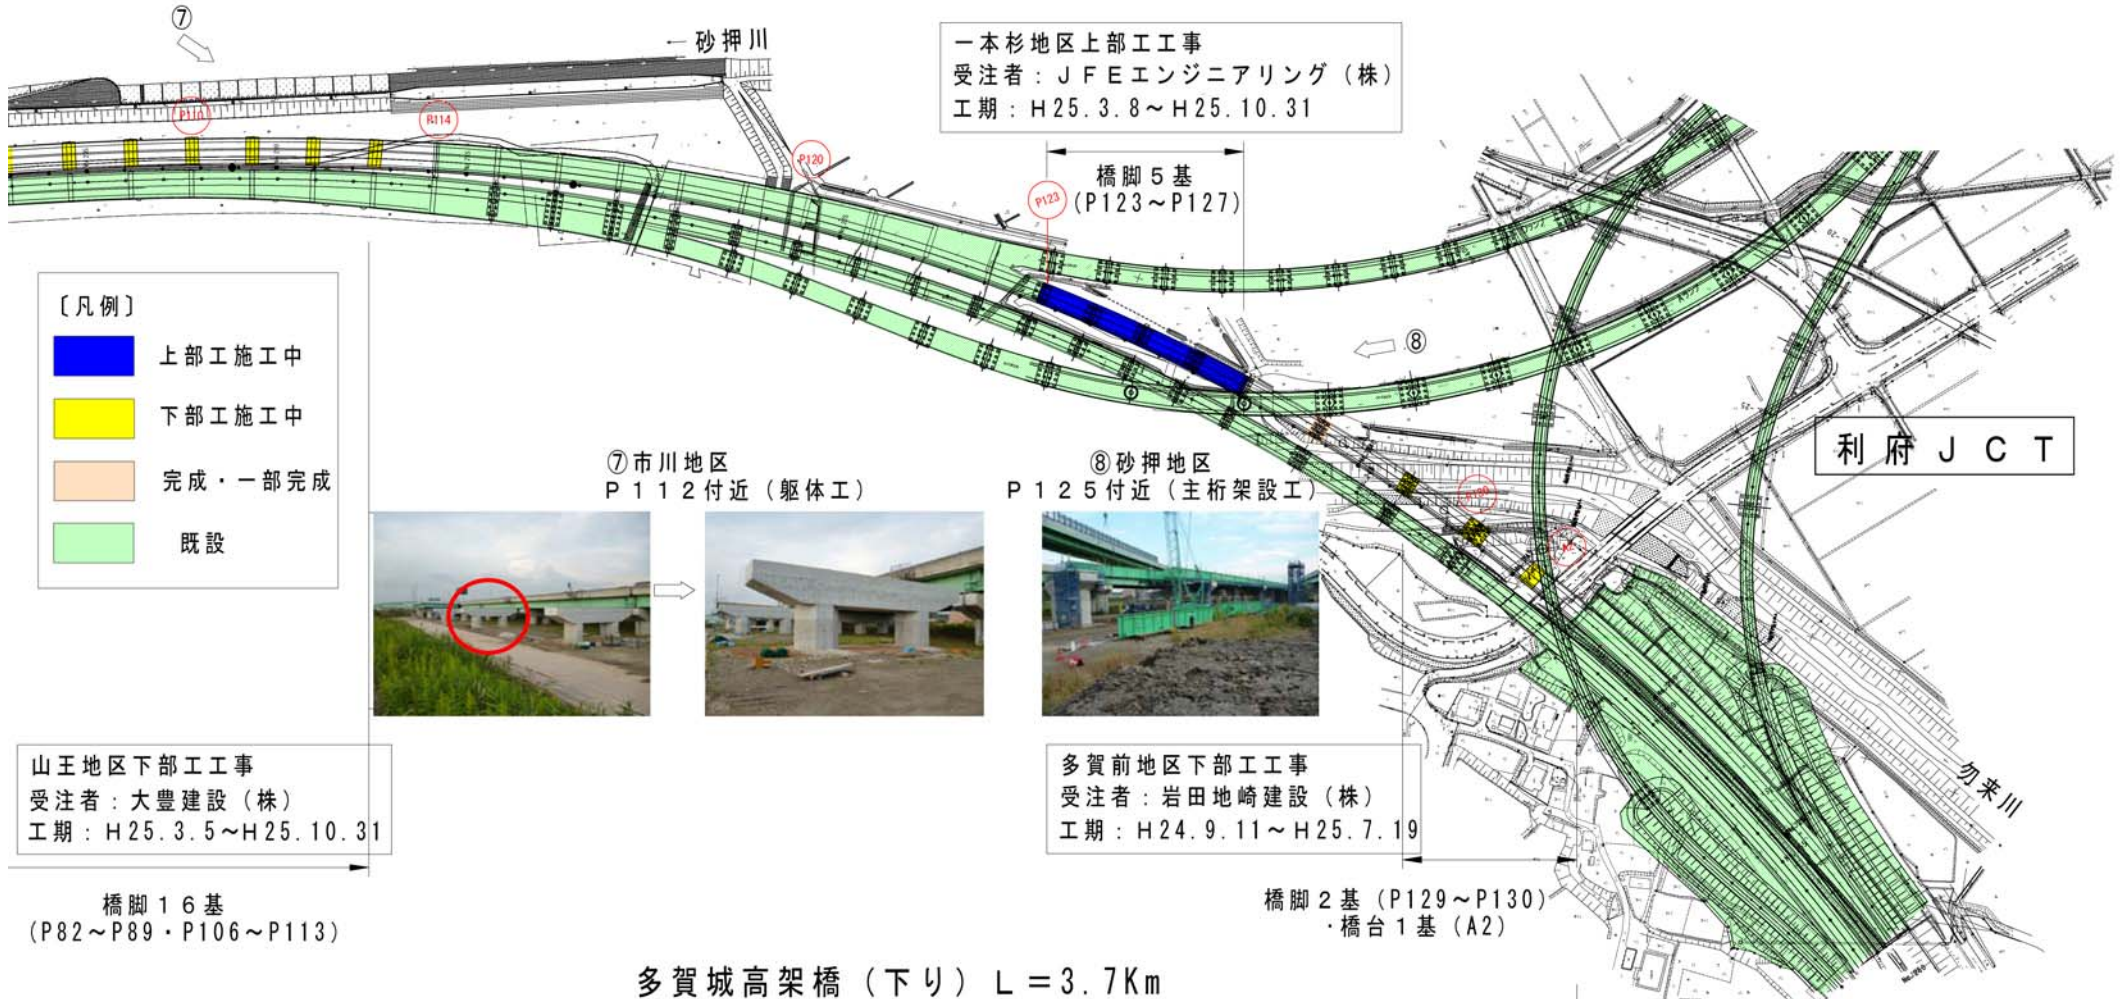

一本杉地区上部工工事
 受注者：JFEエンジニアリング(株)
 工期：H25.3.8~H25.10.31

橋脚5基
 (P123~P127)

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
 - 下部工施工中
 - 完成・一部完成
 - 既設

⑦市川地区
 P112付近(躯体工)



⑧砂押地区
 P125付近(主桁架設工)




山王地区下部工工事
 受注者：大豊建設(株)
 工期：H25.3.5~H25.10.31

橋脚16基
 (P82~P89・P106~P113)

多賀前地区下部工工事
 受注者：岩田地崎建設(株)
 工期：H24.9.11~H25.7.19

橋脚2基 (P129~P130)
 ・橋台1基 (A2)

多賀城高架橋(下り) L=3.7Km

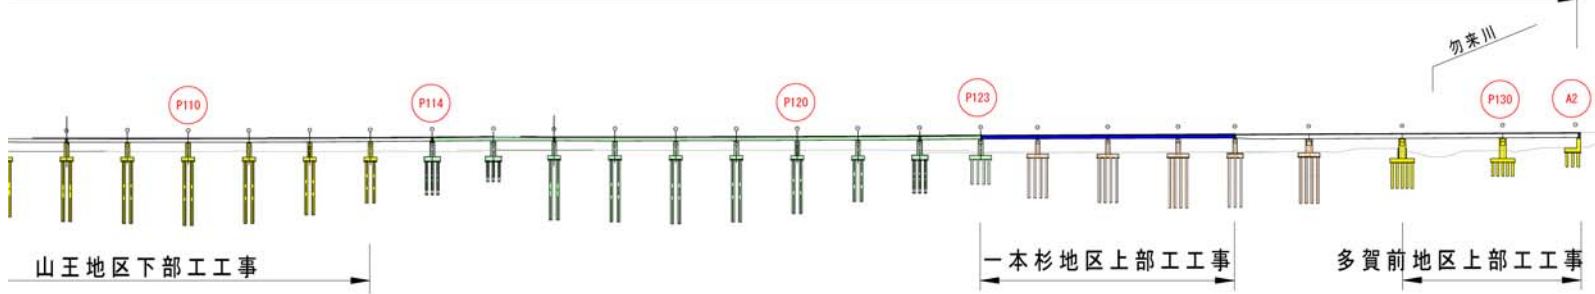

山王地区下部工工事

一本杉地区上部工工事

多賀前地区上部工工事
