


仙塩道路〔多賀城高架橋〕（A1～P29）工事進捗状況

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

平成25年11月上旬時点

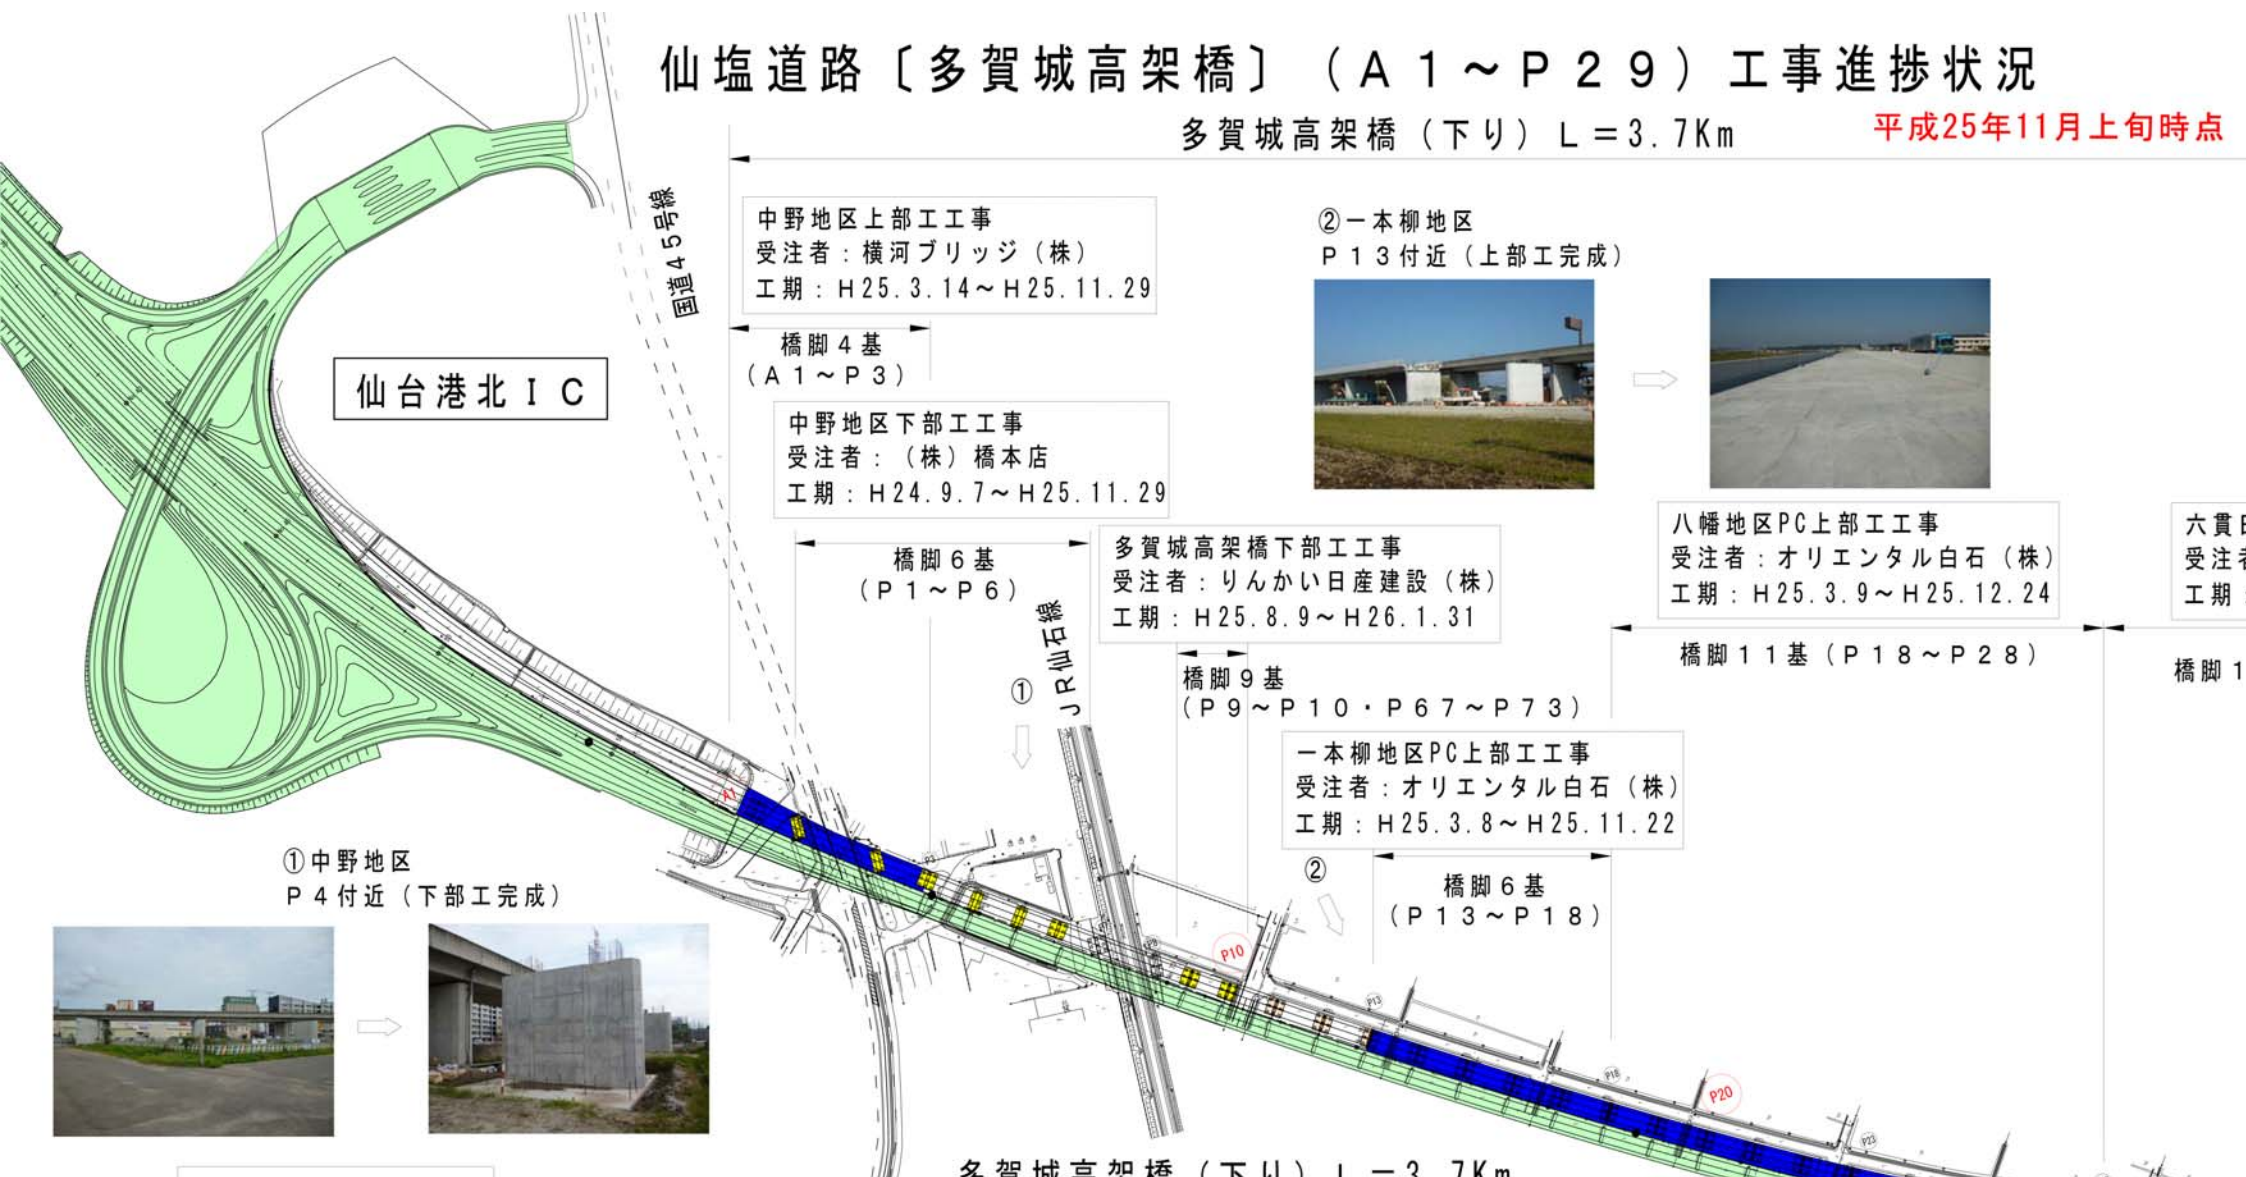

中野地区上部工工事
受注者：横河ブリッジ（株）
工期：H25.3.14～H25.11.29

②一本柳地区
P13付近（上部工完成）



橋脚4基
（A1～P3）

中野地区下部工工事
受注者：（株）橋本店
工期：H24.9.7～H25.11.29

多賀城高架橋下部工工事
受注者：りんかい日産建設（株）
工期：H25.8.9～H26.1.31

八幡地区PC上部工工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工期：H25.3.9～H25.12.24

六貫地区
受注者：
工期：

橋脚6基
（P1～P6）

橋脚9基
（P9～P10・P67～P73）

橋脚11基（P18～P28）

橋脚1

一本柳地区PC上部工工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工期：H25.3.8～H25.11.22

橋脚6基
（P13～P18）

①中野地区
P4付近（下部工完成）



多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
 - 下部工施工中
 - 完成・一部完成
 - 既設

