


# 仙塩道路〔多賀城高架橋〕（A1～P29）工事進捗状況

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

平成25年12月上旬時点

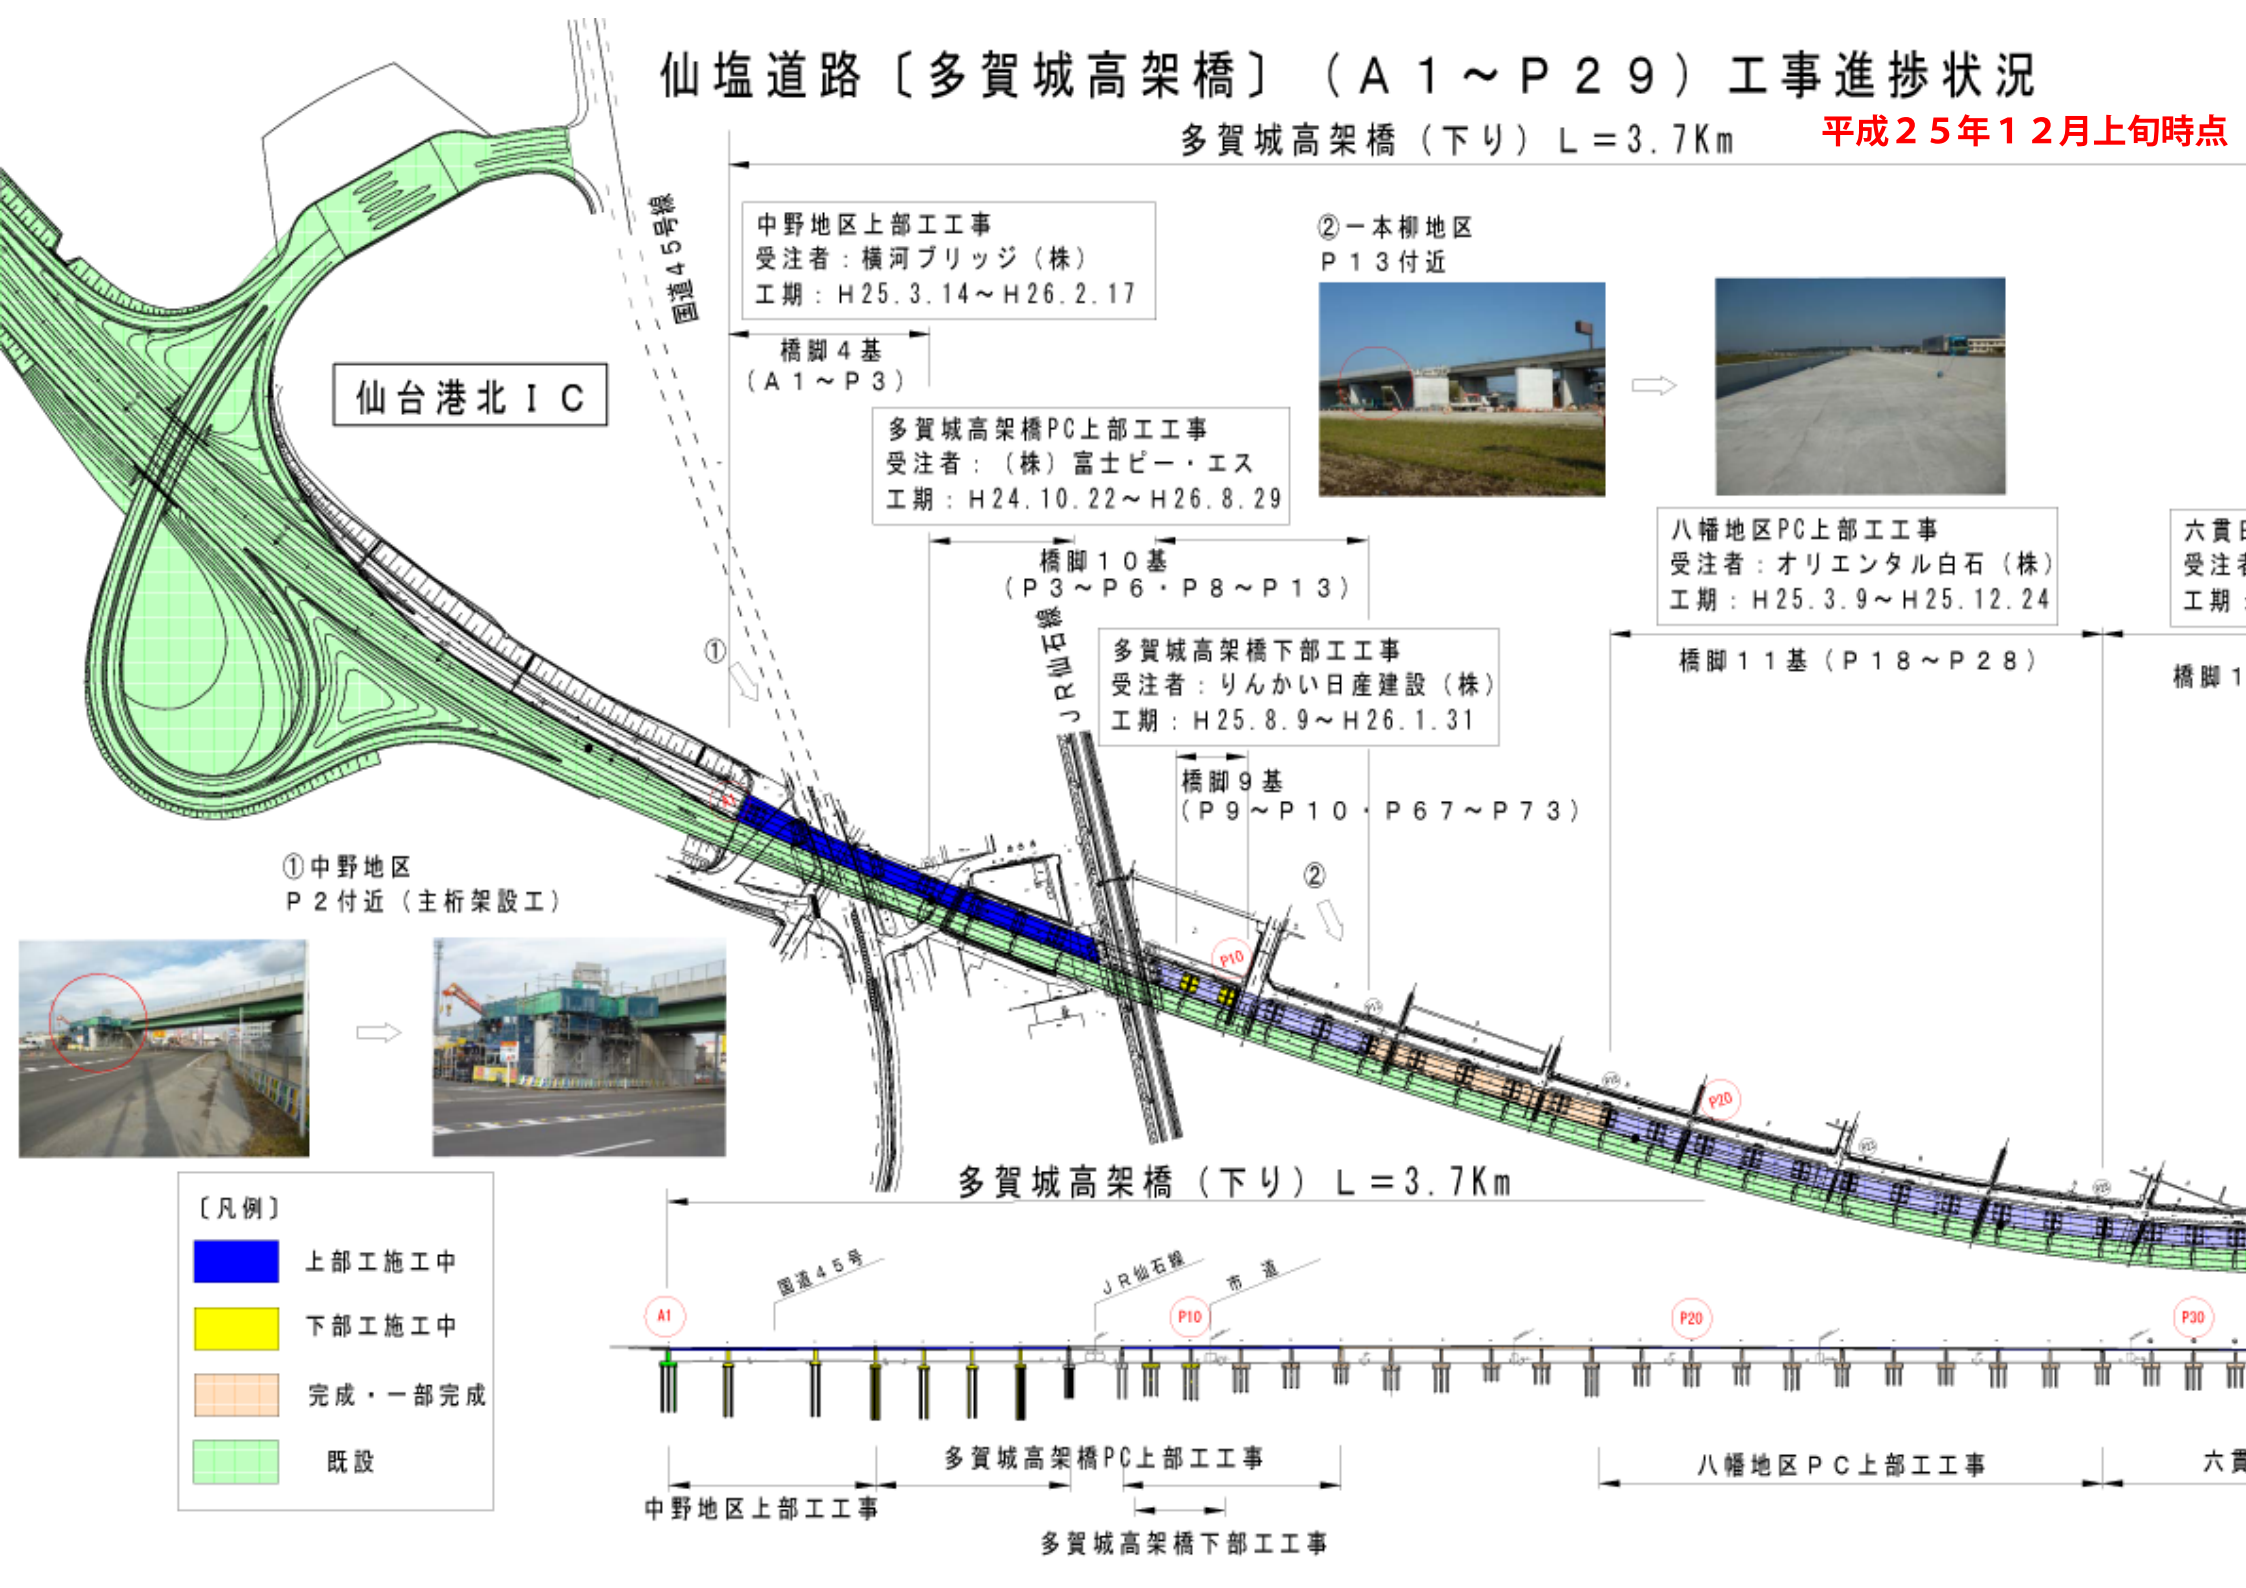

仙台港北IC

国道45号線

中野地区上部工工事  
受注者：横河ブリッジ（株）  
工期：H25.3.14～H26.2.17

②一本柳地区  
P13付近



橋脚4基  
(A1～P3)

多賀城高架橋PC上部工工事  
受注者：（株）富士ピー・エス  
工期：H24.10.22～H26.8.29

八幡地区PC上部工工事  
受注者：オリエンタル白石（株）  
工期：H25.3.9～H25.12.24

六貫田  
受注者：  
工期：

橋脚10基  
(P3～P6・P8～P13)

多賀城高架橋下部工工事  
受注者：りんかい日産建設（株）  
工期：H25.8.9～H26.1.31

橋脚11基 (P18～P28)

橋脚1

橋脚9基  
(P9～P10・P67～P73)

①中野地区  
P2付近（主桁架設工）



多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
  - 下部工施工中
  - 完成・一部完成
  - 既設

