


# 仙塩道路〔多賀城高架橋〕（P30～P73）工事進捗状況

H26年1月上旬時点

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

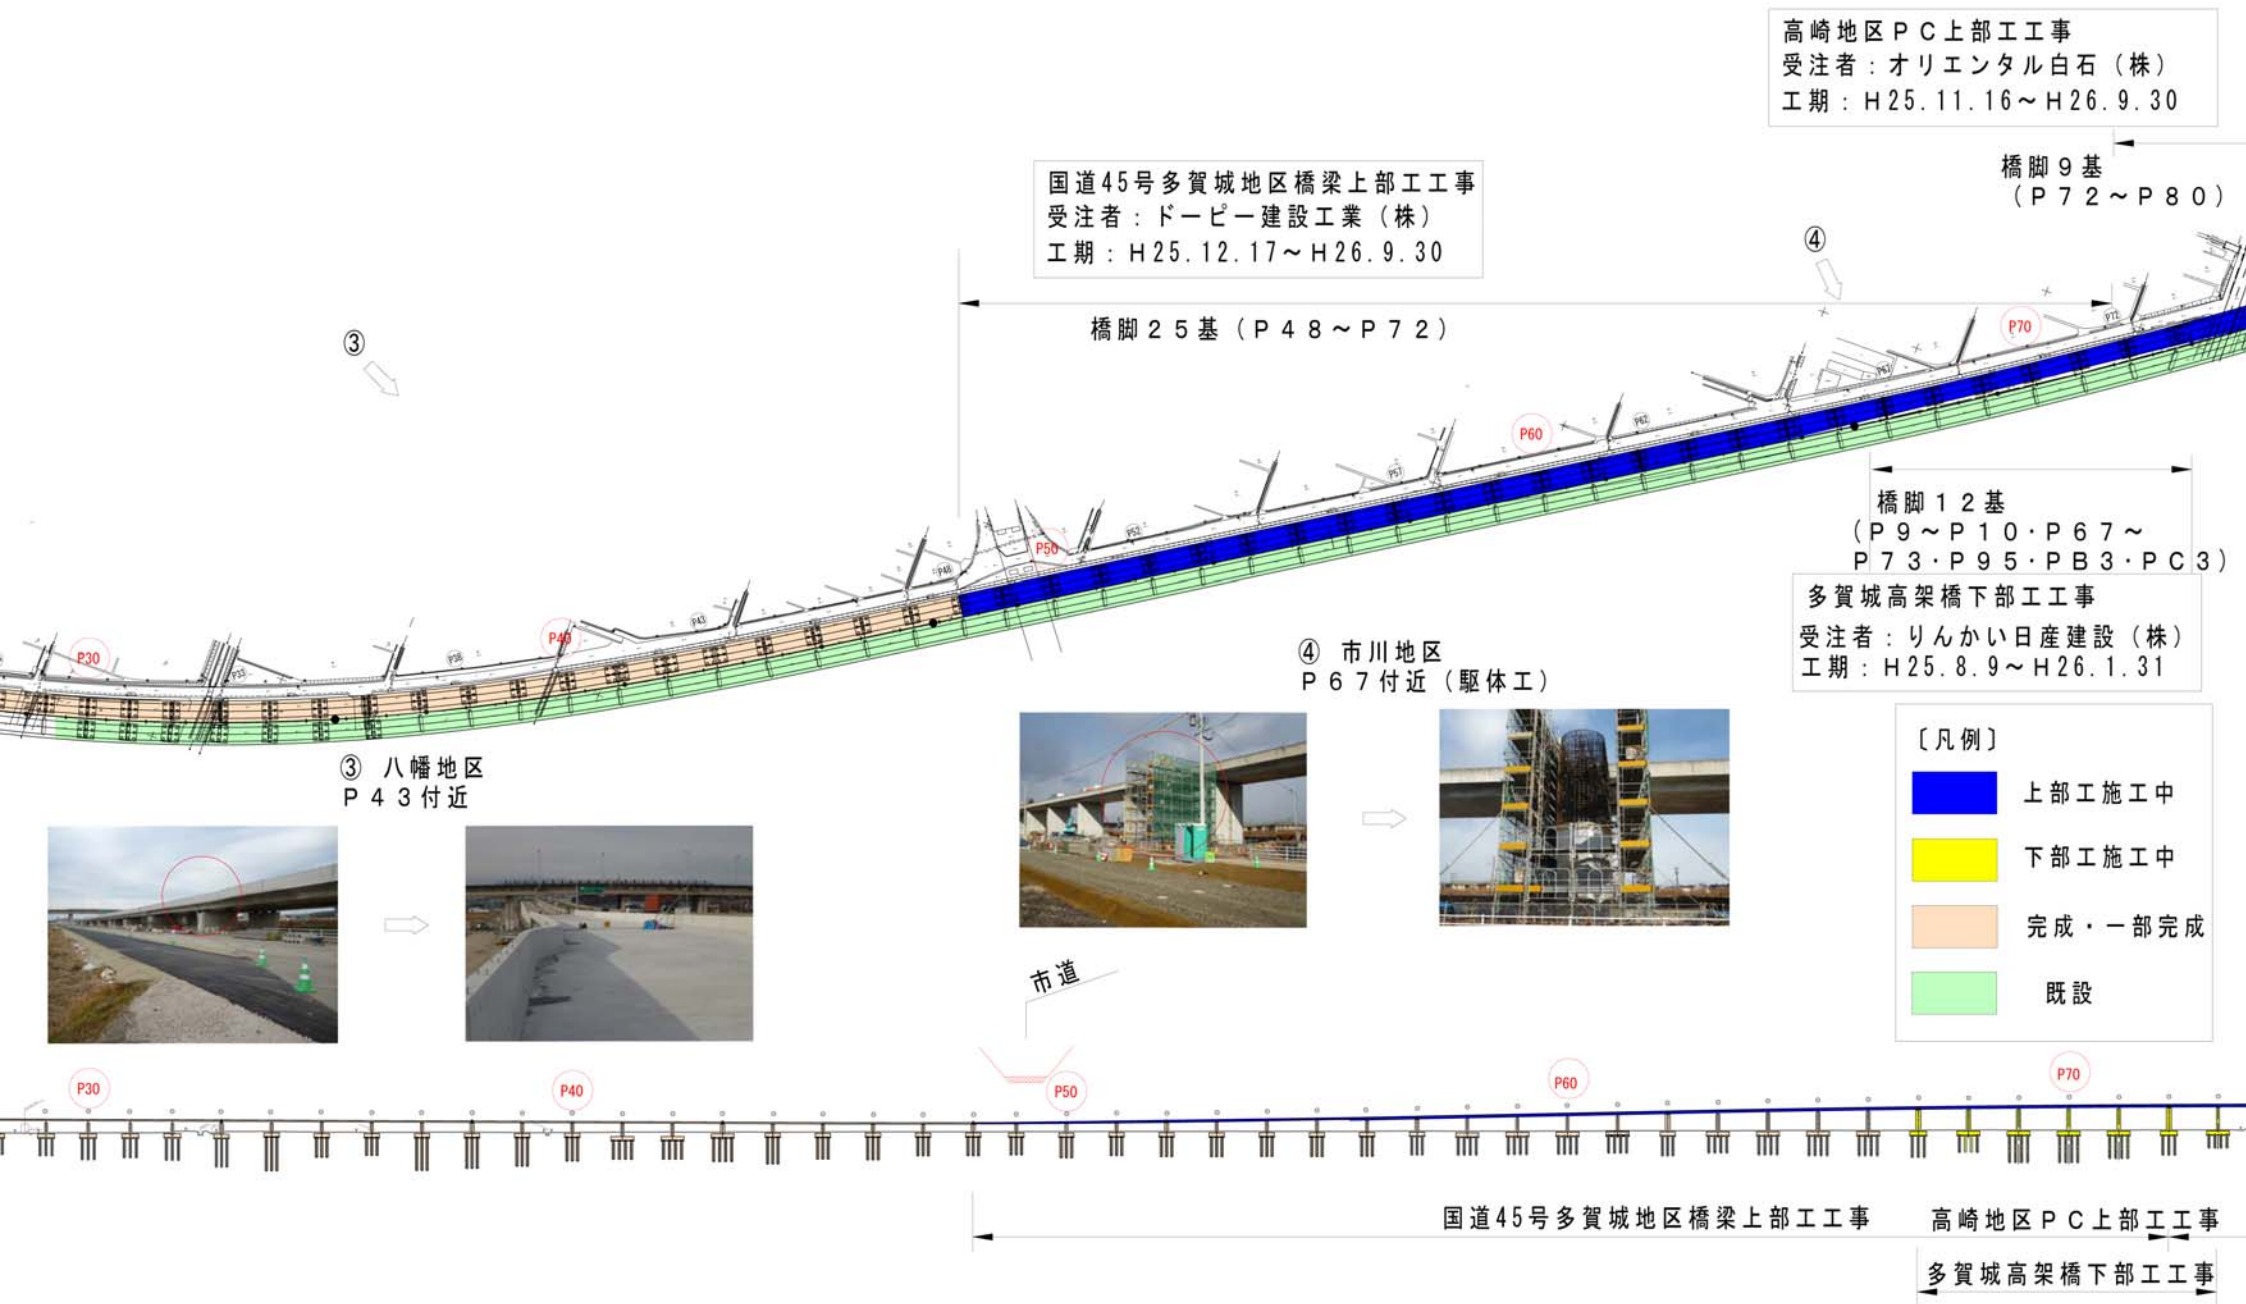

高崎地区PC上部工工事  
 受注者：オリエンタル白石（株）  
 工期：H25.11.16～H26.9.30

国道45号多賀城地区橋梁上部工工事  
 受注者：ドーピー建設工業（株）  
 工期：H25.12.17～H26.9.30

橋脚9基  
 （P72～P80）

橋脚25基（P48～P72）

橋脚12基  
 （P9～P10・P67～  
 P73・P95・PB3・PC3）

多賀城高架橋下部工工事  
 受注者：りんかい日産建設（株）  
 工期：H25.8.9～H26.1.31

④ 市川地区  
 P67付近（駆体工）

③ 八幡地区  
 P43付近

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
  - 下部工施工中
  - 完成・一部完成
  - 既設



市道

国道45号多賀城地区橋梁上部工工事      高崎地区PC上部工工事  
 多賀城高架橋下部工工事
