


仙塩道路〔多賀城高架橋〕(P74~P108) 工事進捗状況

H26年3月上旬時点

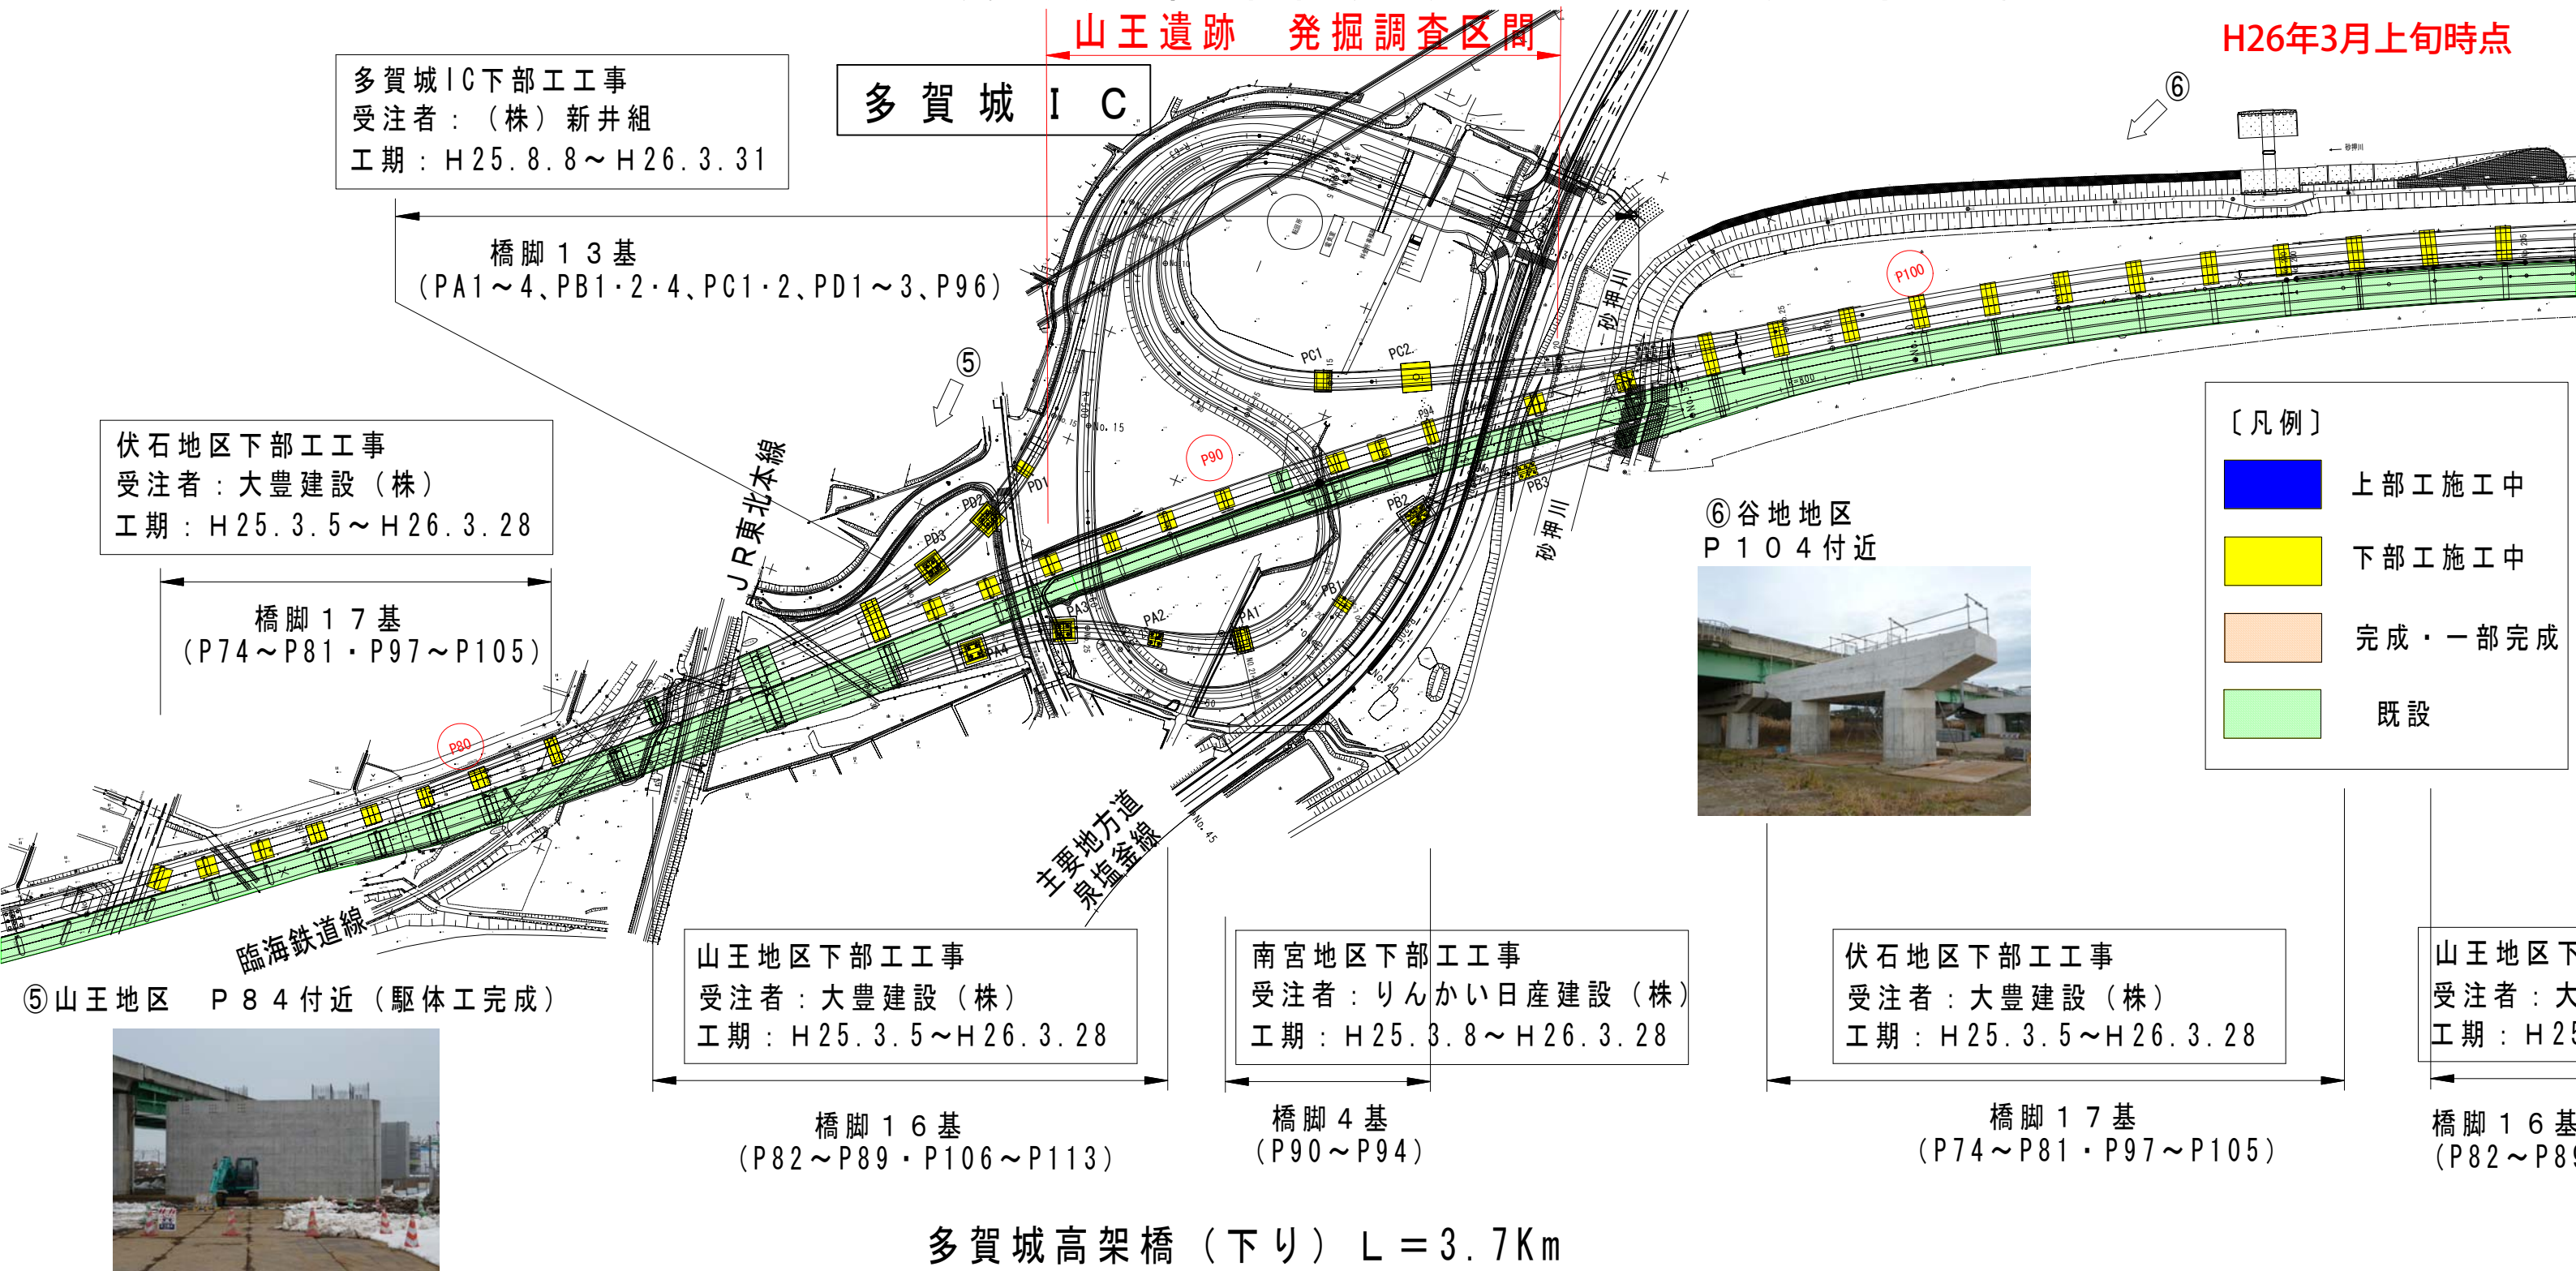

多賀城IC下部工工事
受注者：(株)新井組
工期：H25.8.8~H26.3.31

多賀城 IC

橋脚13基
(PA1~4, PB1・2・4, PC1・2, PD1~3, P96)

伏石地区下部工工事
受注者：大豊建設(株)
工期：H25.3.5~H26.3.28

橋脚17基
(P74~P81・P97~P105)

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
 - 下部工施工中
 - 完成・一部完成
 - 既設

⑥ 谷地地区
P104付近



⑤ 山王地区 P84付近 (駆体工完成)



山王地区下部工工事
受注者：大豊建設(株)
工期：H25.3.5~H26.3.28

橋脚16基
(P82~P89・P106~P113)

南宮地区下部工工事
受注者：りんかい日産建設(株)
工期：H25.3.8~H26.3.28

橋脚4基
(P90~P94)

伏石地区下部工工事
受注者：大豊建設(株)
工期：H25.3.5~H26.3.28

橋脚17基
(P74~P81・P97~P105)

山王地区下部工工事
受注者：大豊建設(株)
工期：H25.3.5~H26.3.28

橋脚16基
(P82~P89)

多賀城高架橋(下り) L=3.7Km

