


仙塩道路〔多賀城高架橋〕（P30～P73）工事進捗状況

平成26年7月上旬時点

多賀城高架橋（下り）L=3.7Km

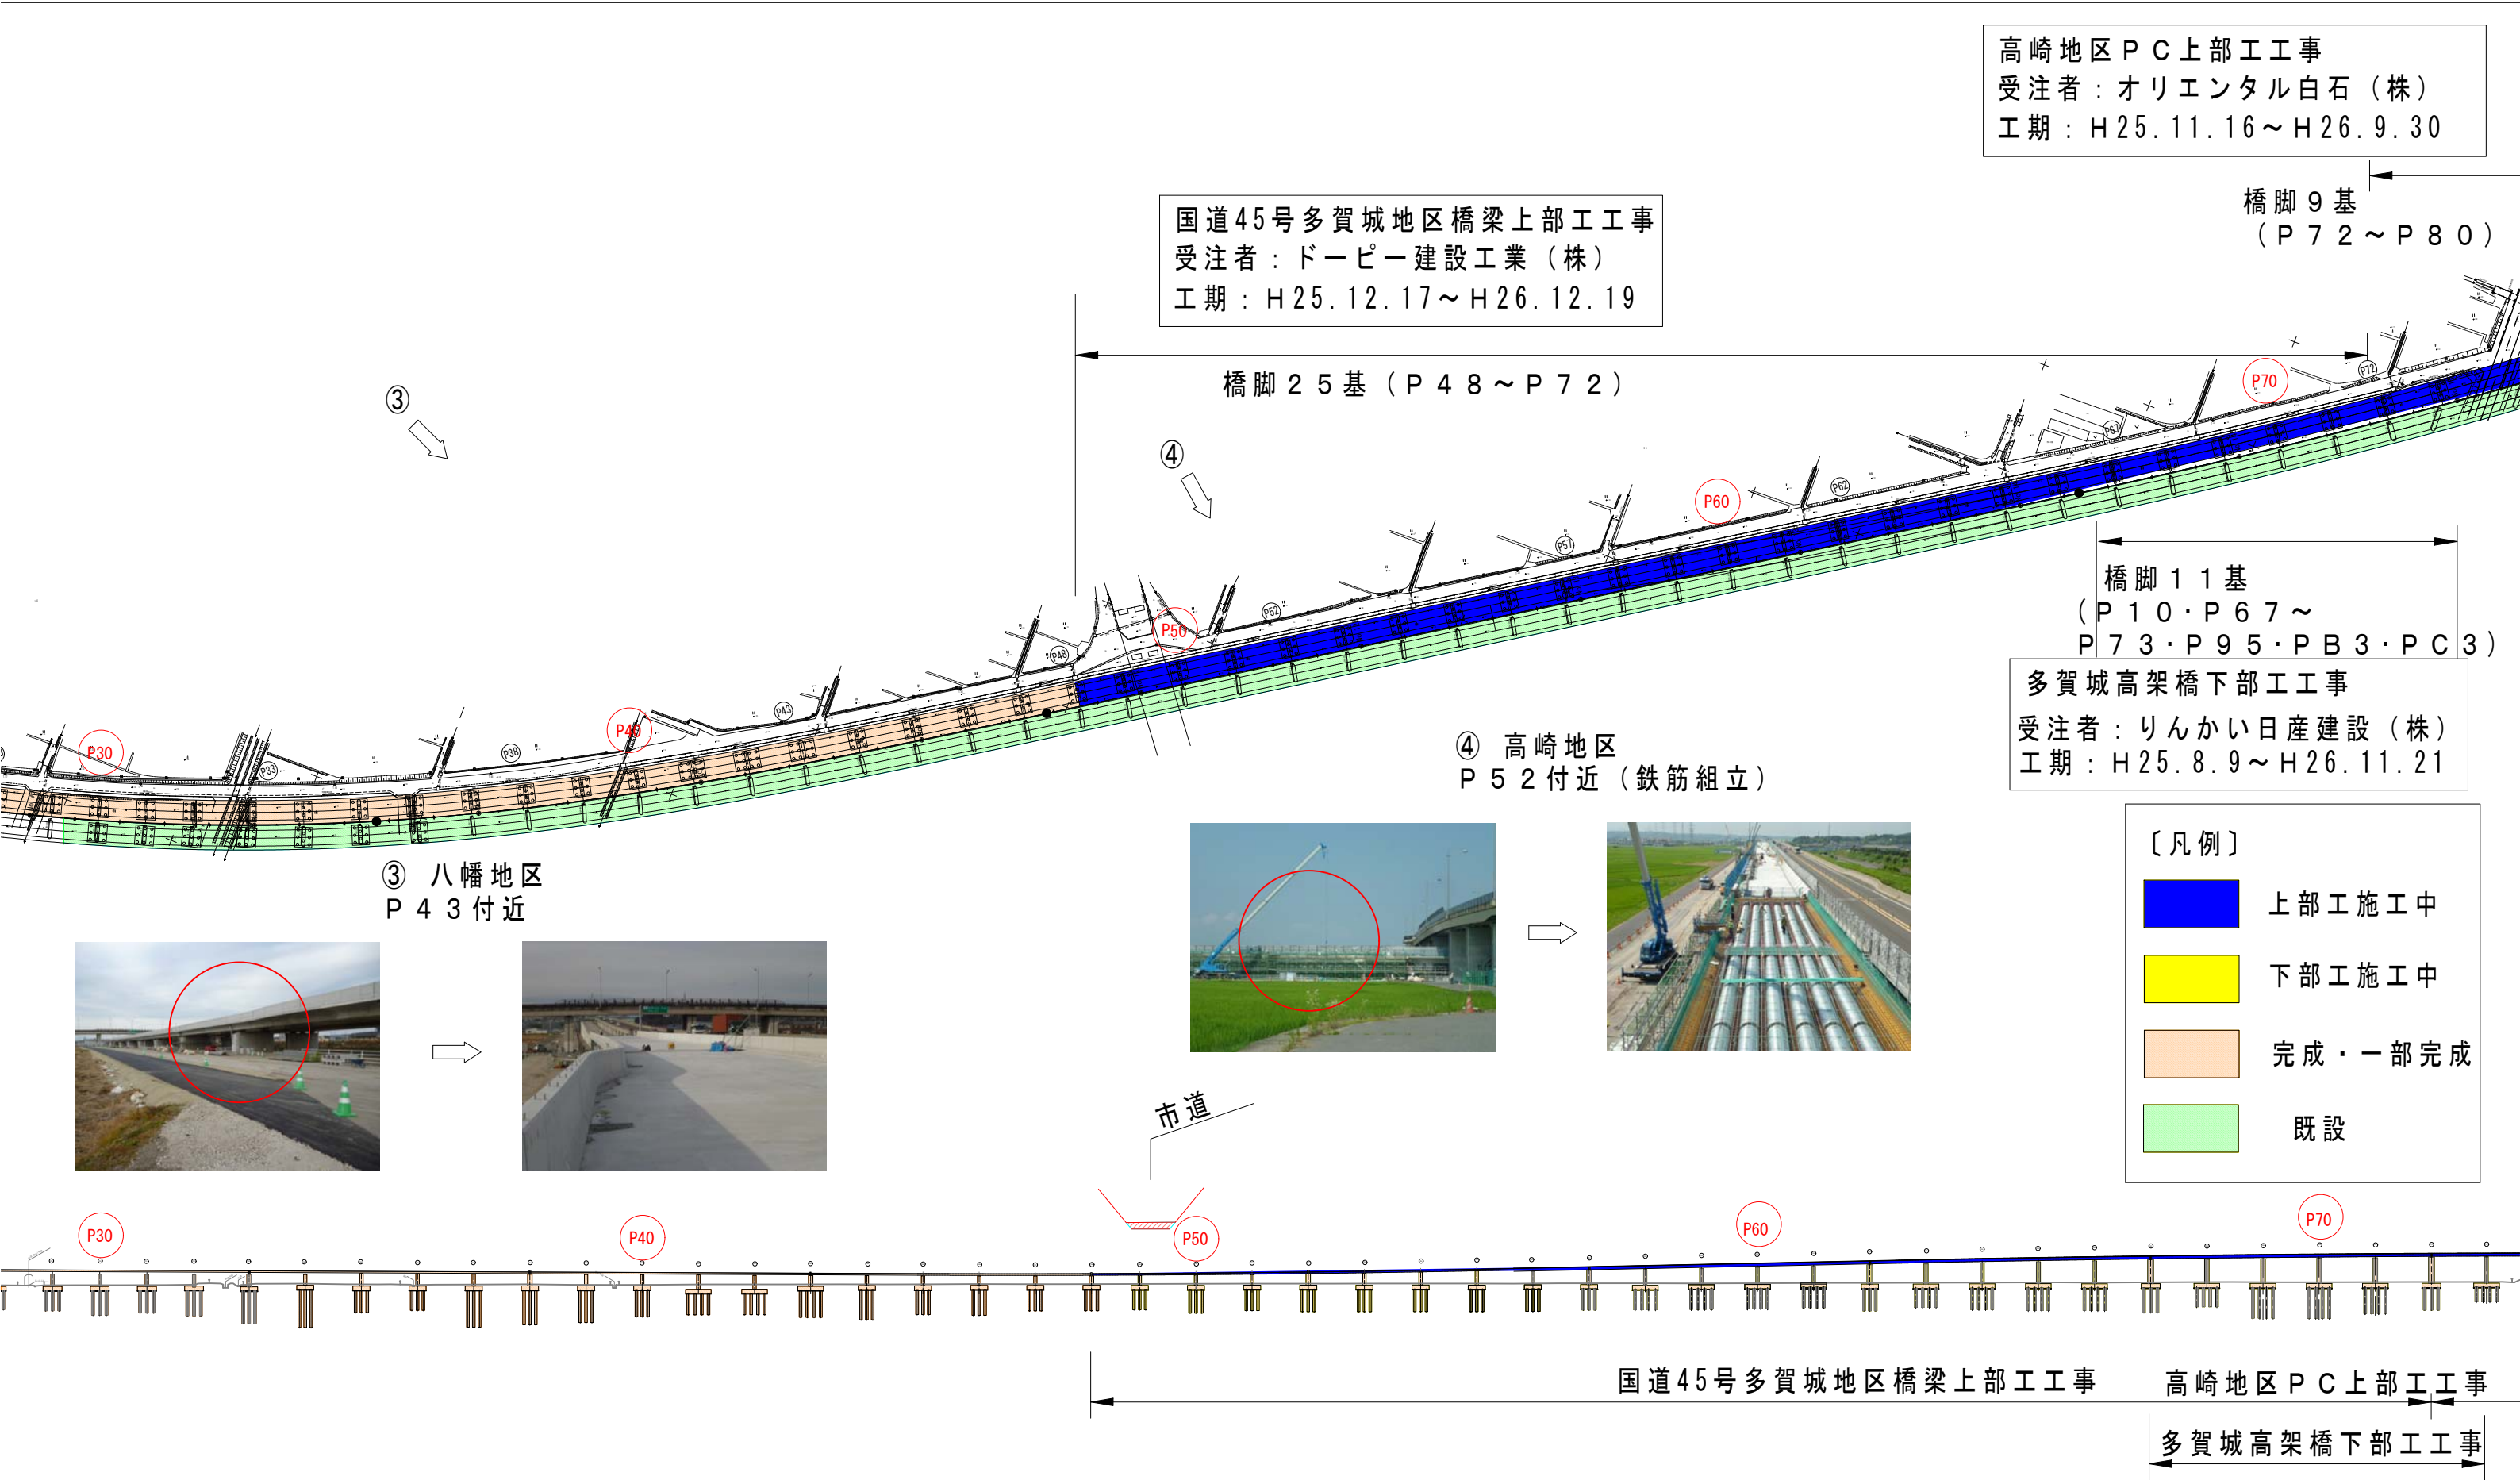

高崎地区PC上部工工事
 受注者：オリエンタル白石（株）
 工期：H25.11.16～H26.9.30

国道45号多賀城地区橋梁上部工工事
 受注者：ドーピー建設工業（株）
 工期：H25.12.17～H26.12.19

橋脚9基
 (P72～P80)

橋脚25基 (P48～P72)

橋脚11基
 (P10・P67～
 P73・P95・PB3・PC3)

多賀城高架橋下部工工事
 受注者：りんかい日産建設（株）
 工期：H25.8.9～H26.11.21

④ 高崎地区
 P52付近（鉄筋組立）


③ 八幡地区
 P43付近



〔凡例〕

	上部工施工中
	下部工施工中
	完成・一部完成
	既設

市道



国道45号多賀城地区橋梁上部工工事
 高崎地区PC上部工工事
 多賀城高架橋下部工工事
