

仙塩道路〔多賀城高架橋〕(P74~P108) 工事進捗状況

平成27年3月上旬時点

多賀城IC西地区上部工工事
受注者：川田工業(株)
工期：H25.10.22~H27.3.27

多賀城IC

橋脚8基
(PC1~4, PD1~4)

⑤山王地区
P84付近(床版工)



国道45号 伏石地区上部工工事
受注者：(株)JFEエンジニアリング
工期：H25.10.18~H27.3.27

橋脚5基 (P80~P84)

山王地区PC上部工工事
受注者：IHIインフラ建設(株)
工期：H26.3.8~H27.3.31

橋脚6基 (P84~P89)

南宮地区PC上部工工事

橋脚6基 (P89~P94)

砂押川橋上部工工事

橋脚3基 (P94~P96)


南宮地区PC上部工工事
受注者：三井住友建設(株)
工期：H25.12.18~H27.3.31

橋脚7基 (P96~P102)

橋脚7基
(P102~P108)
砂押川橋上部工工事
受注者：(株)東京鐵骨橋梁
工期：H25.10.5~H27.3.31

- 〔凡例〕
- 上部工施工中
 - 下部工施工中
 - 完成・一部完成
 - 既設

⑥谷地地区
P104付近(壁高欄コンクリート打設)

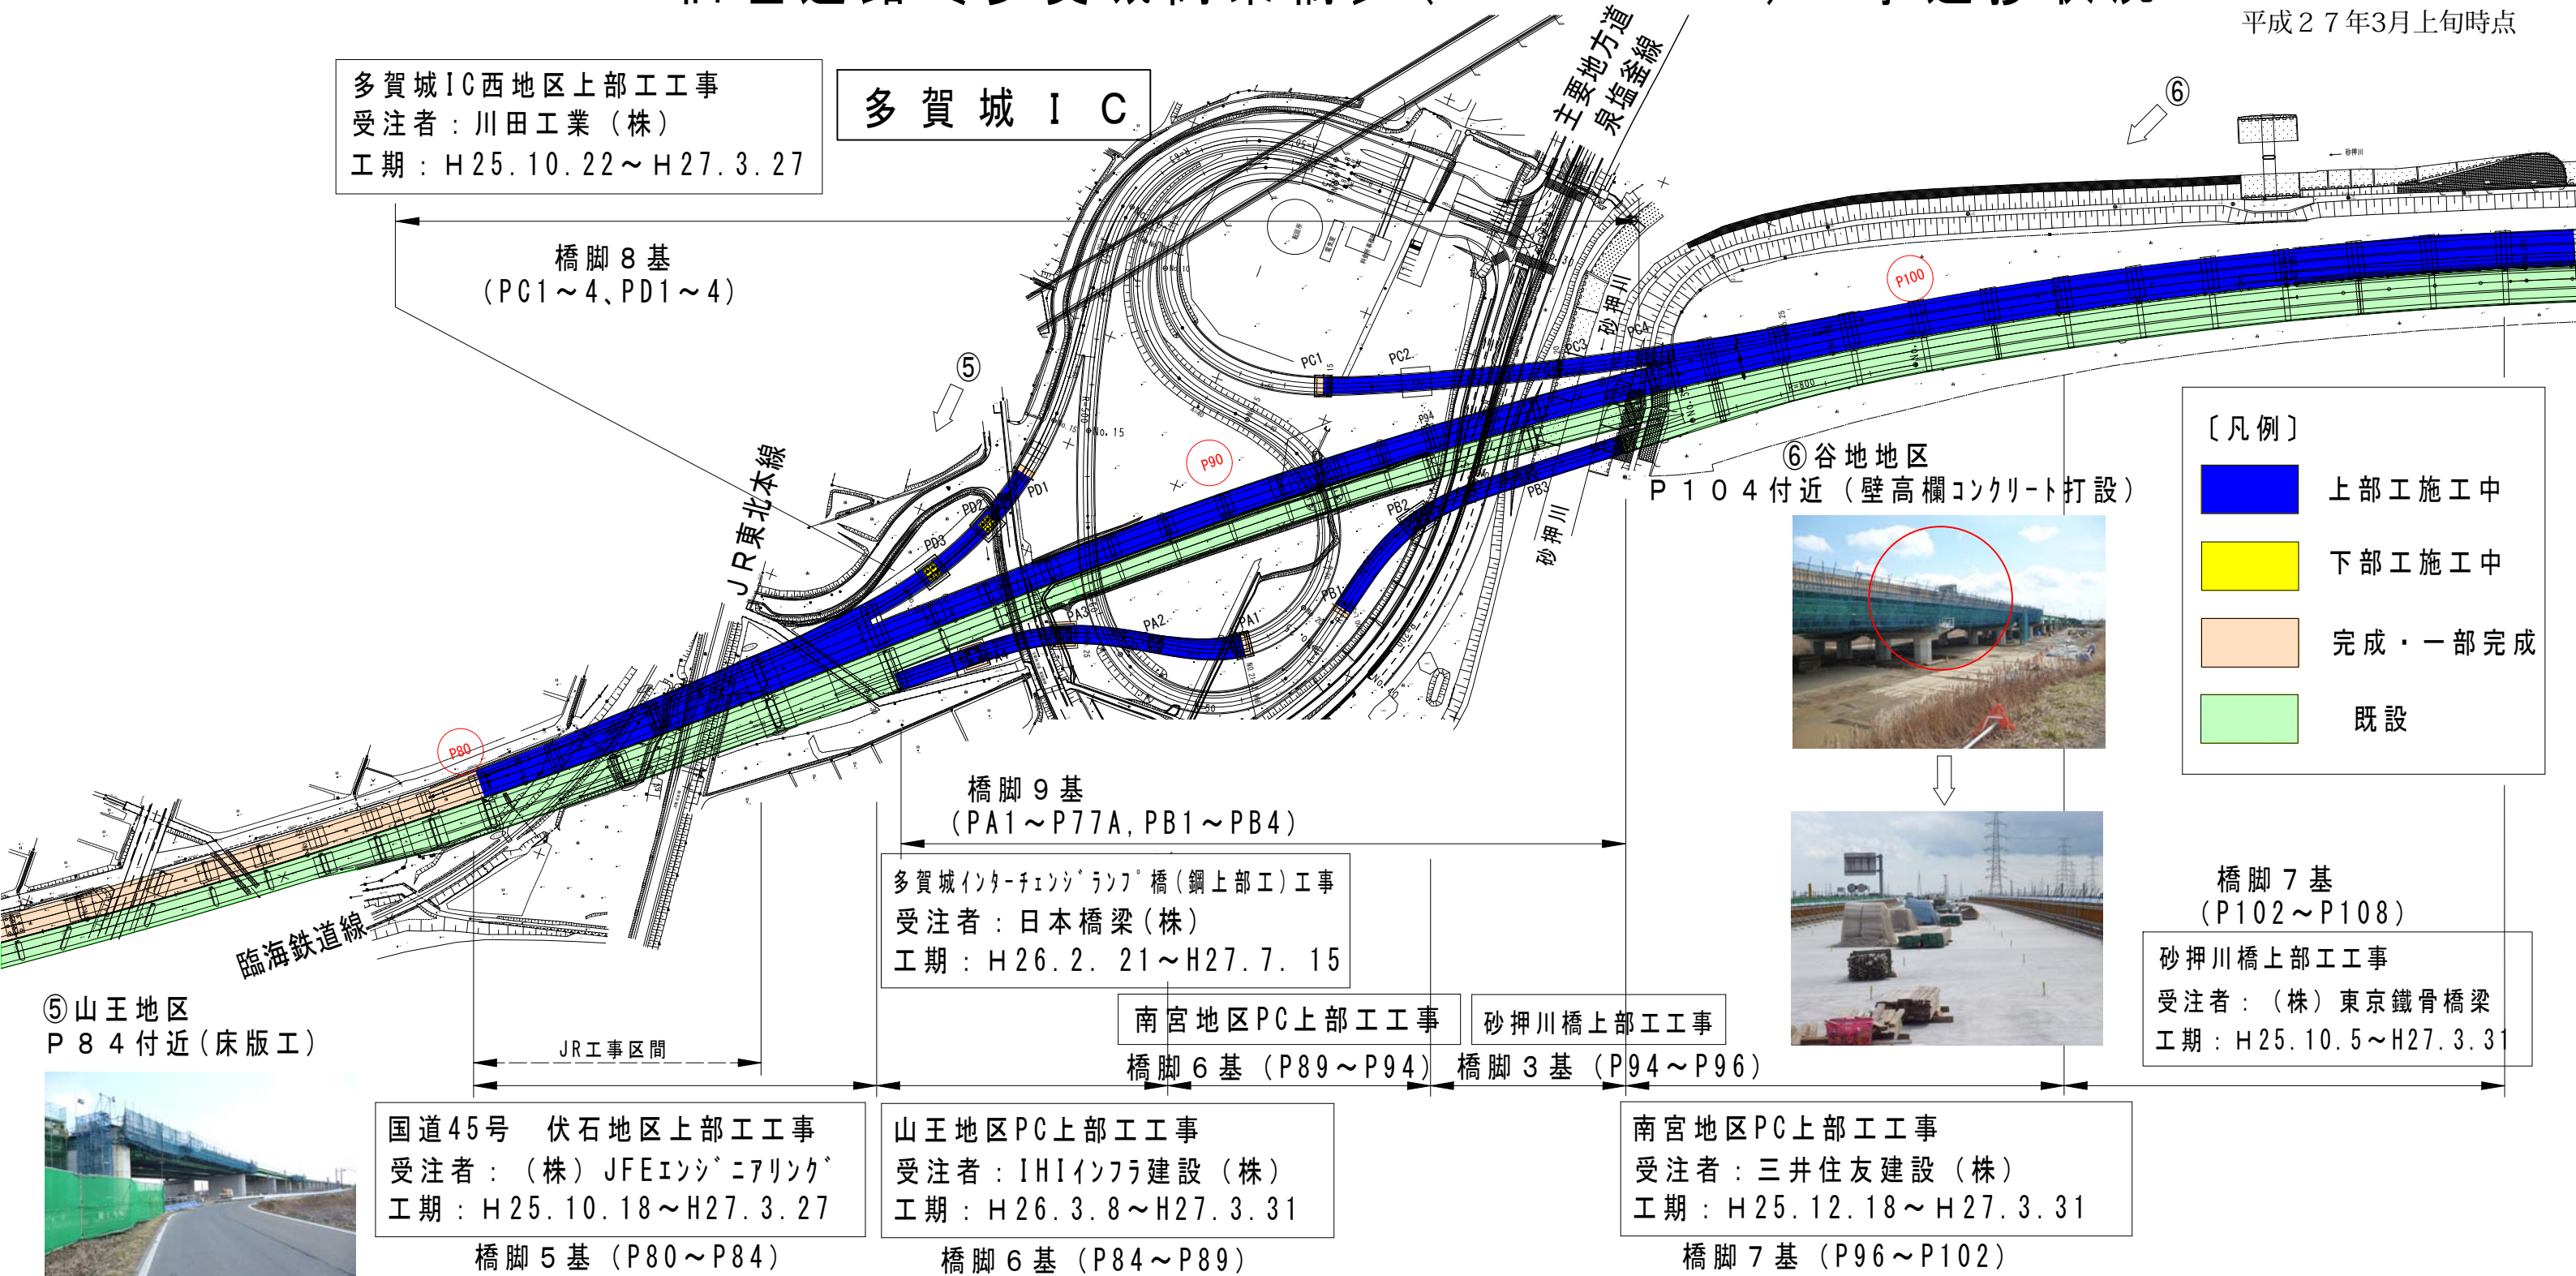

多賀城高架橋(下り) L=3.7Km

