

雄物川水系河川整備計画
【大臣管理区間】
雄物川河川激甚災害対策特別緊急事業
進捗状況
<説明資料>


令和4年11月30日
国土交通省 東北地方整備局

雄物川における平成29年7月洪水の概要

- 平成29年7月の梅雨前線に伴う豪雨により、**雄物川・樺川基準地点において観測開始以来、最高水位を観測**
- 大仙市や秋田市を中心に、床上浸水167戸・床下浸水538戸、計705戸の甚大な浸水被害が発生**
(同年8月、翌年5月にも被害発生)






- 中森国交省**
米代川 381mm
- 雄和気象庁**
雄物川 348mm
- 横手気象庁**
雄物川 314mm
- 大清水国交省**
子吉川 338mm

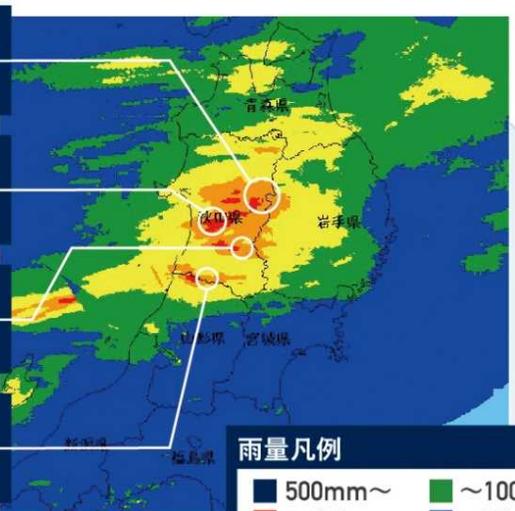

7月22日0時から23日13時までの37時間の累計


支川玉川及び玉川合流点より下流の本川及び支川の観測所

水系名	河川名	観測所名	距離標	基準水位 (m)	平成29年7月22日出水 暫定値)		これまでの最高水位	
					最高水位	生起時刻	最高水位	生起日
雄物川	雄物川	石田坂	左6.10k	計画高水位 はんらん危険水位	6.27	H29/7/23 16:00	5.69	H23/6/24 24:00
		樺川	右13.05k	計画高水位 はんらん危険水位	9.16	H29/7/23 18:00	9.07	S22/8/3 18:00
		新波	左28.40k	計画高水位 はんらん危険水位	14.55	H29/7/23 17:00	13.65	H23/6/24 22:00
		木原田	左36.90k	計画高水位 はんらん危険水位	10.57	H29/7/23 17:00	9.60	H23/6/24 21:00
		刈和野	右48.70k	計画高水位 はんらん危険水位	9.04	H29/7/23 16:00	8.30	H23/6/24 15:00
		神宮寺	右59.18k	計画高水位 はんらん危険水位	7.56	H29/7/23 11:00	7.74	H23/6/24 12:00~13:00
	岩見川	豊成 右4.50k	計画高水位 はんらん危険水位	10.05	H29/7/23 10:00	9.16	H23/6/24 10:00	
	はんらん危険水位		—	—	—	—		
	澁川	澁川 左2.50k	計画高水位 はんらん危険水位	7.93	H29/7/23 9:00	6.36	H23/6/24 21:00	
	玉川	長野 左10.10k	計画高水位 はんらん危険水位	5.03	H29/7/23 7:00	4.79	H19/9/17 23:00	
榎木内川	栃木橋 左33.30k	計画高水位 はんらん危険水位	4.49	H29/7/23 6:00	4.46	H19/9/17 20:00		

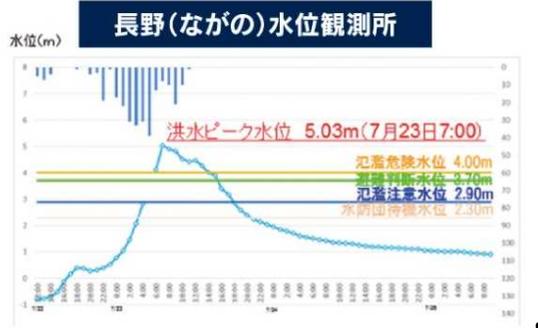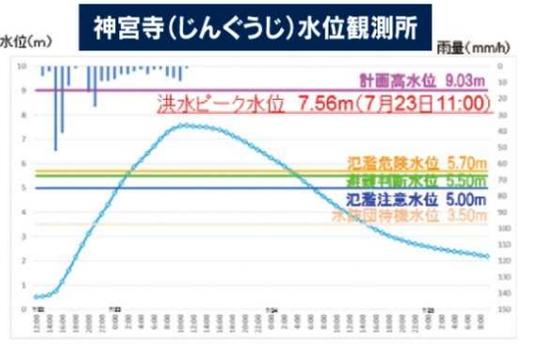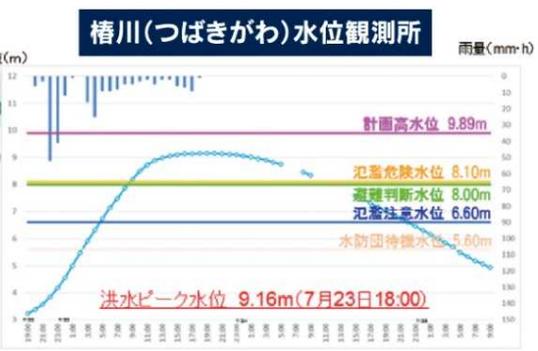

※正時データ
※数値は速報値

平成29年7月洪水 雄物川の状況

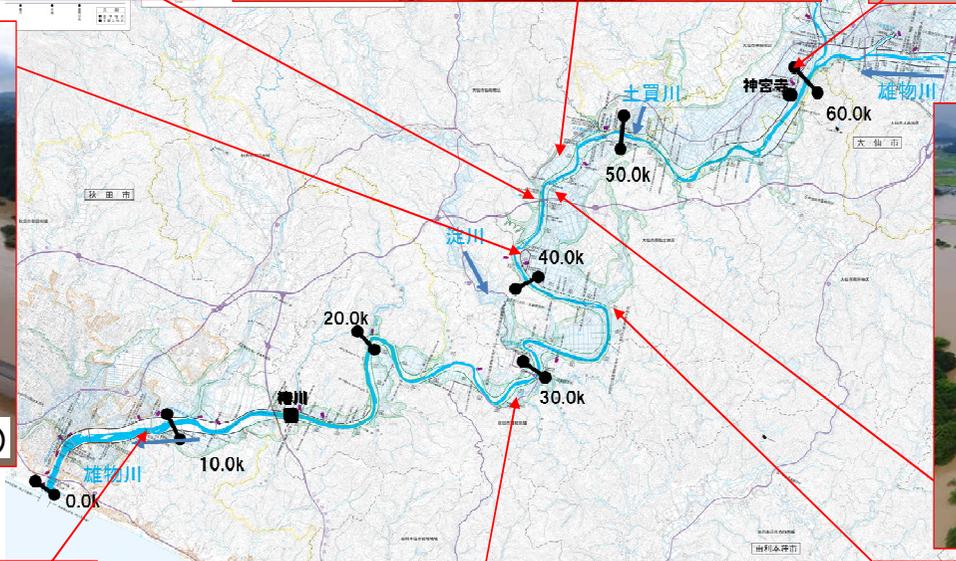

国及び秋田県による雄物川緊急治水対策

○平成29年7月梅雨前線豪雨によって**甚大な浸水被害が発生した雄物川中・下流部**において、国・秋田県が連携しハード対策とソフト対策が一体となった『雄物川緊急治水対策』を平成29年度より着手

【ハード対策】(事業費合計 約615億円)

■河川整備を緊急的、集中的に実施


- | | |
|--|--|
| <p>おものかわ</p> <p>【雄物川(直轄事業:国土交通省)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・堤防整備(築堤、嵩上げ、輪中堤) ・河道掘削 等 ○事業期間 <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度～令和4年度 ○事業費合計 <ul style="list-style-type: none"> ・約280億円 ○実施事業 <ul style="list-style-type: none"> ・河川激甚災害対策特別緊急事業 ・災害対策等緊急事業推進費(H29,30) ・直轄河川改修事業 | <p>あらわがわ よどかわ ふくべないがわ うわみぞがわ ならおかがわ つちかがわ</p> <p>【新波川・淀川・福部内川・上溝川・櫛岡川・土貫川
(補助事業:秋田県)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・堤防整備(築堤、嵩上げ)、河道掘削 等 ○事業期間 <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度～令和4年度 ○事業費合計 <ul style="list-style-type: none"> ・約335億円 ○実施事業 <ul style="list-style-type: none"> ・河川災害復旧等関連緊急事業(平成29年度採択) ・河川等災害復旧助成事業(平成29年度採択) ・河川等災害関連事業(平成29年度採択) ・床上浸水対策特別緊急事業(平成30年度採択) ・河川改修事業 |
|--|--|

【ソフト対策】(円滑かつ迅速な避難に向けた支援)


■住民の避難を促すためのソフト対策を沿川自治体と連携して実施

- 主な実施内容(令和4年度)
 - ・緊急行動計画改定を踏まえた取組の加速化
 - ・要配慮者利用施設避難確保計画作成等の促進
 - ・水害リスクを共有するための「防災教育」の推進
 - ・避難を促す簡易型河川監視カメラの促進
 - ・タイムラインを活用した関係機関の連携強化
 - ・関係機関と連携した排水作業訓練の実施


築堤区間(嵩上げ) <イメージ>

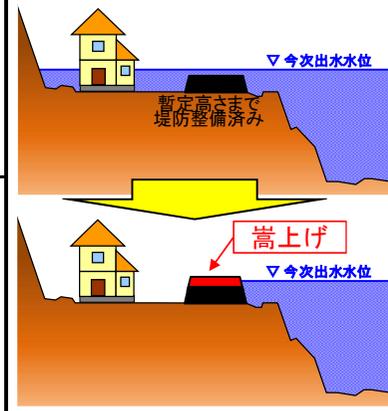

築堤区間(築堤) <イメージ>

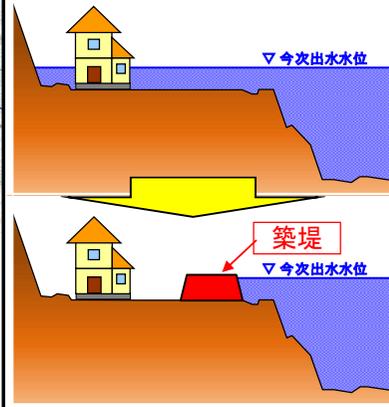

国及び秋田県による雄物川緊急治水対策対象区間 (うち直轄対策区間は3.0k~60.0kの約57.0k) (79.0k)

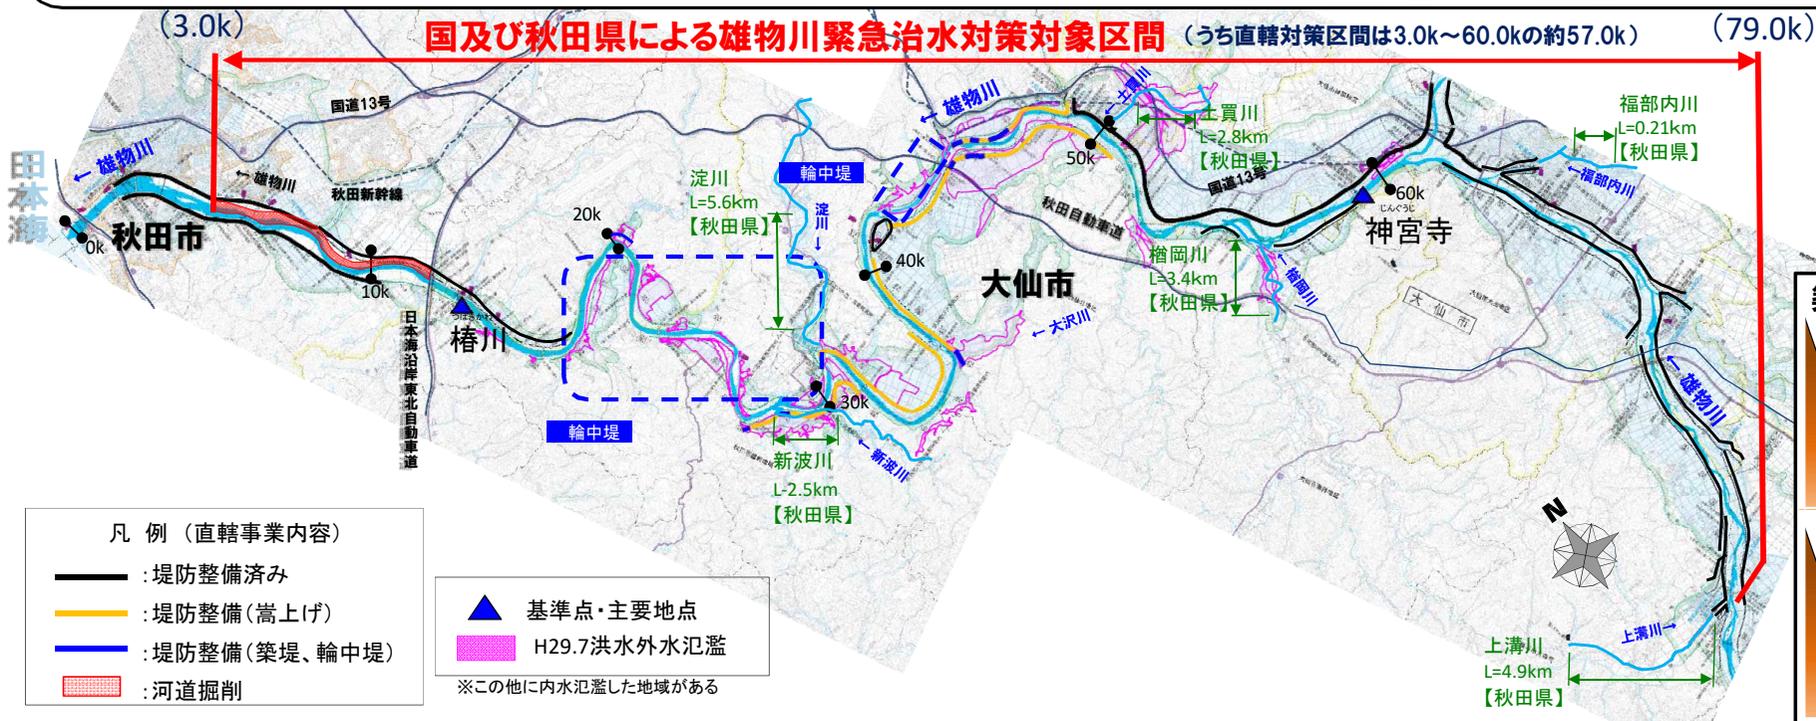

雄物川下流 激甚災害対策特別緊急事業 整備状況

令和4年10月末時点

事業進捗率

(※事業費以外は、激特事業以前からの継続内容を含みます)

総事業費(約124億円)



秋田河川国道事務所分

堤防・構造物設計



9地区測量・設計着手

用地調査



9地区調査着手

用地補償(面積ベース)



8地区着手

堤防・構造物工事



7地区着手












激特事業 概略工程

2022.11

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①銅屋地区 輪中堤 L=1,200m		堤防・構造物設計 用地調査		用地補償	堤防・構造物工事		
②平尾島地区 輪中堤 L=600m			治水対策検討 堤防・構造物設計				
③戸草沢地区 輪中堤 L=1,300m		堤防・構造物設計 用地調査		用地補償	堤防・構造物工事		
④種沢地区 輪中堤 L=1,100m		堤防・構造物設計 用地調査		用地補償		堤防・構造物工事	
⑤戸賀沢地区 輪中堤 L=600m		堤防・構造物設計 用地調査		用地補償	堤防・構造物工事		
⑥川崎地区 輪中堤 L=1,000m			堤防・構造物設計	用地調査	用地補償		
⑦左手子地区 輪中堤 L=900m		堤防・構造物設計 用地調査		用地補償	堤防・構造物工事		
⑧向野地区 輪中堤 L=1,300m		堤防・構造物設計				堤防・構造物工事	
⑨新波地区 連続堤 L=4,500m			用地調査	用地補償			堤防・構造物工事

※川崎地区、平尾島地区は、2023年度から「一般河川改修事業」での対応予定


※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

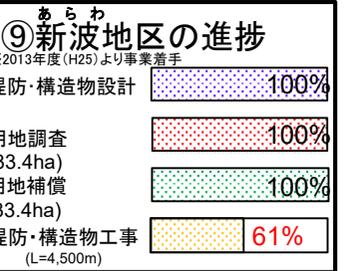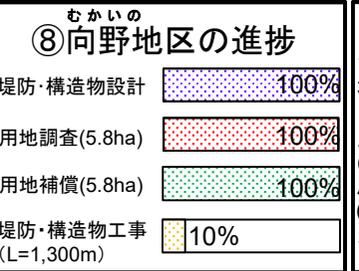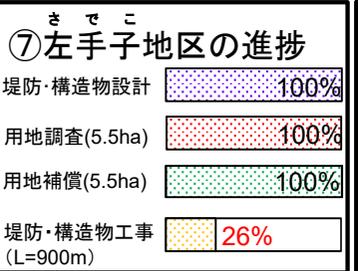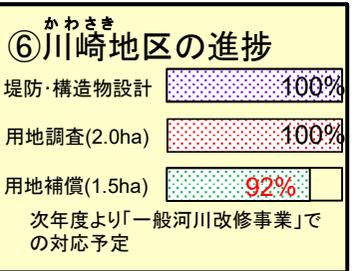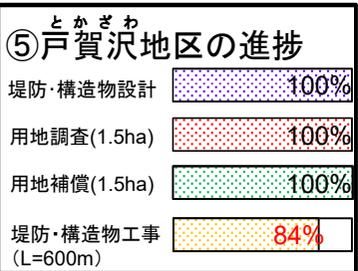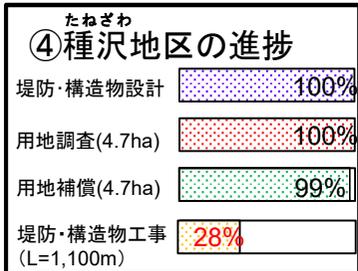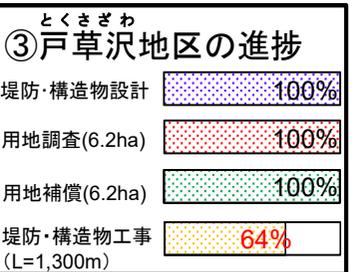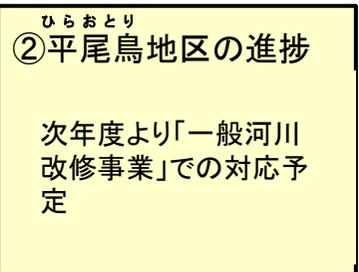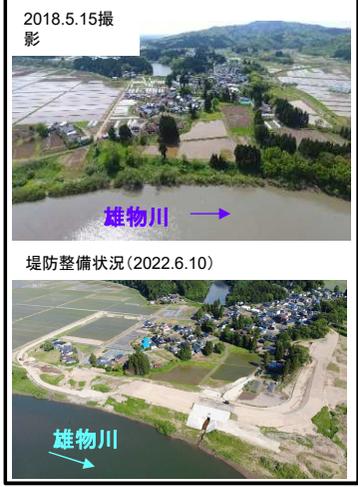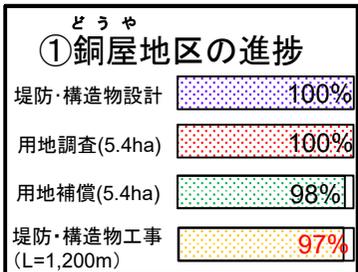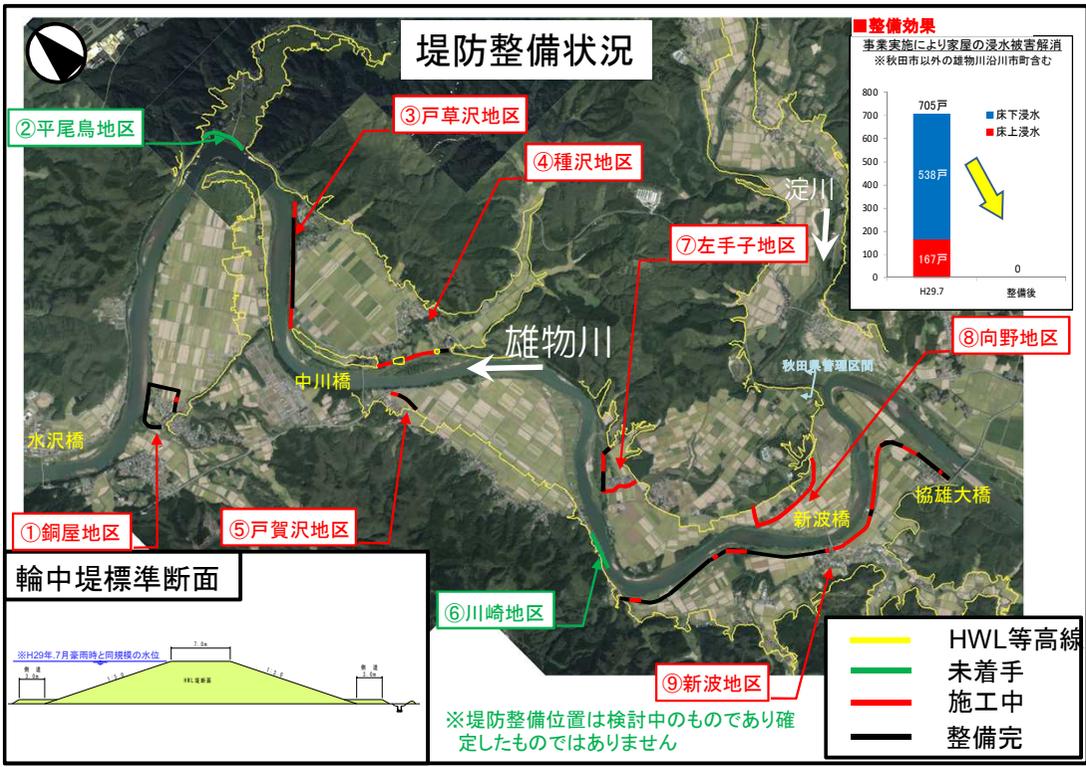


雄物川上流 河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況

事業進捗率

(※事業費以外は、激特事業以前からの継続内容を含みます) 令和4年10月末現在

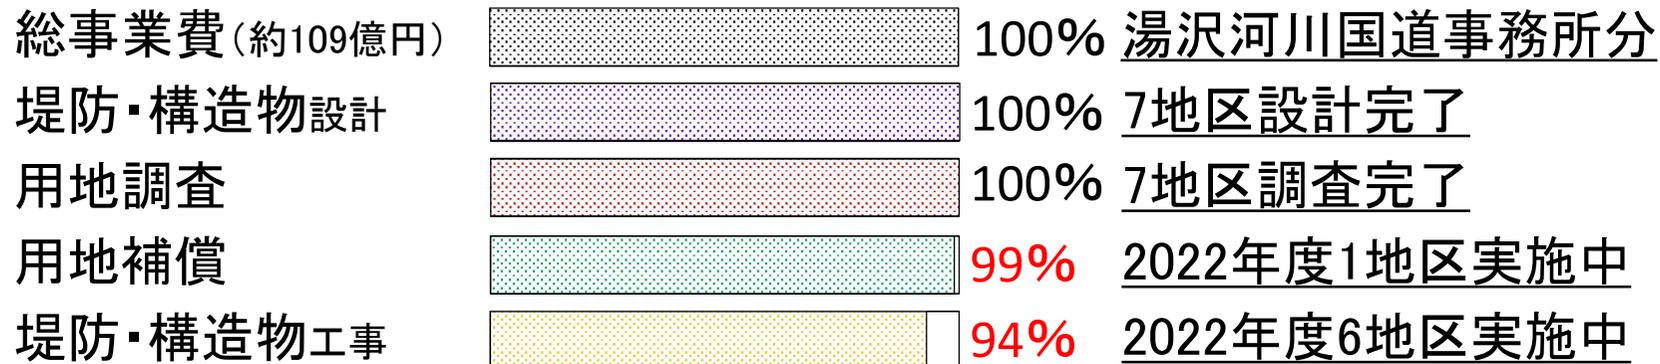

激特事業 概略工程

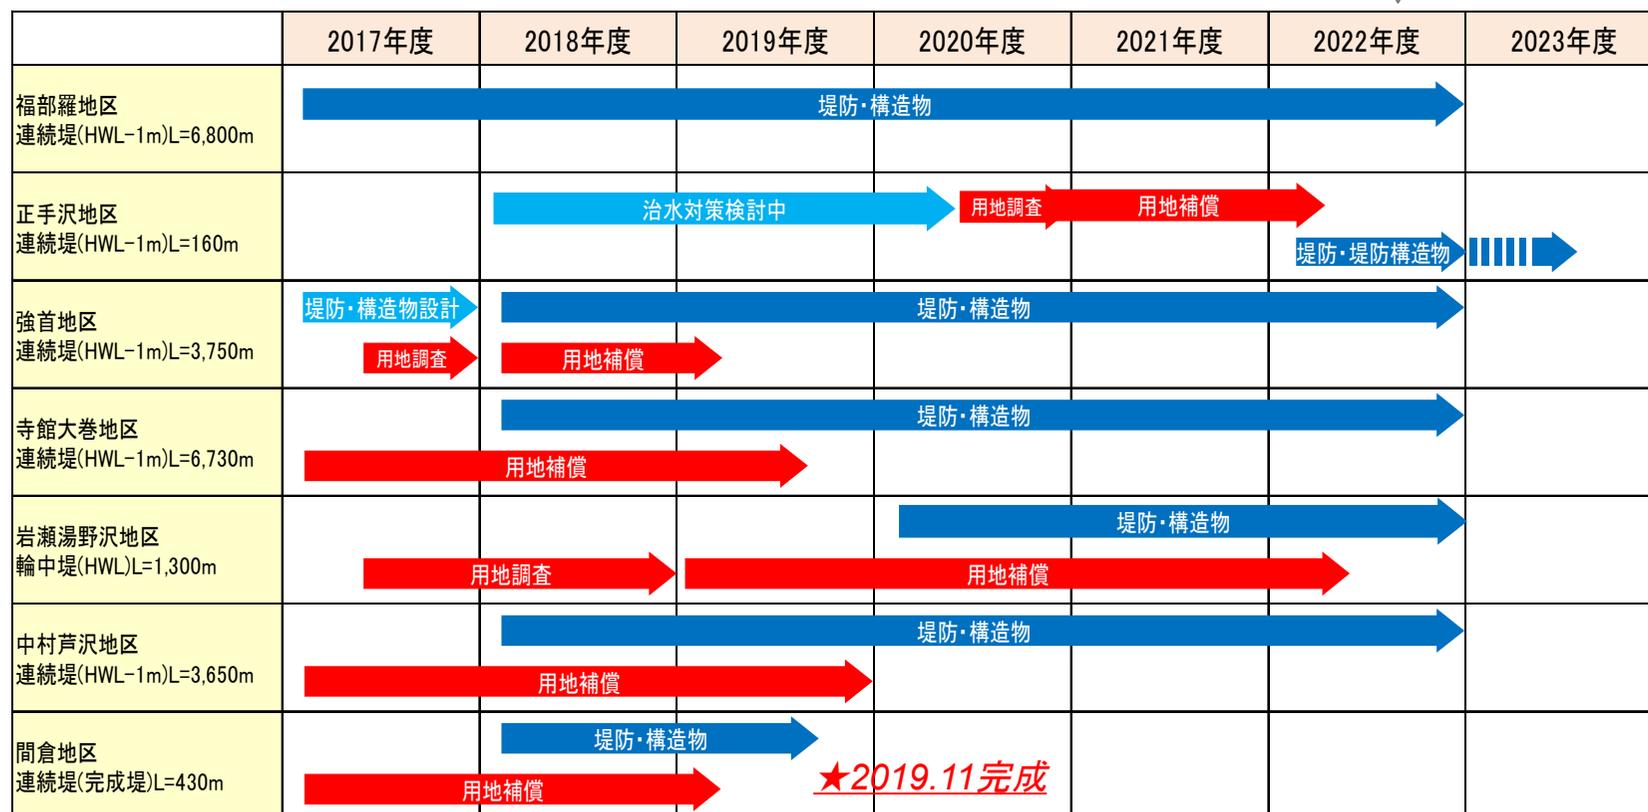


※物渡地区は、別途治水対策を検討。

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

雄物川上流 河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況

堤防整備着手状況

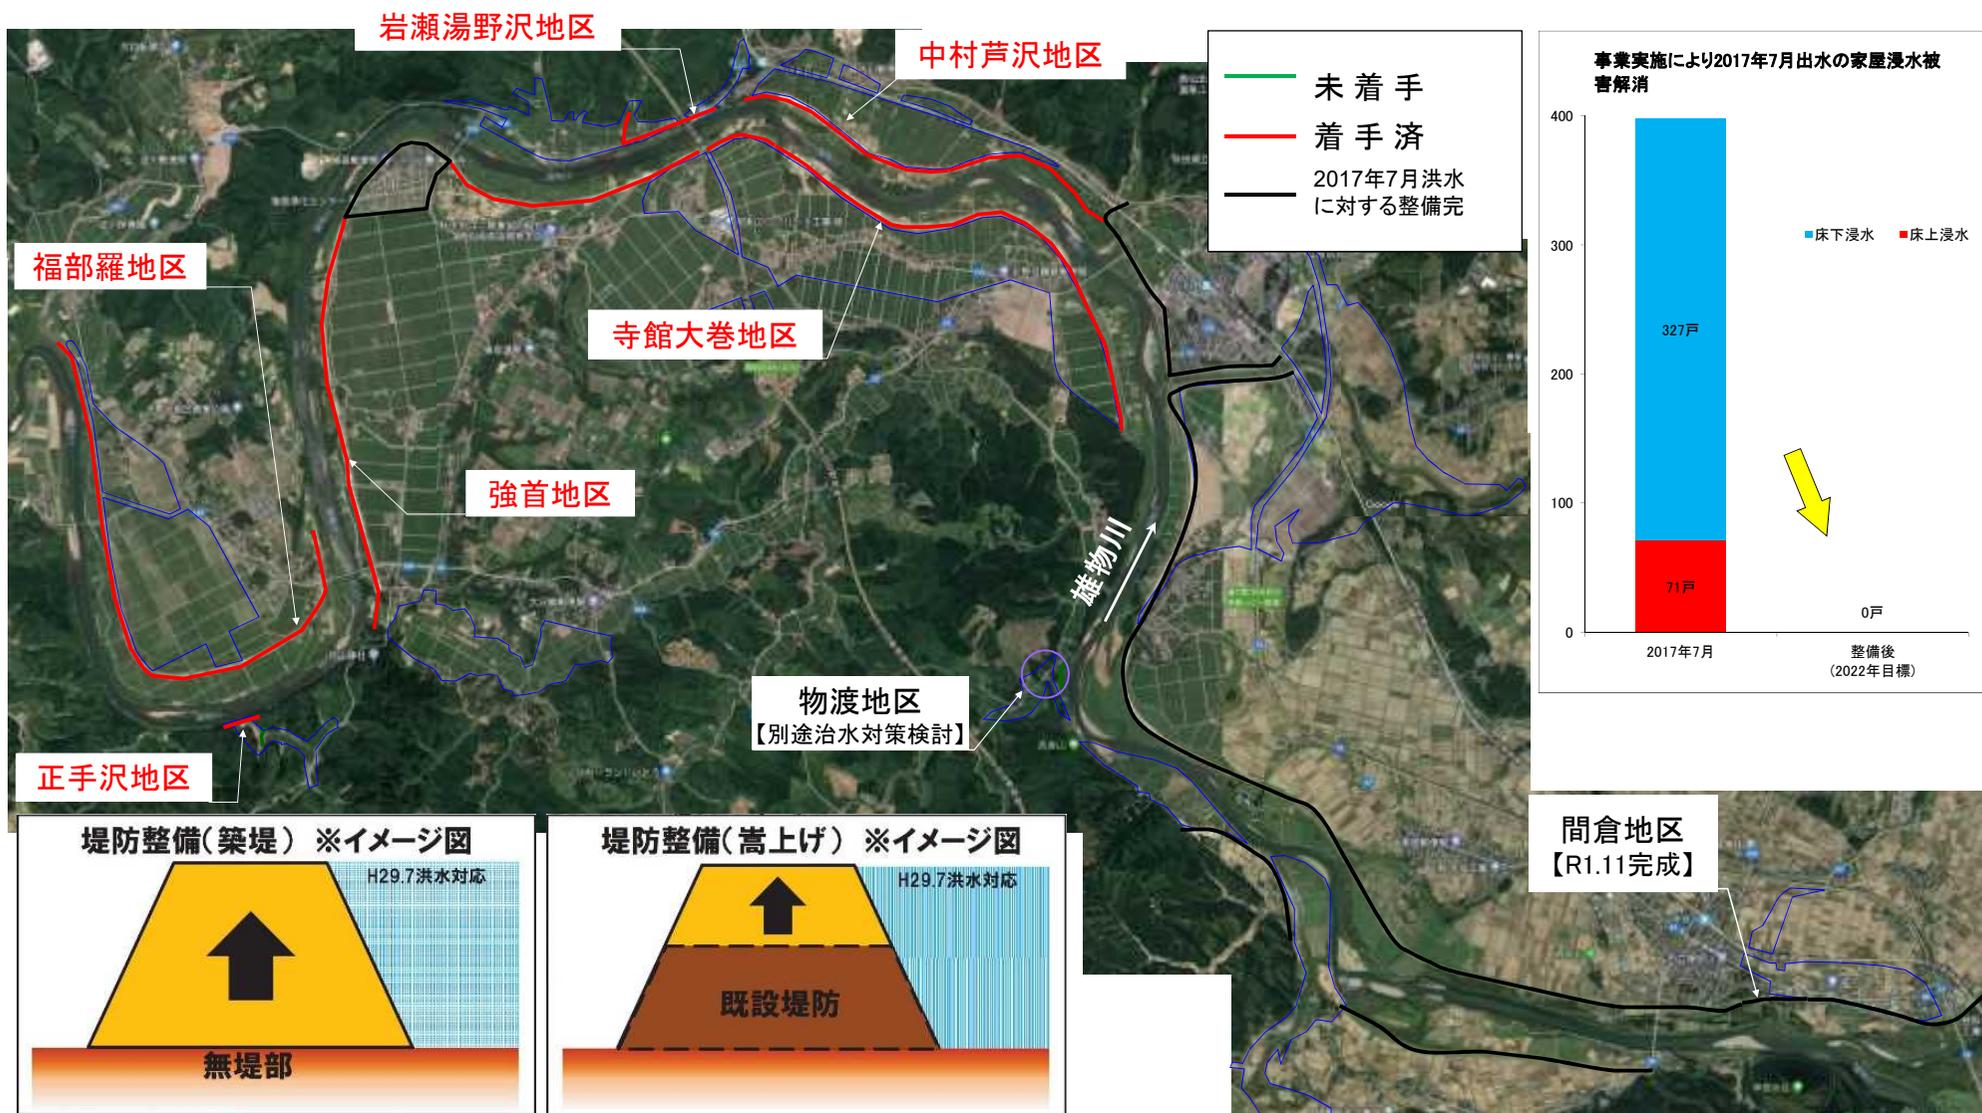

雄物川上流 河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況

令和4年10月末現在

ふくべら 福部羅地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		100%
堤防・構造物工事		99%



いわせゆのさわ 岩瀬湯野沢地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		98%
堤防・構造物工事		83%



なかむらあしざわ 中村芦沢地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		100%
堤防・構造物工事		99%



まぐら 間倉地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		100%
堤防・構造物工事		100%



しょうてさわ 正手沢地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		100%
堤防・構造物工事		0%

地盤改良施工中



こわくび 強首地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		100%
堤防・構造物工事		88%



てらだておおまき 寺館大巻地区の進捗

堤防・構造物設計		100%
用地調査		100%
用地補償		100%
堤防・構造物工事		95%



ぶつど 物渡地区の進捗

「防災集団移転促進事業」での対応予定(大仙市)

