

国道349号 山側への別ルート(別線整備) 工事進捗状況

令和6年2月末時点

① 道路改良工事施工中




② 床版工工事施工中



③ 道路改良工事施工中



④ 道路改良工事施工中

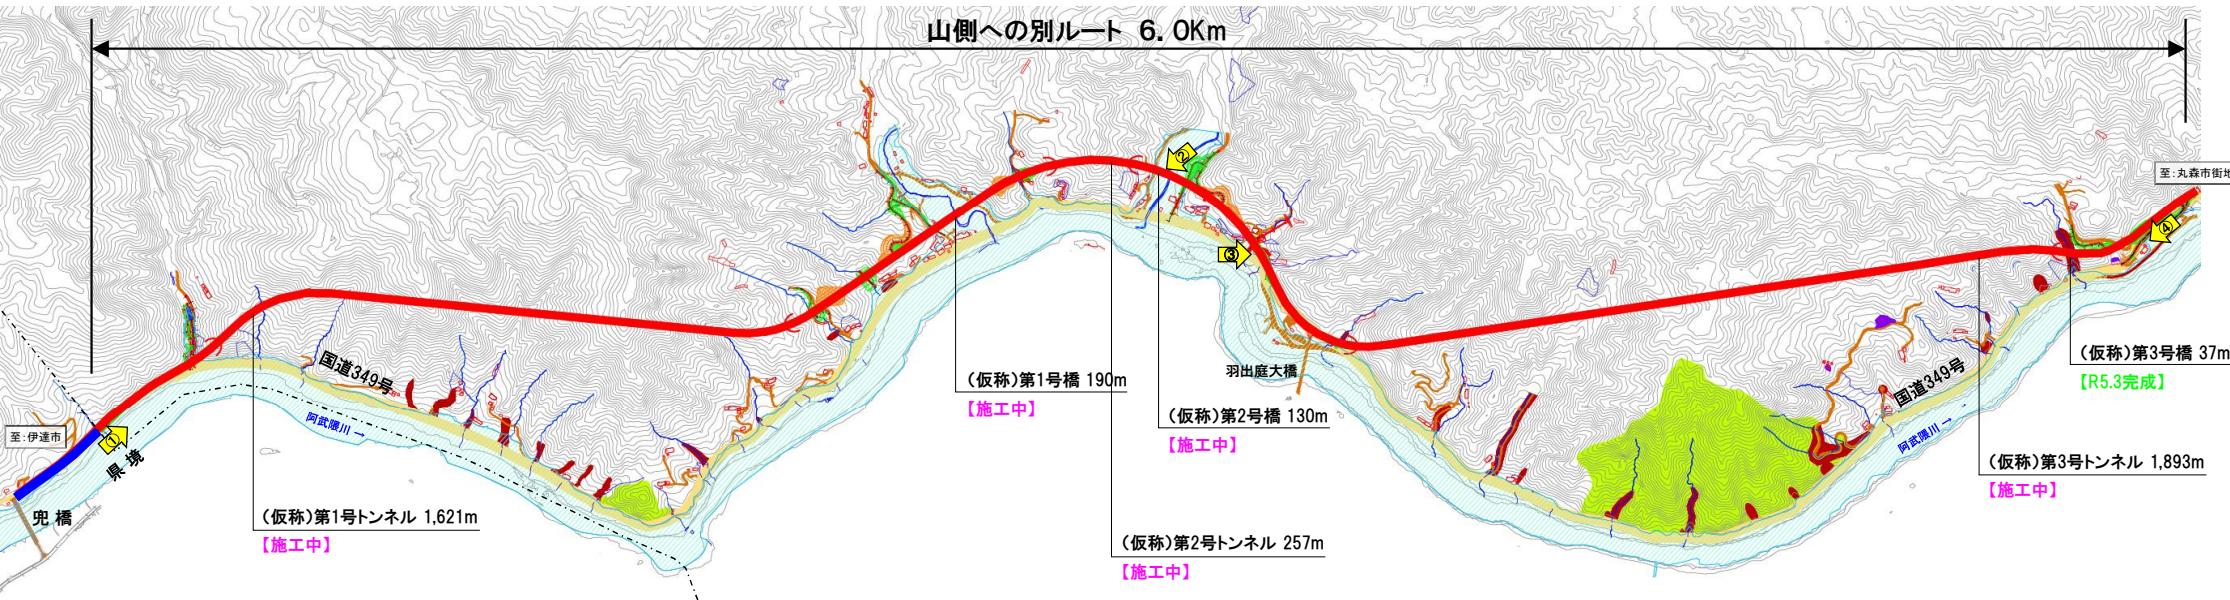

凡 例

台風19号浸水範囲

台風19号被災箇所

県立自然公園(第3種特別地域)




— (福島県から受託工事により、国交省施行) 兜橋～県境部区間 0.3km

— (国交省施行) 山側への別ルート 6.0km

(仮称)第1号トンネル 進捗状況

令和6年2月末時点

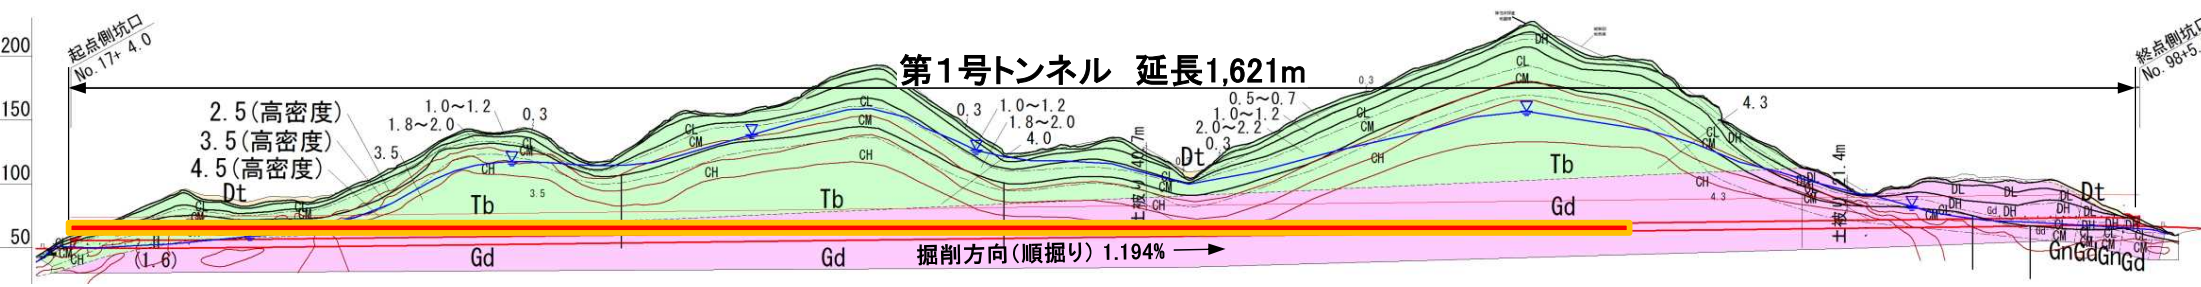

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	1,219m	／ 1,621m	75%
覆工コンクリート	542m	／ 1,621m	33%

地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
	—		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	雲山層	雲山層	凝灰角礫岩	Tb	凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)




▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル坑内状況

(仮称)第2号トンネル 進捗状況

令和6年2月末時点

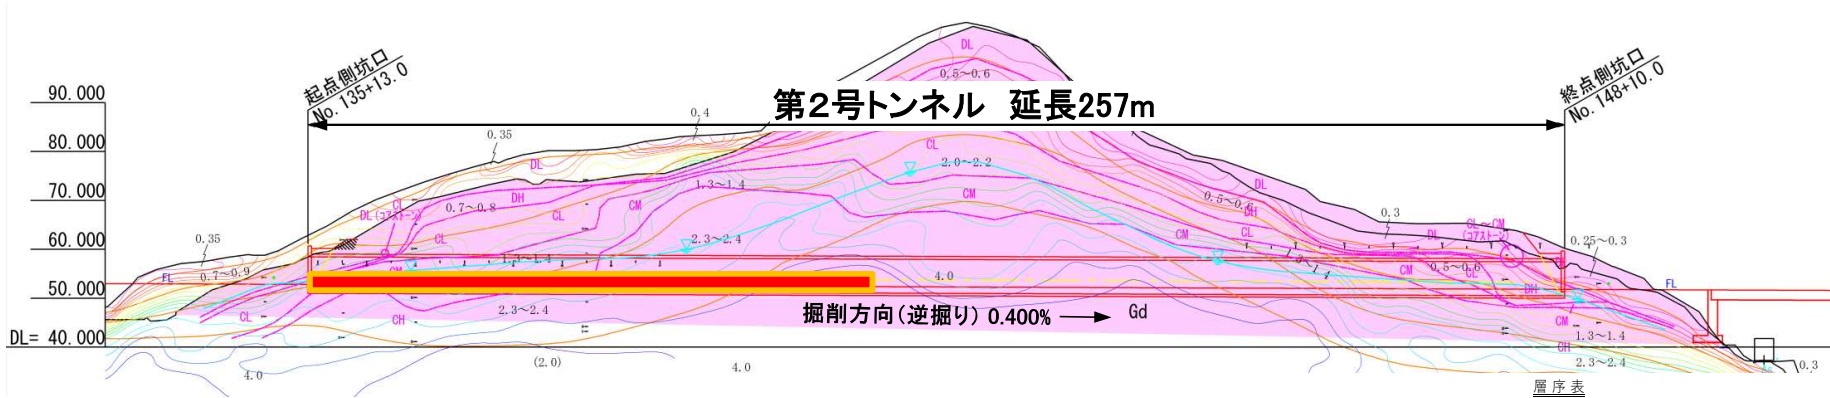

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	126m	257m	49%
覆工コンクリート	0m	257m	0%

地質時代	地層名			土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd 礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt 礫混じり土砂
	—		沖積層	A 礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	霊山層	霊山層	凝灰角礫岩	Tb 凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
			花崗閃緑岩	Gd 花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)
中生代 白亜紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	




▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル坑内状況

(仮称)第3号トンネル 進捗状況

令和6年2月末時点

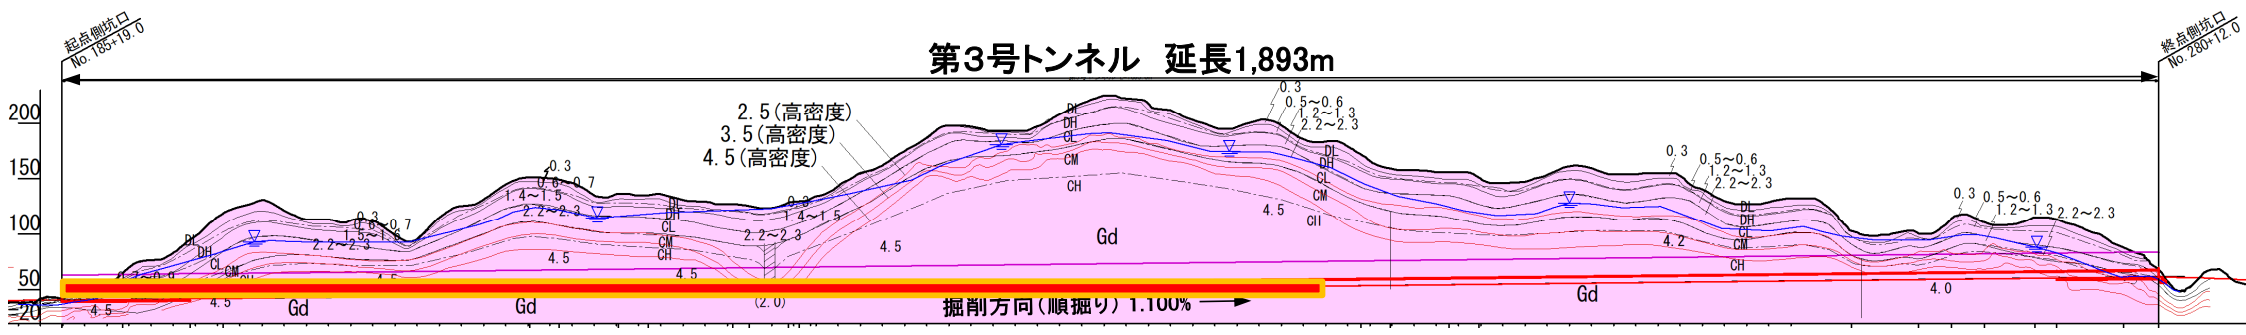

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	1,137m	／ 1,893m	60%
覆エコンクリート	367m	／ 1,893m	19%

層 序 表					
地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
	—		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	雲山層	雲山層	凝灰角礫岩	Tb	凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)



▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル坑内状況
