

国道349号 山側への別ルート(別線整備) 工事進捗状況

令和6年8月末時点

道路改良工事施工中




(仮)第1号橋完成



舗装工事施工中



道路改良工事施工中

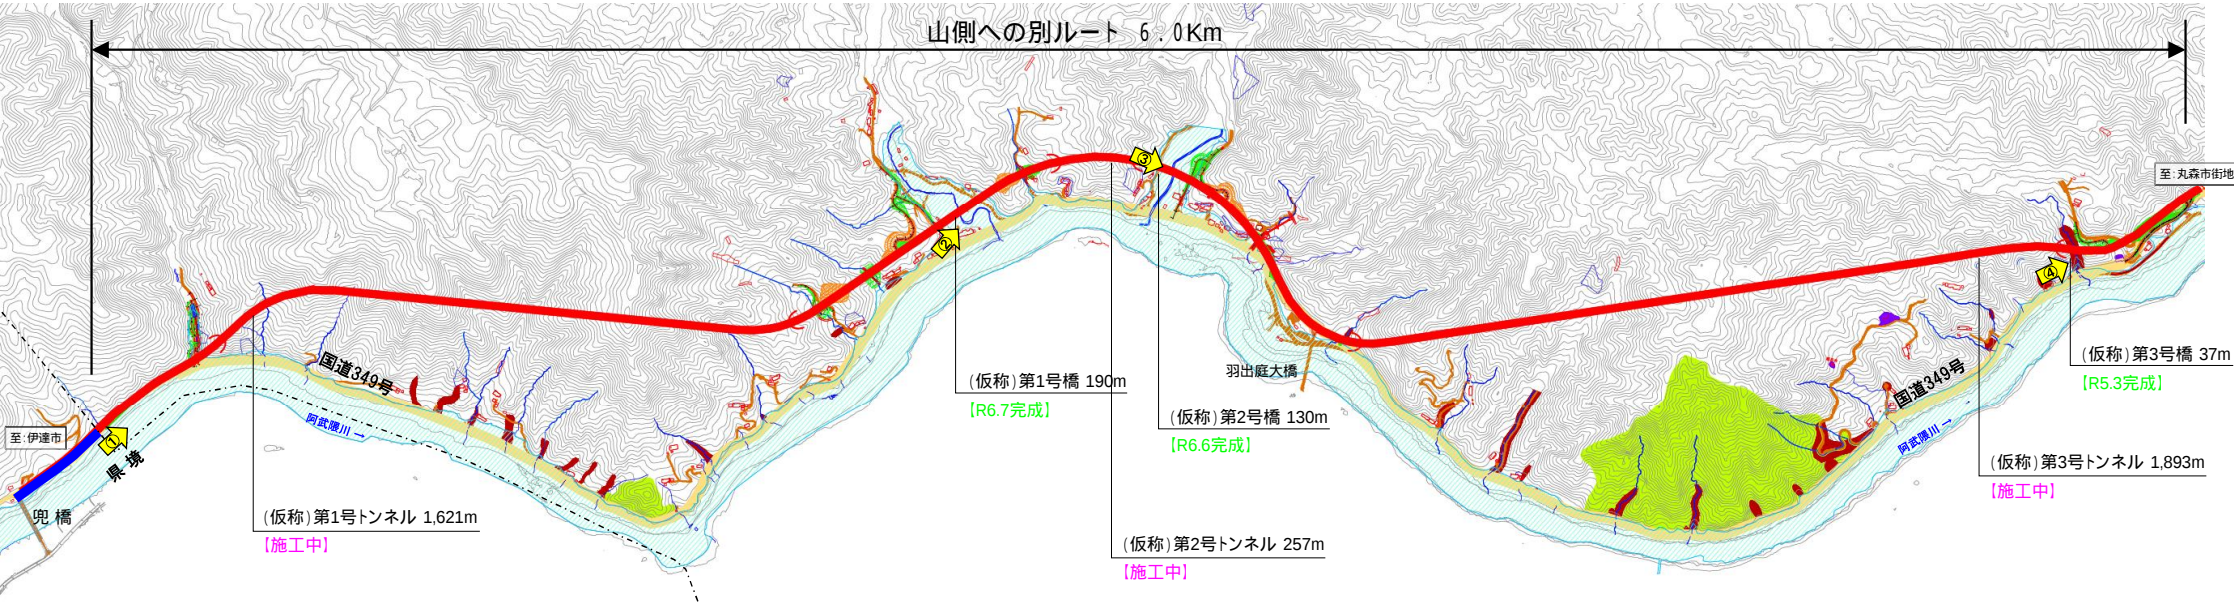


凡 例

- 台風19号浸水範囲
- 台風19号被災箇所
- 県立自然公園(第3種特別地域)

現場状況写真

— (福島県から受託工事により、国交省施行) 兜橋～県境部区間 0.3km
— (国交省施行) 山側への別ルート 6.0km

(仮称)第1号トンネル 進捗状況

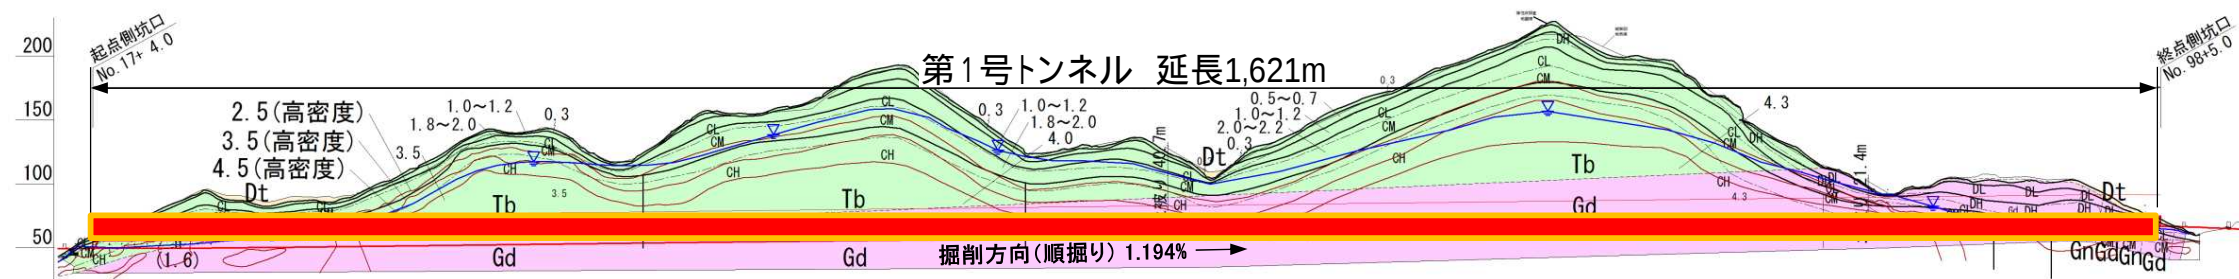

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	1,621m	/ 1,621m	100%
覆工コンクリート	1,050m	/ 1,621m	65%

R6.8.22貫通

地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
	—		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	雲山層	雲山層	凝灰角礫岩	Tb	凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
	中生代 白亜紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)




▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル貫通掘削

(仮称)第2号トンネル 進捗状況

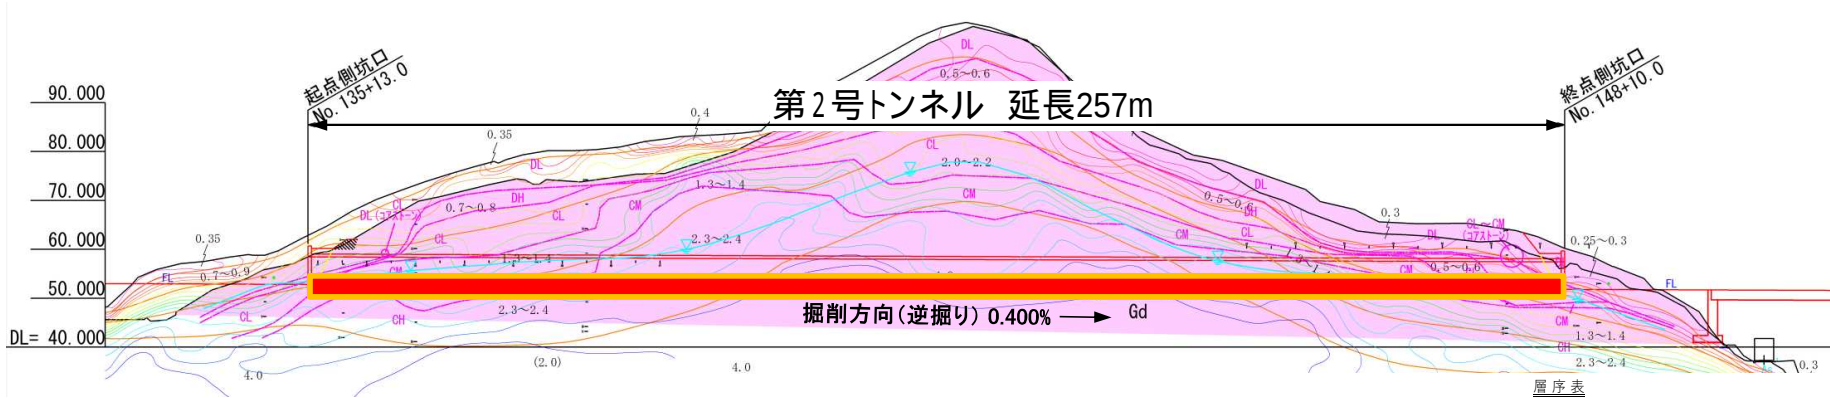

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	257m	/ 257m	100%
覆工コンクリート	145m	/ 257m	56%

R6.5.15貫通

地質時代	地層名			土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd 礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt 礫混じり土砂
	—		沖積層	A 礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	靈山層	靈山層	凝灰角礫岩	Tb 凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
	中生代 白堊紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd 花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)




▲ 起点側(伊達市側)坑口全景




▲ トンネル坑内状況

(仮称)第3号トンネル 進捗状況

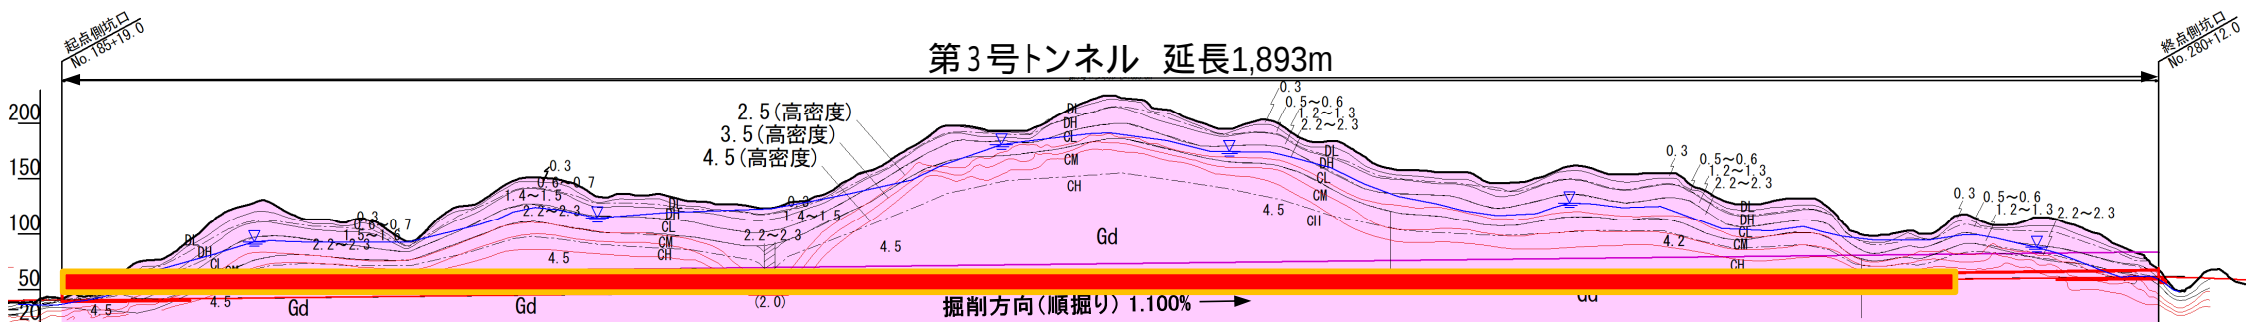

	進捗状況	進捗率
トンネル掘削	1,685m / 1,893m	89%
覆工コンクリート	1,017m / 1,893m	54%

地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
	—		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	雲山層	雲山層	凝灰角礫岩	Tb	安山岩溶岩(An)
	中生代 白亜紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)

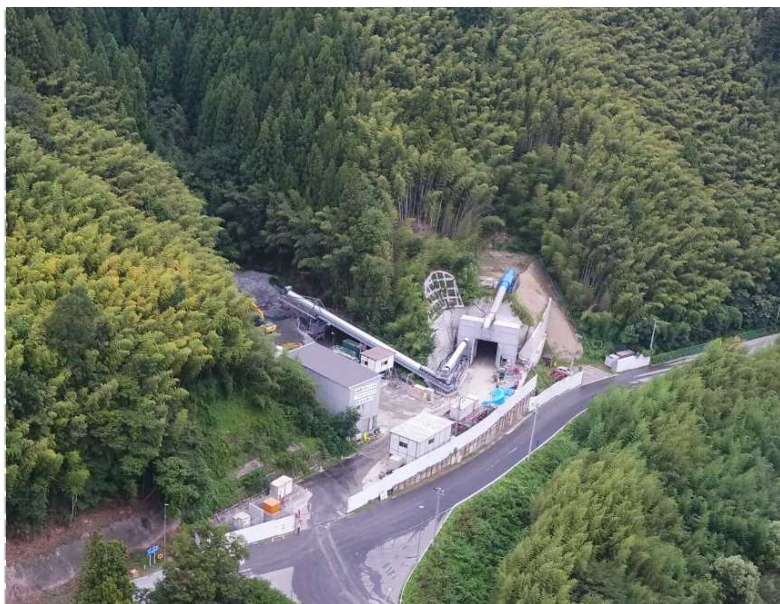

▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル坑内状況
