



がんばろう！東北



すいかなの名産路



「東北中央自動車道」 「尾花沢新庄道路」 通信 第9号 平成23年8月 発行

国土交通省 東北地方整備局
山形河川国道事務所 尾花沢監督官室
〒999-4221山形県尾花沢市尾花沢字町田143-1番地
(尾花沢国道維持出張所内)
TEL:0237(23)2521 FAX:0237(23)2523

尾花沢監督官室で担当している 東北中央自動車道の進捗状況紹介します～



進捗率H23. 7. 20現在


①鳥木沢地区道路改良工事



進捗率 26%

臈気川南側の山の掘削を進めております。

②五十沢道路改良工事

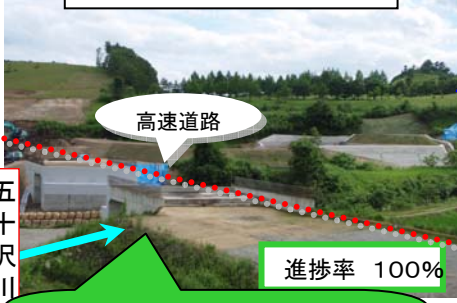

進捗率 100%

五十沢川に架かる橋梁の橋台部分が完成しました。今後、上部工の製作・架設を進めます。

監督官からひとこと

7/1付けで着任しました高橋正晴と申します。(3代目高橋) 前任同様、よろしくお願ひします。

尾花沢IC
(仮称)



村山IC
(仮称)

東根IC

③尾花沢地区橋梁設置工事



進捗率 8%

県道の迂回路が完成し、橋梁設置のための掘削を進めております。


④大石田地区道路改良工事



進捗率 4%

市道と中央道の間に側溝を設置しております。

⑤今宿地区道路改良工事

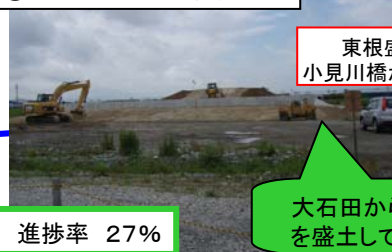

進捗率 27%

東根盛土場状況
小見川橋から南側を望む

大石田から運んだ土を盛土しております。

H23年度東北中央道(村山～尾花沢間)の工事はこちらの業者さんが担当します!
H23. 7現在

①鳥木沢地区道路改良工事
請負会社: 大山建設(株)
工期: H23年3月11日～23年12月20日

②五十沢道路改良工事(完成)
請負会社: (株)はながさ建設
工期: H22年6月25日～23年7月8日

③尾花沢地区橋梁設置工事
請負会社: 昭和コンクリート工業(株)
工期: H23年3月30日～24年2月24日

④大石田地区道路改良工事
請負会社: 升川建設(株)
工期: H23年3月11日～23年9月13日

⑤今宿地区道路改良工事
請負会社: (株)はながさ建設
工期: H23年3月11日～23年9月20日
