



がんばろう！東北



# 「東北中央自動車道」 「尾花沢新庄道路」 通号 第10号 平成23年9月 発行

国土交通省 東北地方整備局  
山形河川国道事務所 尾花沢監督官室  
〒999-4221山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1番地  
(尾花沢国道維持出張所内)  
TEL:0237(23)2521 FAX:0237(23)2523

# すいかの名産路



## 尾花沢監督官室で担当している 東北中央自動車道の進捗状況紹介します

進捗率H23. 9. 5現在

### ①鳥木沢地区道路改良工事

進捗率 64%




【尾花沢市尾花沢 市道部】旧店舗の基礎を取り壊し中です。

尾花沢IC  
(仮称)

### ②尾花沢地区橋梁設置工事


進捗率 25%

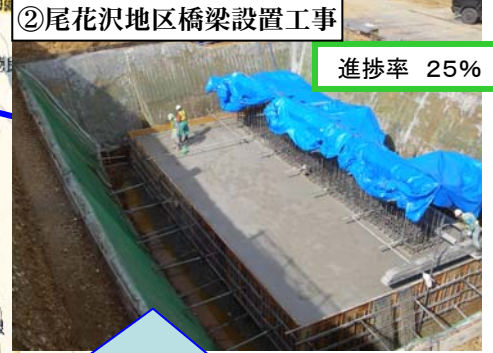

【尾花沢市尾花沢 県道部】掘削が完了し、橋梁の基礎部(フーチング部)にコンクリートを打設しております。

### ③五十沢川橋上部工工事

進捗率 5%

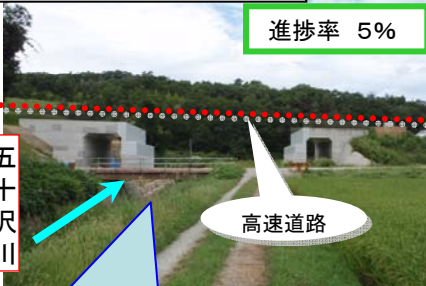

五十沢川

高速道路

【大石田町今宿】上部工の鋼製桁を新潟の工場で作成中です。

村山IC  
(仮称)

### ④大石田地区道路改良工事

進捗率 92%



【東根市大堀地区】中央道の盛土及び市道の間に側溝を設置しております。

### ⑤村山地区道路改良工事

進捗率 5%



【村山市名取】地盤が軟らかいことから、地盤改良のために砕石マットを今後施工します。

東根IC

### ⑥今宿地区道路改良工事

進捗率 86%



【東根市羽入地区】大石田地区及び大野目交差点工事で発生した残土を利用し、盛土しております。

### 平成23年度東北中央道(村山～尾花沢間)工事施工者一覧表

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ①大山建設(株)       | 工期:H23年3月11日～23年12月20日 |
| ②昭和コンクリート工業(株) | 工期:H23年3月30日～24年 2月24日 |
| ③藤木鉄工(株)       | 工期:H23年7月26日～23年12月16日 |
| ④升川建設(株)       | 工期:H23年3月11日～23年10月14日 |
| ⑤高谷建設(株)       | 工期:H23年7月21日～24年 3月23日 |
| ⑥(株)はながさ建設     | 工期:H23年3月11日～23年 9月30日 |

