


八幡平山系(秋田県側)直轄火山砂防事業
八幡平山系北桧木内川第2砂防えん堤工事
 工事広報【9月号】

2023.9.1 発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
 受注者  **総合建設業 佐藤建設株式会社**

〒014-1201
 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
 TEL 0187-46-2681(代)
 〒014-1201
 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255
 TEL 0187-43-1700(代)
 FAX 0187-43-3868

砂防出張所
 出張所長 大淵 剛志
 北桧木内川作業所
 現場代理人 大石 克寿
 監理技術者 富澤 政道
 広報担当者 平川 慎妙子

左岸コンクリート打設あと1回



R5.8.30撮影

スリット部順調に施工中

工事の進捗状況

8月は、全国的に記録的な暑さに見舞われましたが、現場では熱中症対策を行いながら本体部の生コン打設・スリット部ボルト塗装を行い、現在は足場解体作業を進めています。

8月中で本体部のコンクリート打設が終了する予定でしたが、少し日程がずれ込み、9月上旬に本体左岸部の打設は終了の予定です。今後は、スリット部の鉄筋組立・生コン打設等も予定していますので、引き続き大型車も通行もいたします。安全には十分気を付けて運搬作業を行ってまいりますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

連日暑い日が続いており、現場でも水分補給等を行いながら作業しております。これからは暑さもおさまってくる時期になるかと思いますが、朝夕は気温が低くなり、日中が暑くなったり寒暖の変化が多くなりますので、皆様も体調に注意してお過ごしください。



足場解体作業が始まりました

8月下旬より、足場の解体作業が始まりました。足場解体がスリット1基分終了した写真が左右の写真です。足場の解体作業自体は約1週間程度を目安としており、9月上旬には終了する予定です。来月の広報では、今年度分の左岸側打設が終了し、スリット2基ともみえる写真を掲載予定ですので楽しみにしてくださいね。



工事工程表

工期: 令和5年3月3日~令和5年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工・後片付け										
砂防土工 (スリット掘削部)										
砂防堰堤工 コンクリート堰堤工										
鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)										
鋼製スリット工場製作										
応急処理工 (濁水処理施設設置)										
仮設工 (ヤード造成・転流等)										

出張所管内安全対策協議会パトロール

8月18日に秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内安全対策協議会による現場パトロールが行われました。8月の現場パトロールは万六建設(株)さんの赤倉沢第1砂防堰堤が点検対象現場となりました。




赤倉沢第1砂防堰堤



スリット部ボルト塗装

8月からスリット部のボルト塗装を行っています。今回は、ボルト塗装とはどういう作業なのかをご紹介します。スリット組立完了後、スリットのボルト結合部のさび・劣化防止のため塗装を行います。下塗り3層を行い、その後、中塗り・上塗りと合計5層塗装を行います。塗装工の方は、8月いっぱい完成し終了しています。

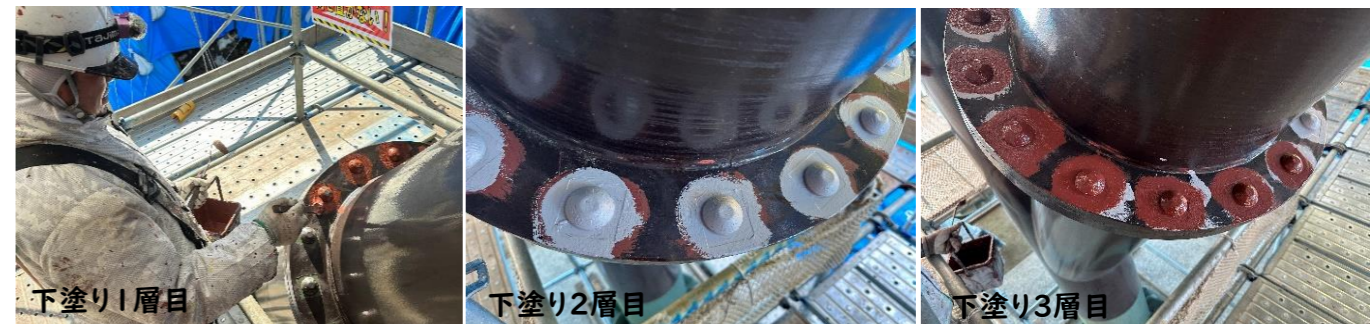

下塗り1層目

下塗り2層目

下塗り3層目



中塗り


上塗り

塗装完了

9月の生コン打設予定日

※3Dモデルによる9月施工予定箇所(着色部)

5日(火曜日)

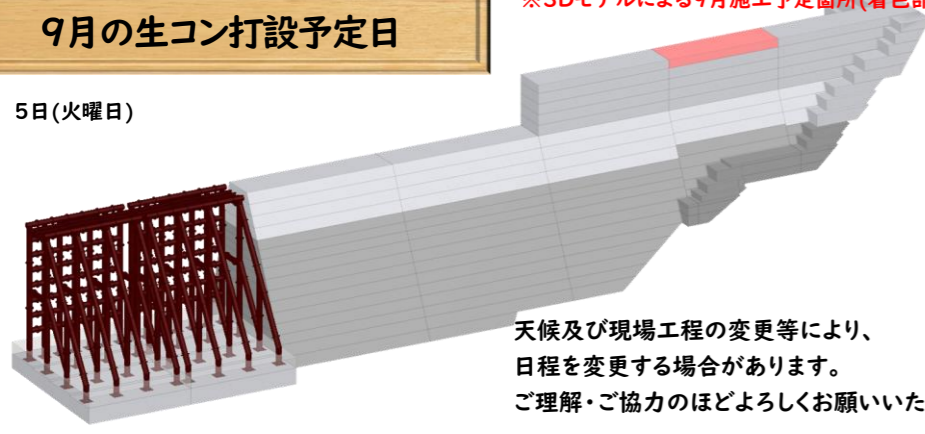

天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
