

三陸沿岸道路 山田宮古道路

がんばろう！東北

工事状況のお知らせ vol.07

東北地方整備局 三陸国道事務所 平成25年10月31日現在



豊間根新田 I 遺跡
調査:埋蔵文化財センター


施工:②本間組
写真は町道豊間根関口線です。1基目(町道木戸口線)の据付作業が終了し、2基目を鋭意作業中です。

施工:宮古地方森林組合
(仮称)豊間根トンネル入口(南側)の伐採作業を実施しています。よろしくお願いたします。

施工:⑤矢作建設工業
写真は町道白山船石線です。BOXカルバートの施工をするため、迂回路の造成を実施します。

調査:埋蔵文化財センター
調査区北端で見つかった住居跡の精査風景です。縄文時代の住居跡で手前の石組が“炉”です。

施工:③日本国土開発
BOXカルバート(現場打)を施工するための鋼矢板打ち込みが終了し、アンカー工、掘削作業を開始しました。

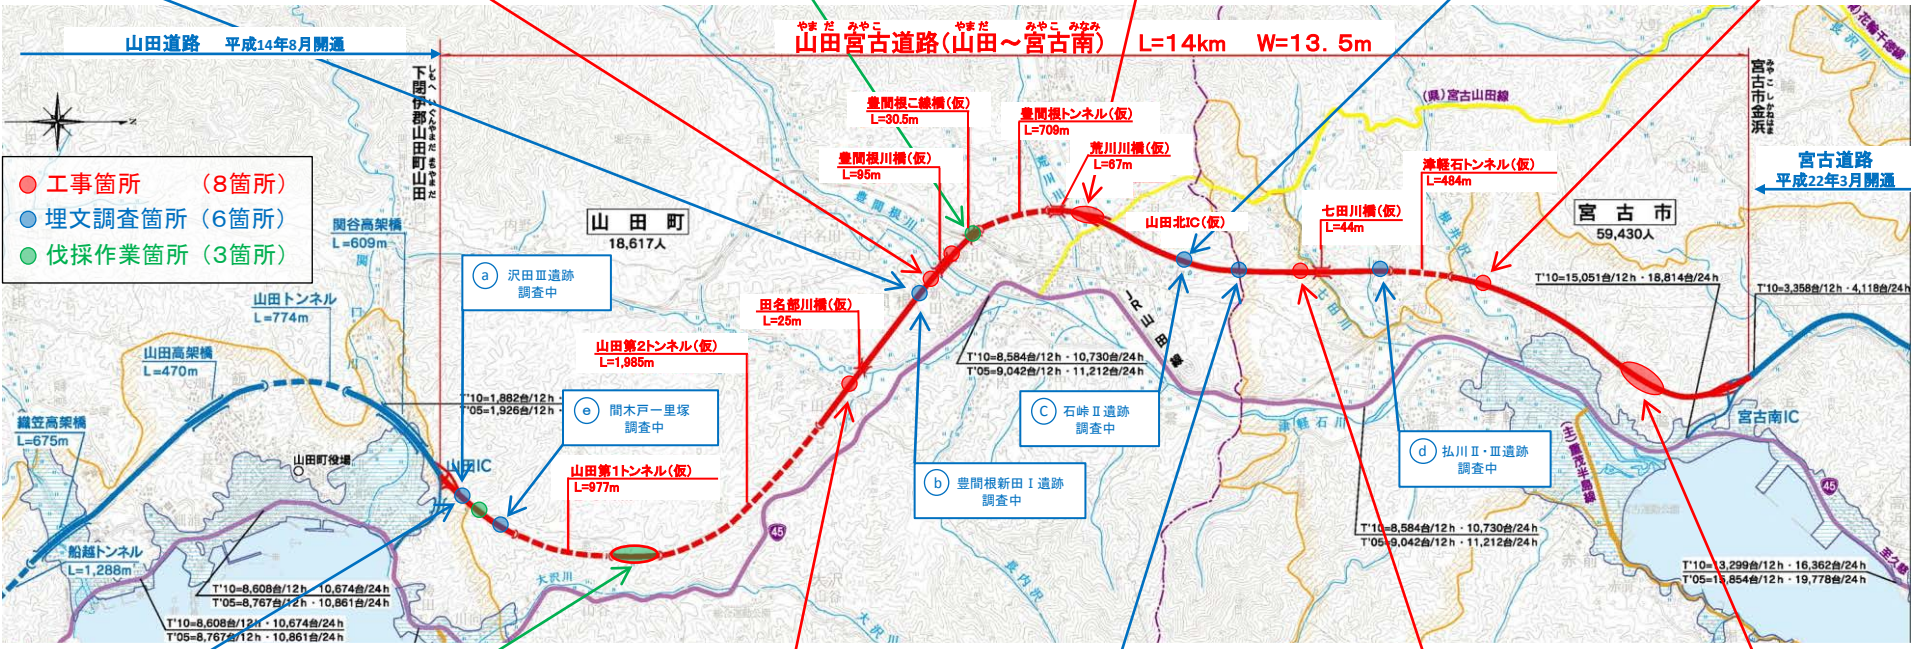

沢田Ⅲ遺跡
調査:埋蔵文化財センター
沢田Ⅲ遺跡で10月26日(土)に現地説明会が開催されました。(詳細は裏面で!)

施工:宮古地方森林組合
大沢地区で11月上旬から伐採作業が始まります。よろしくお願いたします。

施工:①板宮建設
3基目のBOXカルバートの据付作業が完了しました。板宮建設の施工分は、これで終了です。

調査:岩手県教育委員会協力:④樋下建設
荷竹地区と石岐地区で埋蔵文化財の試掘調査(トレンチ掘りを約30箇所)を実施しました。

施工:③日本国土開発
荷竹地区でBOXカルバートを施工予定です。よろしくお願いたします。

施工:④樋下建設
11月上旬から掘削土の搬出が始まります。よろしくお願いたします。(詳細は裏面で!)

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表

○発注者：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木

工事名	工事箇所	受注者	現場責任者	工事期間
① 豊間根南地区改良工事	山田町豊間根第9地割 地内	(株)板宮建設	長田	平成25年3月6日 ~ 平成25年10月下旬 予定
② 豊間根地区改良工事	山田町豊間根第7地割 ~ 第3地割 地内	(株)本間組 東北支店	長井、鈴木	平成25年3月6日 ~ 平成26年1月下旬 予定
③ 津軽石地区改良工事	宮古市津軽石第15地割 ~ 第19地割 地内	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年2月下旬 予定
④ 馬越地区改良工事	宮古市津軽石第4地割 ~ 第3地割 地内	樋下建設(株)	阿部、花田	平成25年7月9日 ~ 平成26年1月下旬 予定
⑤ 豊間根北地区道路改良工事	山田町豊間根第20地割 地内	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年2月下旬 予定
⑥ 大沢地区改良工事	山田町大沢第4地割 ~ 石峠第3地割 地内	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月28日 ~ 平成26年3月下旬 予定
⑦ 山田町古地区伐採作業	山田町山田第3地割 ~ 宮古市金浜第3地割 地内	宮古地方森林組合	中磨、中嶋	平成25年7月10日 ~ 平成26年3月中旬 予定

※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

○調査機関 公益財団法人 埋蔵文化財センター

◆埋蔵文化財発掘調査一覧表

遺跡調査名	調査箇所	現場責任者	調査期間
① 沢田Ⅲ遺跡	山田町山田第3地割 地内	阿部	平成25年4月11日 ~ 平成25年11月下旬 予定
② 豊間根新田Ⅰ遺跡	山田町豊間根第7地割 地内	濱田、古館	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
③ 石峠Ⅱ遺跡	山田町石峠第4地割 地内	北村、佐藤	平成25年7月1日 ~ 平成25年11月下旬 予定
④ 弘川Ⅱ・Ⅲ遺跡	宮古市津軽石第14地割 地内	村木	平成25年9月17日 ~ 平成25年11月下旬 予定
⑤ 間木戸一里塚(※1)	山田町山田第1地割 地内	小林、川向	平成25年9月中旬 ~ 平成25年11月下旬 予定

※1. 間木戸一里塚は、山田町生涯学習課で調査を実施しています。

○4月から開始した【間木戸Ⅱ・Ⅲ遺跡】、【津軽石大森遺跡】、【金浜Ⅴ遺跡】は調査が終了しました。

☆「沢田Ⅲ遺跡」の現地説明会を開催しました!

山田町山田第3地割地内で発掘調査を進めていました、三陸沿岸道路建設予定地にある「沢田Ⅲ遺跡」において、10月26日(土)に現地説明会を開催しました。遺跡からは古代の鉄生産関連炉跡や縄文時代の土器などが出土し、調査終了後、三陸沿岸道路の早期開通に向け、本格的に道路工事に移行することから、遺跡を現地で見られる最後の機会ということで地元住民の方々など約40名が参加しました。



▲出土した石器や土器



▲道路工事着前に必要な埋蔵文化財調査についても岩手県教育委員会や埋蔵文化財センターのご協力により急ピッチで進められています。

☆津軽石馬越地区から掘削土を搬出します!

宮古市津軽石第3地割(馬越地区)から掘削土が各方面へ搬出されます。ダンプトラックの通行する頻度が多くなりますので、周辺道路をご利用される方はご注意をお願いいたします。(施工担当:樋下建設)

◆主な搬出先

※天候等の影響により延びる場合があります。

- 山田町豊間根第20地割(荒川地区) 11月上旬 ~ 12月下旬まで(予定)
- 山田町豊間根第3~7地割(豊間根地区) 11月上旬 ~ 2月下旬まで(予定)
- 宮古市津軽石15地割(荷竹地区) 11月下旬 ~ 12月中旬まで(予定)



▲掘削土運搬の準備を進めている津軽石馬越地区



▲ステッカーを貼って運行いたします!

☆三陸沿岸道路「普代道路」開通!
~ 岩手県内の復興道路としては初 ~

三陸国道事務所がこれまで事業を進めてきました、三陸沿岸道路「普代道路」が、10月13日(日)開通しました。「普代道路」は、三陸沿岸道路(復興道路)の一部を構成する延長4.2kmの自動車専用道路で、岩手県内の三陸沿岸道路(復興道路)としては、初めての開通となります。開通に先立ち開通式が行われ、開通を待ち望んでいた地元の皆様など多くの方が参列しました。



▼地元住民たちによる「ふだいまつり」のお囃子が式典を盛り上げました。

