

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成26年11月25日現在

工事状況のお知らせ vol.24



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は間木戸地区です。山田IC(インターチェンジ)内の盛土作業を実施しております。2段目を施工中です。



施工②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は山田第2トンネルの宮古側入口側(豊間根田名部地区)です。掘削は175mまで進みました。



施工③大日本土木

写真は豊間根田名部地区です。ボックスカルバート(水路ボックス)を据付中です。



施工④東急建設

写真は豊間根トンネルの釜石側入口側(豊間根勝山地区)です。掘削は171mまで進みました。




施工⑥植木組

写真は荒川地区です。石峠地区から掘削した土砂を運搬し、盛土作業を実施していきます。



施工⑨本間組

写真は金浜地区です。市道金浜4号線を拡幅して、工事用道路を造成しています。

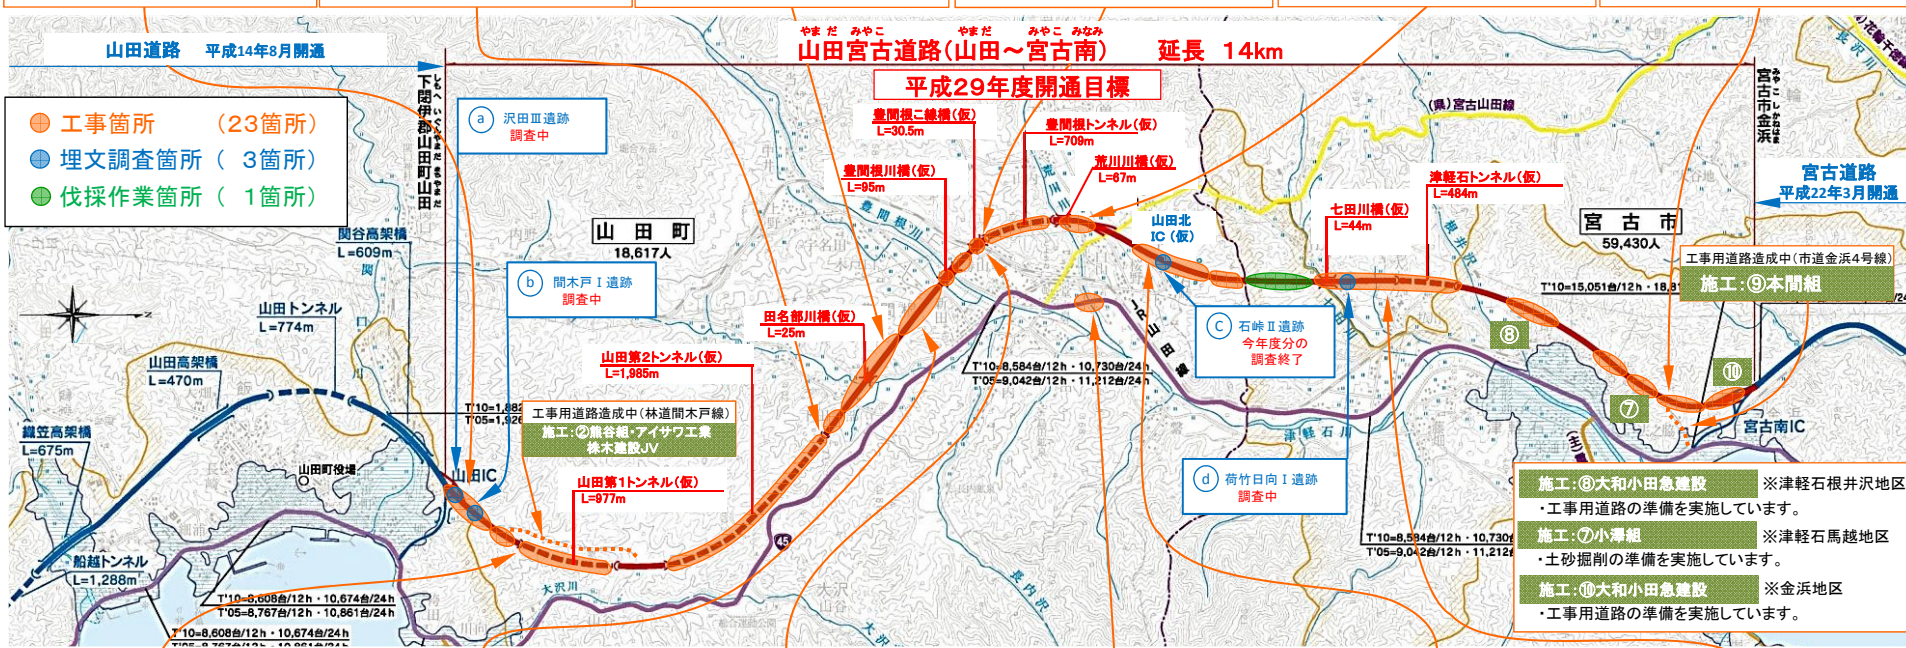

施工①戸田建設

写真は山田第1トンネルの釜石側入口側(間木戸地区)です。掘削は175mまで進みました。



施工⑪本間組

写真は豊間根新田地区です。ボックスカルバート周辺の盛土作業を鋭意進めています。



施工④東急建設

写真は豊間根勝山地区です。(仮称)豊間根二線橋(橋台2基)の躯体を立ち上げています。



施工②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は国道45号豊間根橋です。上流側に仮橋を設置いたします。(詳細は裏面で！)



施工⑤森組

写真は石峠地区です。町道石峠線と並行して工事用道路を造成しています。



施工⑬奥村組

津軽石トンネル(延長 484m)及び、津軽石荷竹～馬越地区の道路改良工事が契約になりました。(詳細は裏面で！)

◆工事等一覧表

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③ 下田南部地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	植村、伊藤	平成26年04月02日 ~ 平成27年01月下旬 予定
④ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤ 石峠地区道路改良工事	(株)森組 東北営業所	植木、竹下	平成26年04月02日 ~ 平成27年02月下旬 予定
⑥ 石峠改良工事	(株)植木組 東北支店	今川、児玉	平成26年06月26日 ~ 平成27年02月上旬 予定
⑦ 津軽石北地区道路改良工事	(株)小澤組	佐々木	平成26年10月01日 ~ 平成27年03月下旬 予定

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
⑧ 根井沢地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	加古、佐藤	平成26年08月29日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑨ 金浜南地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、佐々木	平成26年07月30日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑩ 金浜北地区道路改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	飛高、西村	平成26年09月20日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑪ 豊間根地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	早川、萩原	平成26年04月02日 ~ 平成27年02月下旬 予定
⑫ 豊間根川橋下部工事	徳倉建設(株) 東北支店	佐野、北折	平成26年11月29日 ~ 平成27年01月下旬 予定
⑬ 津軽石道路工事	(株)奥村組 東北支店	佐藤、高柳	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定
⑭ 山田宮古地区伐採作業	宮古地方森林組合	中居	平成26年04月21日 ~ 平成27年01月下旬 予定

山田宮古道路 2. ◀ダンプトラックのゼッケン番号は工事一覧表の番号に合わせております。



☆工事の進捗状況を山田町観光協会公式ブログにて情報発信しております!



山田町内で実施している工事現場を、山田町観光協会の公式ブログ「山田とことこ日記」で紹介しております。今までトンネル工事の安全祈願祭(2件)および、4件の工事現場を取材していただきました。これからも取材をお願いしてまいりますので、皆さんも「山田とことこ日記」を是非ご覧ください!

山田第2トンネル工事見学

復興道路復興見学4回目
今回も、熊谷組JVさんの「山田第2トンネル工事」に行ってきました。

案内してくれたのは、熊谷組JVの高橋さんと小森さんです。写真を撮らせて、お話ししたところ「スーッと」言いながらも、引き気なっていました。とても穏やかなお二人です。

山田町観光協会 公式ブログ vol.2
山田とことこ日記

所長の丸山さんです。シャッターを押すと書き交わしてしまいました。いい笑顔!

ちなみに「山田で美味しかったものは?」
「さんまの刺身ですね! 刺身は美味しかったです!」いやー食べ物全部美味しかったですね! 即答でした。

URLはこちら↓
<http://yamada-kankou.sblo.jp/category/3906911-1.html>



☆豊間根橋の架替えに伴い、仮橋を設置します! ~ 施工: 熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV ~



山田町豊間根第2地割の荒川川に架かる国道45号豊間根橋の架替え工事を実施いたします。豊間根橋は昭和41年に供用を開始しましたが、耐震補強も困難な状況にあります。三陸沿岸道路の施工に伴う工事車両が、今後更に増加することを考慮し、国道通行車両の安全を確保いたします。工事中は、皆様方にご迷惑をおかけしないよう、安全面等に十分配慮してまいりますので、走行・通行する際は、ご注意ならびにご理解とご協力をお願いいたします。

- 工事期間 平成26年11月 4日 ~ 平成27年 3月下旬(予定)
- 作業時間 午前8:00~午後5:00(月曜日から土曜日を予定)

※仮橋の進入路造成のため、既設豊間根橋の前後において、工事規制(片側交互通行)をさせていただきます期間もありますので、ご了承ください。



☆「(仮称)津軽石トンネル工事」が契約されました!

山田宮古道路で最後となる4本目の「(仮称)津軽石トンネル」の工事が契約となりました。今回施工するトンネルは延長は484mです。掘削は釜石側(弘川地区)から予定しております。宮古市津軽石荷竹~馬越区間の道路改良(切土工・盛土工・ボックスカルバート工・排水工等)も実施します。皆様にはご迷惑をお掛けしないよう工事を進めてまいります。どうぞよろしく願いいたします。

- ◆工事期間
自:平成26年11月 1日
至:平成28年11月30日
- ◆受注者
株式会社奥村組 東北支店



▲完成イメージ(釜石側入口)



今後、工事が全面展開していきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってます!

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行: 山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修: 三陸国道事務所 建設監督官
