

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成27年02月25日現在

工事状況のお知らせ vol.27



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工:④東京鐵骨橋梁

写真は豊間根勝山地区です。橋を架ける工事が契約となりました。よろしくお願いたします。



施工:⑤森組 ⑥植木組 ⑫西松建設

写真は石峠地区です。⑤森組のダンプ運搬が終了し、法面植生を実施中です。⑥植木組のダンプ運搬は継続中です。⑫道路改良工事(土砂掘削、ダンプ運搬)が新たに契約(西松建設)となりました。よろしくお願いたします。



施工:⑥植木組

写真は津軽石弘川地区です。ボックスカルバートを設置する準備を実施しております。




施工:⑨大和小田急建設

写真は津軽石根井沢地区です。工事用道路が概ね完成しました。3月から土砂搬出を開始します。



施工:⑩本間組

写真は金浜地区です。掘削作業とボックスカルバートの設置作業を行っています。

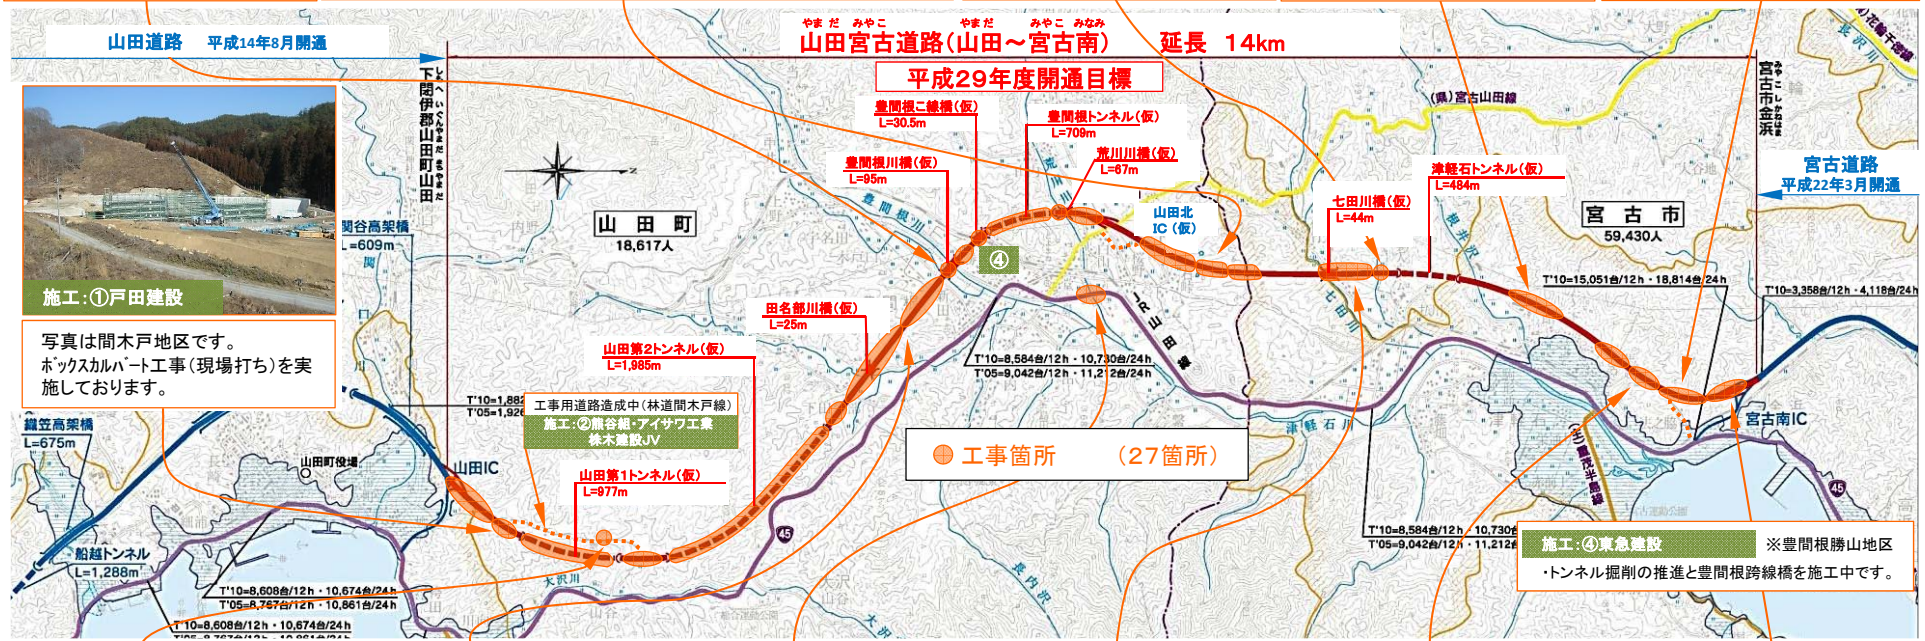

施工:①戸田建設

写真は間木戸地区です。ボックスカルバート工事(現場打ち)を実施しております。



施工:②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は山田地区(林道間木戸線)です。トンネルのスリ(岩)を細かく破碎し再利用する予定です。



施工:③大日本土木 ⑬本間組

写真は豊間根田名部~新田地区です。掘削作業と法面植生を鋭意進めております。



施工:②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は国道45号豊間根橋です。仮橋が概ね完成しました。4月下旬頃に切替えを予定しております。



施工:⑧奥村組

写真は津軽石荷竹地区です。工事用道路が概ね完成し、今後掘削作業を実施していきます。



施工:⑦小澤組

写真は津軽石馬越地区です。掘削及び土砂搬出を実施中です。よろしくお願いたします。



施工:⑪大和小田急建設

写真は宮古南インターチェンジ付近(金浜地区)です。工事用道路の造成作業を行っています。

◆工事等一覧表

工事名	受注者	現場責任者	タンブラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	山田宮古道路 1	0193 77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193 83-5735	平成26年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③ 下田名都地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	植村、伊藤	山田宮古道路 3	0193 83-5433	平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定
④ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	山田宮古道路 4	0193 83-5805	平成26年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤ 石神地区道路改良工事	(株) 藤組 東北営業所	橋本、竹下	山田宮古道路 5	0193 86-2515	平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑥ 石神改良工事	(株) 株木組 東北支店	今川、児玉	山田宮古道路 6	0193 77-4907	平成26年06月26日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑦ 津軽石北地区道路改良工事	(株) 小原組	佐々木、阿部	山田宮古道路 7	0193 67-9152	平成26年10月01日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑧ 津軽石道路工事	(株) 奥村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 8	0193 77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定

工事名	受注者	現場責任者	タンブラックの番号	問合せ先	工事期間
⑨ 横井沢地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	加古、佐藤	山田宮古道路 9	0193 77-5785	平成26年08月29日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑩ 金浜南地区道路改良工事	(株) 本間組 東北支店	長井、佐々木	山田宮古道路 10	0193 77-4723	平成26年07月30日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑪ 金浜北地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	飛高、西村	山田宮古道路 11	0193 77-5299	平成26年09月20日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑫ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 12	次号でお知らせいたします。	平成27年02月09日 ~ 平成29年02月下旬 予定
⑬ 豊間根地区道路改良工事	(株) 本間組 東北支店	早川、萩原	---	0193 86-2240	平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑭ 豊間根川橋上舗工工事	(株) 東京鐵骨鋼業 仙台営業所	高木	---	次号でお知らせいたします。	平成27年02月16日 ~ 平成27年10月上旬 予定
⑮ 山田宮古地区伐採作業	宮古地方森林組合	中居	---	0193 63-2173	平成26年04月21日 ~ 平成27年03月下旬 予定

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

☆現場見学会を開催し、復興を実感していただきました!



山田第2トンネル(施工:熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV)

○大沢小学校全校児童(95名)平成27年2月10日(火)



2月10日(火)に大沢小学校の全校児童(86名)及び教職員9名の皆さんが「山田第2トンネル」の現場を見学されました。防水シートに将来の夢や目標などを書いたり、重機の操作も体験しました。また高学年(4・5・6年生)を対象に、発破作業も体験していただきました。



▲トンネル内部の防水シートに将来の夢等を書き込みました



▲トンネル工事に使用する大型機械に乗り込んで操作体験!



▲山田第2トンネル(釜石側入口)で記念撮影(1・2・3年生)



▲発破作業を体験!(4・5・6年生)

現場見学会の様子は、山田町観光協会の公式ブログ「山田とこと日記」でも情報発信しておりますので、是非ご覧ください!
URLはこちら(カテゴリ:復興道路)→ <http://yamada-kankou.sblo.jp/category/3906911-1.html>



☆津軽石地区の民生・児童委員会議に参加し工事等の進捗状況を説明しています。



1月28日(水)に津軽石地区の民生・児童委員協議会(野崎昭敏会長:14名)による定期会議の場で、工事等の進捗状況を説明しました。昨年の12月に続いて2回目です。工事の全面展開に伴い、タンブラックの往来が激しくなっていることから、委員の方からの要望を受け、昨年12月から児童(津軽石小)や生徒(津軽石中)の通学の安全を確保するため、委員の方と一緒に街頭指導を実施しております。今後も定期会議にあわせて工事進捗説明を継続してまいりますので、よろしくお願いいたします。



▲安全パトロール状況(©大和小田急建設)



▲定期会議の様相(津軽石竹自治会館にて)



☆工事の安全施工と労働災害の防止を目指して安全パトロールを実施しました。



2月18日(水)に、豊間根トンネル工事区間(④東急建設)で、山田宮古道路と宮古箱石道路の受注者等(35名)が集まったの合同安全パトロールを実施しました。今後も事故のないよう安全に工事を進めてまいります。



現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってるよ!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行: 山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修: 三陸国道事務所 建設監督官
